

JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor kancelář hejtmana

Úsek vedoucího odboru

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX014YM8V

Váš dopis zn.:

Ze dne: 25. 9. 2022

Naše č. j.: KUJCK 122280/2022

Sp. zn.: KHEJ 116655/2022/kakr SO

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

Telefon: 386 720 225

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz

Datum: 10. 10. 2022

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.

Vážená paní,

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 25. 9. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 25. 9. 2022, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:

V prosinci 2020 proběhla místní šetření a jednání odboru ŽP KÚ Č. Budějovice se zástupci města Písek, Prácheňského rybářství, odboru ŽP MěÚ Písek, AOPK v Č. Budějovicích, ornitologů – členů JOK. Na tomto jednání byly domluveny zásady úpravy projektu nájemce rybníků, podle kterého mělo dojít k úpravám v rybníční soustavě. Prácheňské rybářství nestihlo dodržet termín dokončení revitalizace do konce roku 2021, dokončilo ji v červnu 2022.

Žádám o veškeré kopie z jednání ve věci Obnova rybníční soustavy Purkratice v k.ú. Písek, která v době od března 2021 proběhla a které lze dle zákona poskytnout, až do doby předání resp. dokončení revitalizace, pokud probíhala za účasti KÚ. Žádám o veškeré kopie všech rozhodnutí, která byla v této věci Krajským úřadem v Č. Budějovicích vydána od března 2021 do doby dokončení revitalizace v roce 2022.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

v přílohách Vám zasíláme rozhodnutí vydané od března 2021 a zápisy z kontrolních dnů (KD), kterých se účastnil Krajský úřad Jčk. Po březnu 2021 byla vydána změna rozhodnutí – úprava podmínek původního rozhodnutí, další písemnosti nebyly vydávány. Pokud jde o zápisy z KD, tak KD č.8 se Krajský úřad Jihočeského kraje neúčastnil. Další KD v pořadí od č.10 dále už probíhaly bez účasti KÚ Jčk, protože zájmy ochrany přírody již byly vyřešeny.

S pozdravem

Mgr. Petr Podhola
vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky -

Příloha 9x

změna rozhodnutí Purkratické rybníky.pdf

KD1-.pdf

KD2-.pdf

KD3-.pdf


KD4-.pdf

KD5-.pdf

KD6-.pdf

KD7-.pdf

KD9-.pdf



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

VYPRAVENO DNE 22-04-2021



KUCBX00Z7DHO

Naše č. j.: KUJCK 45707/2021
Sp. zn.: OZZL 147736/2020/pedo SO8
Vyřizuje: Mgr. Petra Doktorová
Telefon: 386 720 738
E-mail: doktorova@kraj-jihocesky.cz
Datum: 21. 4. 2021

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 10.5.2021 (2)
KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
dne 12.5.21 podpis [signature]

Rozhodnutí

Krajského úřadu - Jihočeský kraj o změně rozhodnutí č.j. KUJCK 154867/2020, sp. zn. OZZL 147736/2020/pedo ze dne 28.12.2020 ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů podle ust. § 56 odst. 1 a 2 zákona, podle ust. § 84 odst. 1 písm. b) zákona.

Výrok

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako příslušný orgán podle ust. § 67 odst.1 písm. g) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 84 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

mění podle ust. § 84 odst. 1 písm. a) rozhodnutí

Krajského úřadu-Jihočeský kraj, Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví č.j. KUJCK 154867/2020, sp. zn. 147736/2020/pedo ze dne 28.12.2020 (dále jen rozhodnutí) ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů podle ust. § 56 odst. 1 a 2 písm. c) zákona.

1. Výjimka je platná po dobu realizace akce.
2. Kácení dřevin a odstraňování křovin bude provedeno v období mimo hnízdní období ptáků, tedy mezi 1.8. a 31.3.
3. U všech rybníků bude respektována bezzásahová zóna tak, jak byla odsouhlasena a podle mapových zakresů, které jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
4. Podél opravovaných stok budou vytvořeny manipulační pásy jen na šířku pracovního stroje.
5. Práce v okolí litorálních zón budou ukončeny do konce května 2021.
6. U Lučního rybníka bude směrem do louky vytvořena zóna s příznivým sklonem břehu pro rozvoj litorální zóny.
7. U Prostředního rybníka bude na pravém břehu při provádění odbahnění respektována linie křovin. Při dosypávání hráze budou respektovány kořenové náběhy vzrostlých dřevin na vzdušné straně hráze (nebudou zasypávány).
8. U rybníka Nádvořný lze část litorálu na západní straně upravit vytvořením mělké stoky po obvodu katastrální hranice rybníka do podoby ostrova nebo poloostrova.
9. Správní orgán požaduje být informován o kontrolních dnech akce.

Ostatní text rozhodnutí Krajského úřadu-Jihočeský kraj, Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví č.j. KUJCK 154867/2020, sp. zn. 147736/2020/pedo ze dne 28.12.2020 zůstává v platnosti.

ODŮVODNĚNÍ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu - Jihočeský kraj, obdržel dne 30.3.2021 podnět společnosti Prácheňské rybářství s.r.o., Pražská 286, 39701 Písek, IČO: 28094638 ke změně rozhodnutí

podle ust. § 84 odst. 1 písm a) zákona č.j. KUJCK 154867/2020 ze dne 28.12.2020 ve věci vydání výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů podle ust. § 56 zákona pro realizaci záměru „Obnova rybníční soustavy Purkratice, k.ú. Písek“.

Podle žadatele došlo díky nepříznivým klimatickým podmínkám (chladné počasí a srážky), které kromě fyzického provádění prací pozdrželo i výlov rybníka Prostřední, k pozdržení prací. Na tomto rybníce budou práce zahájeny na začátku dubna, na rybnících Zálesný a Nádvorný bylo dokončeno modelování bezzásahových zón, ale není dosud dokončeno vyvážení sedimentu z rybníční kotliny.

Zdejší správní orgán dospěl k názoru, že není účelné komplikovat akci tak, aby její provedení nebylo v souladu s podmínkami rozhodnutí a přistoupil k možnosti změny podmínek rozhodnutí podle ust. § 84 písm. a) zákona. Posun termínu nebude mít negativní vliv z hlediska navrženého řešení a není v zájmu ochrany přírody prodlužovat realizaci akce do příští sezóny.

Podáním bylo zahájeno správní řízení ve věci změny výše uvedeného rozhodnutí, zahájení správního řízení bylo oznámeno dopisem odeslaným dne 7.4.2021. Žádný z účastníků správního řízení neměl připomínek k navrženému řešení.

Správní orgán se zabýval otázkou, zda je možné výše uvedené rozhodnutí změnit ve smyslu ust. § 84 odst. 1., písm. a). Podle tohoto ustanovení může orgán ochrany přírody z vlastního podnětu nebo na návrh po provedeném řízení jím vydané rozhodnutí změnit, dojde-li ke změně skutečností rozhodných pro vydání rozhodnutí. V tomto případě žadatel upozornil, že některé ze skutečností, které byly podkladem pro vydání předchozího rozhodnutí, se změnilly. Tuto skutečnost lze považovat za změnu skutečností rozhodných pro vydání výjimky. Současně by tato změna neměla mít negativní vliv na zvláště chráněné druhy, naopak není v jejich zájmu prodlužovat realizaci akce do další hnízdní sezóny.


Zdejší správní orgán proto přistoupil ke změně podmínek rozhodnutí tak, aby byly pro žadatele splnitelné, a původní znění podmínky nahradil výše uvedeným textem.

Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, zvážil všechny okolnosti, které jsou mu známe, a dospěl k závěru, že změna podmínek rozhodnutí nebude v rozporu se zákonem. Udělenou výjimkou nedojde k ohrožení stávajících populací předmětných zvláště chráněných živočichů.

Poučení účastníků správního řízení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy II. v Č. Budějovicích, a to do 15- ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví v Českých Budějovicích.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru


v z. J. U. J. Hlavá
zástupce vedoucího odboru



Obdrží účastníci řízení na doručení:

- 1) Prácheňské rybářství s.r.o., Pražská 286, 39701 Písek (datová schránka)
- 2) Město Písek, Velké náměstí 114, 39701 Písek (datová schránka)

Na vědomí:

- 1) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Jižní Čechy, náměstí Přemysla Otakara II. 34, 37001 České Budějovice (datová schránka)
- 2) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice, U Výstaviště 16, 37001 České Budějovice (datová schránka)

Obnova rybníční soustavy Purkratice k.ú. Písek

Záznam z kontrolního dne č. 1 – 29.03.2021, 10:00 (dále jen KD1)

List č. 1

KD1 proběhl dne 29.03 od 10:00 do 12:00 za účasti zástupců OŽP Písek, investora, zhotovitele, nájemce, AD. – omluveni - TDI, OŽP Jihočeský kraj - viz prezenční listina - níže. Na jednání byl řešen další postup a dále byly stanoveny nové úkoly pro zajištění řádného postupu stavby – viz níže.

Prohlídka realizace stavby:

Rybník Zálesný - Prostor stavby je vyčištěn – proběhlo vykácení náletových porostů v prostoru výtopy a hráze rybníka a odvoz dřevní hmoty. Je provedeno vytěžení řídkého sedimentu a probíhá vytyčení řezů pro modelaci dna pláně.

Rybník Loučný – dtto Zálesný

Rybník Nádvorný – kácení probíhá- na hrázi hotovo, dokončuje se výtopa . Probíhá těžba řídkého sedimentu s vyvážením na zemědělské pozemky- provedena panelová trasa pro vývoz.

Rybník Rákosný – proběhlo kácení , vypuštěný, těžba sedimentu bude zahájena po vytěžení Nádvorného – přístup přes výtopu Nádvorného

Rybník Prostřední – je vypuštěný , proběhne kontrolní zaměření sedimentu geodety MZE (zítra), při pochůzce bylo řešeno pokácení odštíplého dubu na hrázi – viz úkoly- a byl odsouhlasen ořez nízko položených konkrétních větví pro průjezd techniky

Všeobecně – OŽP souhlasí s provedením kácení tak jak je provedeno k dnešnímu dni

– dle sdělení nájemce se zástupce JČK seznámil v pátek s rozsahem prací a vytyčených bezzásahových zón a s jejich stavem vyslovil souhlas

viz úkoly níže.

Úkoly z předání stavby – plnění:

- 1) Oznámení o zahájení výstavby – splněno – zasláno vodoprávnímu úřadu (nájemce Prácheňské rybářství)
- 2) Vytyčení prostorů ke kácení v zátopách – splněno – bylo provedeno na jeho základě proběhla a probíhá těžba ve výtopě
- 3) Předána kompletní dokumentace zhotoviteli včetně stanovisek existence sítí a dodatku k PD (AD, nájemce)

Nové úkoly vzešlé z jednání na KD1:

- 4) OŽP prověří a do konce března sdělí jak řešit žádost o pokácení odštíplého dubu na hrázi Prostředního
- 5) Žádost o prodloužení výjimky ze zvláště chráněných druhů na Jč kraj– zajistí nájemce

Trvalé úkoly


- 6) Provedení ochrany stromů na staveništi – bednění , ochrana kořenových systémů
- 7) Přejíždění po panelové trase v místě křížení pohybu techniky s vysokotlakým plynovodem
- 8) Zajištění sedimentu na budoucí mezdeponii proti rozplavení (ochranná hrázka)

Ostatní, .

Termín příštího KD bude dohodnut telefonicky v závislosti na průběhu stavby , předpoklad á 14 dnů

Dle jednání zapsal: Ing. Pavel Štěpán, AD

Záznam potvrdil : Ing Ondřej Kubašta TDS



Obnova rybníční soustavy Purkratice k.ú. Písek

seznam kontaktů pro realizaci

Jméno	email	telefon
Miroslav Dušek	prachenske.rybarstvi@seznam.cz	
Milena Hladíková	milena.hladikova@mupisek.cz	
Václav Zámečník	zamecnik@lmpisek.cz	
Petra Doktorová	doktorova@kraj-jihocesky.cz	
David Schwedt	david.schwedt@mupisek.cz	
Michal Maňhal	michal.manhal@mupisek.cz	
Petr Ježek	jezekp@hydrokov.cz	724008391
Ondřej Kubasta	kubasta@vhsconsult.cz	
Pavel Štěpán	pstepi@seznam.cz	721949840
Monika Kočvarová	kocvarova@hydrokov.cz	
Josef Klíma	klima@hydrokov.cz	731530189

Prezenční listina

Název akce: Rekonstrukce Purkratické soustavy

Místo konání, datum: 29. 5. 2021 10:00

Poř. číslo	Jméno a příjmení	Organizace	Kontakt, e-mail	Podpis účastníka
1	Miroslav Dušek	PRACHENSKÉ RYBÁŘSTVÍ	prachenske.rybarstvi@seznam.cz	[Podpis]
2	Milena Hladíková	MUPÍSEK, SM	milena.hladikova@mupisek.cz	[Podpis]
3	Václav Zámečník	ČOV Písek	zamecnik@lmpisek.cz	[Podpis]
4	Michal Maňhal	MUPÍSEK, OZP	michal.manhal@mupisek.cz	[Podpis]
5	Milena Hladíková	MUPÍSEK, SM	milena.hladikova@mupisek.cz	[Podpis]
6	David Schwedt	MUPÍSEK, ZP	david.schwedt@mupisek.cz	[Podpis]
7	Miroslav Dušek	PRACHENSKÉ RYBÁŘSTVÍ	prachenske.rybarstvi@seznam.cz	[Podpis]
8	Pavel Štěpán	PRACHENSKÉ RYBÁŘSTVÍ	pstepi@seznam.cz	[Podpis]
9				
10				

Obnova rybníční soustavy Purkratice k.ú. Písek

Záznam z kontrolního dne č. 2 – 09.04.2021, 10:00 (dále jen KD2)

List č. 1

KD2 proběhl dne 09.04 od 10:00 do 12:00 za účasti zástupců OŽP Jihočeský kraj, investora, zhotovitele, nájemce, AD (TDI,) - viz prezenční listina - níže. Na jednání byl řešen další postup a dále byly stanoveny nové úkoly pro zajištění řádného postupu stavby – viz níže.

Prohlídka realizace stavby:

Rybník Zálesný - Prostor stavby je vyčištěn – proběhlo vykácení náletových porostů v prostoru výtopy a hráze rybníka a odvoz dřevní hmoty. Je provedeno vytěžení řídkého sedimentu a je provedeno vytyčení řezů pro modelaci dna pláně.

Rybník Loučný – dtto Zálesný

Rybník Nádvorný – kácení ukončeno . Probíhá těžba řídkého sedimentu s vyvážením na zemědělské pozemky- provedena panelová trasa pro vývoz.

Rybník Rákosný – proběhlo kácení , vypuštěný, těžba sedimentu bude zahájena po vytěžení Nádvorného – přístup přes výtopu Nádvorného

Rybník Prostřední – je vypuštěný , proběhlo kontrolní zaměření sedimentu geodety MZE (konec března), . Probíhá těžba řídkého sedimentu s vyvážením na zemědělské pozemky

Všeobecně – JČK s proběhlým kácením a stavu bezzásahových zón k dnešnímu dni vyslovil souhlas

Vývoz na zemědělské pozemky probíhá dle dohody s uživatelem pozemků – školní statek – předokládá se vývoz do konce dubna přímo na zemědělské bloky – zbytek bude aplikován poté na dohodnutou mezideponii viz úkoly níže.

Úkoly vzešlé z jednání na KD1 - plnění:

- 1) OŽP prověří a do konce března sdělí jak řešit žádost o pokácení odštíplého dubu na hrázi Prostředního – **vyřešeno dle sdělení nájemce bude vydáno dodatečné povolení v horizontu 14 dnů**
- 2) Žádost o prodloužení výjimky ze zvláště chráněných druhů na Jč kraj– zajistí nájemce – **bylo podáno dle dohody se výjimka předokládá prodloužit do konce května**

Nové úkoly vzešlé z jednání na KD2:

- 3) Zástupce Jčk prověří možnost vytvoření vodní plochy okolo litorálu (ostrov) – bezzásahové zóně na rybníku Nádvorným – zóna na pravém břehu pod Loučným mezi nátokem z Loučného a odběrným objektem na rybník Bažný

Trvalé úkoly

- 4) Provedení ochrany stromů na staveništi – bednění , ochrana kořenových systémů
- 5) Přejíždění po panelové trase v místě křížení pohybu techniky s vysokotlakým plynovodem
- 6) Zajištění sedimentu na budoucí mezdeponii proti rozplavení (ochranná hrázka)

Ostatní, .

Termín příštího KD byl dohodnut na 23.04 v 10.00 na místě stavby

Dle jednání zapsal: Ing. Pavel Štěpán, AD

Záznam potvrdil : Ing Ondřej Kubašta TDS

Obnova rybníční soustavy Purkratice k.ú. Písek

Jméno	email	telefon
Miroslav Dušek	prachenske.rybarstvi@seznam.cz	
Milena Hladíková	milena.hladikova@mupisek.cz	
Václav Zámečník	zamecnik@lmpisek.cz	
Petra Doktorová	doktorova@kraj-jihocesky.cz	
David Schwedt	david.schwedt@mupisek.cz	
Michal Maňhal	michal.manhal@mupisek.cz	
Petr Ježek	jezekp@hydrokov.cz	724008391
Ondřej Kubasta	kubasta@vhsconsult.cz	
Pavel Štěpán	pstepi@seznam.cz	721949840
Monika Kočvarová	kocvarova@hydrokov.cz	
Josef Klíma	klima@hydrokov.cz	731530189

Prezenční listina

Název akce: Purkratice soustava KD2

Místo konání, datum: 9.4.2021

Poř. číslo	Jméno a příjmení	Organizace	Kontakt, e-mail	Podpis účastníka
1	KOČVAROVÁ MONIKA	HYDROKOV	kocvarova@hydrokov.cz	
2	DOKTOROVÁ PETRA	Kraj	doktorova@kraj-jihocesky.cz	
3	DUŠEK Miroslav	Prachenský rybářský ústav	prachenske.rybarstvi@seznam.cz	
4	Petr HLADÍK	Město Písek	petr.hladik@mupisek.cz	
5	MILENA HLADIKOVA	MĚSTO PÍSEK	milena.hladikova@mupisek.cz	
6	MIROSLAV DUŠEK	LEST MĚSTO PÍSEK	prachenske.rybarstvi@seznam.cz	
7	JOSEF KLÍMA	HYDROKOV	klima@hydrokov.cz	
8	Pavel Štěpán	AD		
9				

Záznam z kontrolního dne č. 3 – 23.04.2021, 10:00 (dále jen KD3)

List č. 1

KD3 proběhl dne 23.04 od 10:00 do 12:00 za účasti zástupců OŽP Jihočeský kraj, investora, zhotovitele, nájemce, AD (TDI,) - viz prezenční listina - níže. Na jednání byl řešen další postup a dále byly stanoveny nové úkoly pro zajištění řádného postupu stavby – viz níže.

Prohlídka realizace stavby:

Rybník Zálesný - Prostor stavby je vyčištěn – proběhlo vykácení náletových porostů v prostoru výtopy a hráze rybníka a odvoz dřevní hmoty. Je provedeno vytěžení řídkého sedimentu a je provedeno vytyčení řezů pro modelaci dna pláně.

Rybník Loučný – dtto Zálesný

Rybník Nádvorný – Probíhá těžba řídkého sedimentu s vyvážením na zemědělské pozemky- provedena panelová trasa pro vývoz. Na levém břehu započala modelace dna

Rybník Rákosný – proběhlo kácení , vypuštěný, těžba sedimentu bude zahájena po vytěžení Nádvorného – přístup přes výtopu Nádvorného

Rybník Prostřední – je vypuštěný , . Probíhá těžba řídkého sedimentu s vyvážením na zemědělské pozemky. Je provedena finální úprava levého břehu

Všeobecně – JČK se stavem bezzásahových zón k dnešnímu dni vyslovil souhlas – úprava zón na Nádvorném – viz úkoly níže

Vývoz na zemědělské pozemky probíhá dle dohody s uživatelem pozemků – školní statek –vývoz do konce dubna přímo na zemědělské bloky – pondělí 26.4. bude předána část bloků k orbě- do 30.4 bude předán zbytek – další sediment bude aplikován poté na dohodnuté mezideponie – v zátopě rybníka Ločný a nad alejí k Zálesnému

Zástupce investora MěÚ Písek vnesl požadavky obyvatel osady Purkratice z č.p. 10 a č.p. 20. U č.p. 10 je požadována obnova strouhy - viz níže. Požadavek z čísla 20 na opravu vyvaleného plotu shledali přítomní za účelový, je argumentováno poškozením projíždějí stavební technikou – vzhledem k tomu že trasa vývozu nevedla a ani nepovede kolem plotu č.p. 20 nelze špatně založený plot přičítat probíhající stavbě

viz úkoly níže.

Úkoly vzešlé z jednání na KD2 - plnění:

- 1) Zástupce Jčk prověří možnost vytvoření vodní plochy okolo litorálu (ostrov) – bezzásahové zóně na rybníku Nádvorném – zóna na pravém břehu pod Loučným mezi nátokem z Loučného a odběrným objektem na rybník Bažný – **JČK vyjádřil předběžný souhlas, po dohodě nájemce prověří provedení záměru v ochranném pásmu VN , trvá**

Nové úkoly vzešlé z jednání na KD3:

- 2) Obnovení odvodné strouhy u č.p. 10– **v rámci stavby bude zajištěno zhotovitelem – uvedení do původního stavu před zpět převzetím dokončené stavby, trvá**

Trvalé úkoly

- 3) Provedení ochrany stromů na staveništi – bednění , ochrana kořenových systémů, **pokyn je rozšířen o průběžné ořezání a ošetření poškozených větví při manipulaci technikou**
- 4) Přejíždění po panelové trase v místě křížení pohybu techniky s vysokotlakým plynovodem
- 5) Zajištění sedimentu na budoucí mezdeponii proti rozplavení (ochranná hrázka)

Ostatní..

Termín příštího KD byl dohodnut na 7.05 v 10.00 na místě stavby

Dle jednání zapsal: Ing. Pavel Štěpán, AD

Záznam potvrdil : Ing Ondřej Kubašta TDS

Obnova rybníční soustavy Purkratice k.ú. Písek









seznam kontaktů pro realizaci

Jméno	email	telefon
Miloslav Šatra	miloslav.satra@mupisek.cz	382 330 650
Miroslav Dušek	prachenske.rybarstvi@seznam.cz	
Milena Hladíková	milena.hladikova@mupisek.cz	
Václav Zámečník	zamecnik@mpisek.cz	
Petra Doktorová	doktorova@kraj-jihocesky.cz	
David Schwedt	david.schwedt@mupisek.cz	
Michal Maňhal	michal.manhal@mupisek.cz	
Petr Ježek	jezekp@hydrokov.cz	724008391
Ondřej Kubasta	kubasta@vhsconsult.cz	
Pavel Štěpán	pstepi@seznam.cz	721949840
Monika Kočvarová	kocvarova@hydrokov.cz	
Josef Klíma	klima@hydrokov.cz	731530189

Prezenční listina

Název akce: KD3 - Purkratice

Místo konání, datum: 23. 4. 2021

Poř. číslo	Jméno a příjmení	Organizace	Kontakt, e-mail	Podpis účastníka
1	Petra Doktorová	KÚ JSEK	doktorova@kraj-jihocesky.cz	
2	ŠATRA	MiW ZP		
3	ZÁMEČNÍK	Lety u Písek		
4	Miroslav Dušek	Prachenská rybářská s.p.o.	prachenske.rybarstvi@seznam.cz	
5	HLADÍKOVÁ	MĚSTO PÍSEK	milena.hladikova@mupisek.cz	
6	KLÍMA	HYDROKOV	klima@hydrokov.cz	
7	KOČVAROVÁ	HYDROKOV	kocvarova@hydrokov.cz	
8	Pavel Štěpán	AD		

Záznam z kontrolního dne č. 4 – 07.05.2021, 10:00 (dále jen KD4)

List č. 1

KD4 proběhl dne 7.05 od 10:00 do 11:00 za účasti zástupců OŽP Jihočeský kraj, investora, zhotovitele, nájemce, AD (TDI,) - viz prezenční listina - níže. Na jednání byl řešen další postup a dále byly stanoveny nové úkoly pro zajištění řádného postupu stavby – viz níže.

Prohlídka realizace stavby:

Rybník Zálesný - Prostor stavby je vyčištěn – proběhlo vykácení náletových porostů v prostoru výtopy a hráze rybníka a odvoz dřevní hmoty. Je provedeno vytěžení řídkého sedimentu a je provedeno vytyčení řezů pro modelaci dna pláně.

Rybník Loučný – dtto Zálesný – je použit jako mezideponie pro část těžného sedimentu – rozvoz na podzim - po skončení sklizně

Rybník Nádvorný – Probíhá těžba řídkého sedimentu s vyvážením na zemědělské pozemky- provedena panelová trasa pro vývoz. Na levém břehu provedena modelace dna, připraveny deponie na stavbu hráze

Rybník Rákosný – proběhlo kácení , vypuštěný, těžba sedimentu bude zahájena po vytěžení Nádvorného – přístup přes výtopu Nádvorného

Rybník Prostřední – je vypuštěný , . Probíhá těžba řídkého sedimentu s vyvážením na zemědělské pozemky. Je provedena finální úprava levého břehu, dokončuje je pravá část

Všeobecně – OŽP Písek sdělil že je vydáno dodatečné povolení k pokácení dubu nad výpustí u Prostředního a lípy na hrázi Nádvorného – před kácením je nutná kontrola z důvodu možného hnízdění ptáků – viz úkoly

Vývoz na zemědělské pozemky byl ukončen– školní statek –zemědělské bloky byly předány– další sediment je aplikován mezideponii – v zátopě rybníka Loučný a nadále k Zálesnému

Úkoly vzešlé z jednání na KD2 - plnění:

- 1) Zástupce Jčk prověří možnost vytvoření vodní plochy okolo litorálu (ostrov) – bezzásahové zóně na rybníku Nádvorným – zóna na pravém břehu pod Loučným mezi nátokem z Loučného a odběrným objektem na rybník Bažný – **JČK vyjádřil předběžný souhlas, po dohodě nájemce prověří provedení záměru v ochranném pásmu VN , trvá – bude dohodnuta schůzka s E-ONem - na dnešní KD se zástupce nedostavil**

Nové úkoly vzešlé z jednání na KD4:

- 2) pokácení dubu nad výpustí u Prostředního a lípy na hrázi Nádvorného – před kácením je nutná kontrola z důvodu možného hnízdění ptáků – **zajistí nájemce, zhotovitel**

Trvalé úkoly

- 3) Provedení ochrany stromů na staveništi – bednění , ochrana kořenových systémů, **pokyn je rozšířen o průběžné ořezání a ošetření poškozených větví při manipulaci technikou**
- 4) Přejíždění po panelové trase v místě křížení pohybu techniky s vysokotlakým plynovodem
- 5) ~~Zajištění sedimentu na budoucí mezideponii proti rozplavení (ochranná hrázka) – **zajištěno hráz Loučného**~~
- 6) Obnovení odvodné strouhy u č.p. 10– **v rámci stavby bude zajištěno zhotovitelem – uvedení do původního stavu před zpětpřevzetím dokončené stavby,**

Ostatní, .

Termín příštího KD byl dohodnut na 21.05 v 10.00 na místě stavby

Dle jednání zapsal: Ing. Pavel Štěpán, AD

Záznam potvrdil : Ing Ondřej Kubašta TDS

Obnova rybníční soustavy Purkratice k.ú. Písek









seznam kontaktů pro realizaci

Jméno	email	telefon
Miloslav Šatra	miloslav.satra@mupisek.cz	482 440 650
Miroslav Dušek	prachenske.rybarstvi@seznam.cz	
Milena Hladíková	milena.hladikova@mupisek.cz	
Václav Zámečník	zamecnik@Impisek.cz	
Petra Doktorová	doktorova@kraj-jihocesky.cz	
David Schwedt	david.schwedt@mupisek.cz	
Michal Maňhal	michal.manhal@mupisek.cz	
Petr Ježek	jezekp@hydrokov.cz	724008491
Ondřej Kubasta	kubasta@vhsconsult.cz	
Pavel Štěpán	pstepi@seznam.cz	721949840
Monika Kočvarová	kocvarova@hydrokov.cz	
Josef Klíma	klima@hydrokov.cz	741540189

Prezenční listina

Název akce: 20. 5. 4. Purkratická soustava

Místo konání, datum: 4. 5. 2020 10⁰⁰

Poř. číslo	Jméno a příjmení	Organizace	Kontakt, e-mail	Podpis účastníka
1	DOKTOROVÁ PETRA	KÚ PÍSEK	doktorov@kraj-jihocesky.cz	
2	Zámečník Václav	Lesy Písek		
3	DUŠEK Miroslav	Prachenská rybníkářská	prachenske.rybarstvi@seznam.cz	
4	KLÍMA JOSEF	HYDROKOV s.r.o.		
5	Michal Maňhal	MĚLI Písek, OŽP	michal.manhal@mupisek.cz	
6	MILENA HLADÍKOVÁ	MĚSTO PÍSEK		
7	PETRA DOKTOROVÁ	MĚSTO PÍSEK		
8	Pavel Štěpán	AD		

Záznam z kontrolního dne č. 5 – 21.05.2021, 10:00 (dále jen KD5)

List č. 1

KD5 proběhl dne 21.05 od 10:00 do 11:00 za účasti zástupců OŽP Písek, investora, zhotovitele, nájemce, AD (TDI,) - viz prezenční listina - níže. Na jednání byl řešen další postup a dále byly stanoveny nové úkoly pro zajištění řádného postupu stavby – viz níže.

Prohlídka realizace stavby:

Rybník Zálesný - Prostor stavby je vyčištěn – proběhlo vykácení náletových porostů v prostoru výtopy a hráze rybníka a odvoz dřevní hmoty. Je provedeno vytěžení řídkého sedimentu a je provedeno vytyčení řezů pro modelaci dna pláně.

Rybník Loučný – dtto Zálesný – je použit jako mezideponie pro část těžného sedimentu – rozvoz na podzim - po skončení sklizně

Rybník Nádvorný – Probíhá těžba řídkého sedimentu s vyvážením na mezideponii- provedena panelová trasa pro vývoz. Na levém břehu provedena modelace dna, připraveny deponie na stavbu hráze dokončuje se pravá strana

Rybník Rákosný – proběhlo kácení , vypuštěný, těžba sedimentu bude zahájena po vytěžení Nádvorného – přístup přes výtopu Nádvorného

Rybník Prostřední – je vypuštěný , .. Je provedena finální úprava pláně, připraveny deponie na stavbu hráze a případné protierozní terénní úpravy na levém břehu – viz úkoly

~~**Všeobecně** – OŽP Písek sdělil že je vydáno dodatečné povolení k pokácení dubu nad výpustí u Prostředního a lípy na hrázi Nádvorného – před kácením je nutná kontrola z důvodu možného hnízdění ptáků – z důvodů nevhodných klimatických podmínek proběhne kácení do konce května - viz úkoly~~

V rámci KD byla dohodnuta rekultivace pozemku 602/2 (pod Rákosným – v trase stříku na Bažný), plocha bude zbavena panelů , ohumusována a oseta s možností výsadeb. Panely budou využity v rámci majetku města na rybníční soustavě.

Úkoly vzešlé z jednání na KD2 - plnění:

- 1) Zástupce JČK prověří možnost vytvoření vodní plochy okolo litorálu (ostrov) – bezzásahové zóně na rybníku Nádvorným – zóna na pravém břehu pod Loučným mezi nátokem z Loučného a odběrným objektem na rybník Bažný – **JČK vyjádřil předběžný souhlas, po dohodě nájemce prověří provedení záměru v ochranném pásmu VN , – splněno schůzka s EG-d zajištěna na 26.5.**
- 2) pokácení dubu nad výpustí u Prostředního a lípy na hrázi Nádvorného – před kácením je nutná kontrola z důvodu možného hnízdění ptáků – **zajistí nájemce, zhotovitel – trvá**

Nové úkoly vzešlé z jednání na KD5:

- 3) Prověří se možnost provedení protierozní terénní úpravy na levém břehu rybníka Prostřední č.p. 560/1, připraví se zakres záměru - **zajistí nájemce, AD**

Trvalé úkoly

- 4) Provedení ochrany stromů na staveništi – bednění , ochrana kořenových systémů, **pokyn je rozšířen o průběžné ořezání a ošetření poškozených větví při manipulaci technikou, odstranění značky na dubu na hrázi Prostředního**
- 5) Přejíždění po panelové trase v místě křížení pohybu techniky s vysokotlakým plynovodem
- 6) Obnovení odvodné strouhy u č.p. 10– **v rámci stavby bude zajištěno zhotovitelem – uvedení do původního stavu před zpět převzetím dokončené stavby,**

Ostatní, ..

Termín příštího KD byl dohodnut na 4.06 v 10.00 na místě stavby

Dle jednání zapsal: Ing. Pavel Štěpán, AD

Záznam potvrdil : Ing Ondřej Kubašta TDS

Obnova rybníční soustavy Purkratice k.ú. Písek








seznam kontaktů pro realizaci

Jméno	email	telefon
Miloslav Šatra	miloslav.satrap@mupisek.cz	482 440 650
Miroslav Dušek	prachenske.rybarstvi@seznam.cz	
Milena Hladíková	milena.hladikova@mupisek.cz	
Václav Zámečník	zamecnik@lmpisek.cz	
Petra Doktorová	doktorova@kraj-jihocesky.cz	
David Schwedt	david.schwedt@mupisek.cz	
Michal Maňhal	michal.manhal@mupisek.cz	
Petr Ježek	jezekp@hydrokov.cz	724008491
Ondřej Kubasta	kubasta@vhsconsult.cz	
Pavel Štěpán	pstepi@seznam.cz	721949840
Monika Kočvarová	kocvarova@hydrokov.cz	
Josef Klíma	klima@hydrokov.cz	741540189

Prezenční listina

Název akce: KD Prachenská soustava

Místo konání, datum: 21.5.2021 10⁰⁰

Poř. číslo	Jméno a příjmení	Organizace	Kontakt, e-mail	Podpis účastníka
1	ŠATRA	MUP - ZP		
2	Miroslav DUŠEK	Prachenská rybníkářská s.r.o.		
3	JOSEF KLÍMA	HYDROKOV S.R.O.		
4	PĚTR JEŽEK	HYDROKOV S.R.O.		
5	HLADÍKOVÁ	MĚSTO PÍSEK		
6	HLADÍK PAVEL	Měch Písek		
7	Štěpán Pavel	AD		

Záznam z kontrolního dne č. 5 – 04.06.2021, 10:00 (dále jen KD6)

List č. 1

KD6 proběhl dne 04.06 od 10:00 do 11:00 za účasti zástupců OŽP Písek, ~~investora, zhotovitele~~, nájemce, AD (TDI,) Povodí - viz prezenční listina - níže. Na jednání byl řešen další postup a dále byly stanoveny nové úkoly pro zajištění řádného postupu stavby – viz níže.

Prohlídka realizace stavby:

Rybník Zálesný - Prostor stavby je vyčištěn – proběhlo vykácení náletových porostů v prostoru výtopy a hráze rybníka a odvoz dřevní hmoty. Je provedeno vytěžení řídkého sedimentu a probíhá modelace dna pláně.

Rybník Loučný – dtto Zálesný – je použit jako mezideponie pro část těžného sedimentu – rozvoz na podzim - po skončení sklizně

Rybník Nádvorný – Dokončena modelace- provedena panelová trasa pro vývoz. připraveny deponie na stavbu hráze - bude provedena úprava okolo litorálu – viz zápis KD 5 – byla odsouhlasena Jihočeským krajem a zástupcem E-ON - v příloze výřez situace řešení

Rybník Rákosný – proběhlo kácení , vypuštění, těžba sedimentu zahájena– přístup přes výtopu Nádvorného - se zástupcem povodí bylo dohodnuto pročištění stoky pod Rákosným pro odstranění uniklého materiálu z prostoru Rákosného – zástupce Povodí odsouhlasil. Zástupce OŽP upozornil na poškozený strom – viz úkoly níže

Rybník Prostřední – je vypuštěný , .. Je provedena finální úprava pláně, připraveny deponie na stavbu hráze a případné protierozní terénní úpravy na levém břehu – viz úkoly

Všeobecně – V rámci KD bylo konstatováno , že plochy v loukách- pod Zálesným- , které byly využity při vyvážení sedimentu, jsou zrekultivovány ale nejsou osety – OŽP požaduje nápravu (zápis bude zaslán na školní statek – dohoda o osetí se zhotovitelem).

Úkoly vzešlé z jednání na KD2, KD5 - plnění:

- 1) ~~Zástupce Jčk prověří možnost vytvoření vodní plochy okolo litorálu (ostrov) – bezzásahové zóně na rybníku Nádvorném – zóna na pravém břehu pod Loučným mezi nátokem z Loučného a odběrným objektem na rybník Bažný – JčK vyjádřil předběžný souhlas, po dohodě nájemce prověří provedení záměru v ochranném pásmu VN , – splněno – schůzka s EG-d zajištěna na 26.5. – splněno – viz výše Nádvorný~~
- 2) pokácení dubu nad výpustí u Prostředního a lípy na hrázi Nádvorného – před kácením je nutná kontrola z důvodu možného hnízdění ptáků – **zajistí nájemce, zhotovitel – splněno**
- 3) Prověří se možnost provedení protierozní terénní úpravy na levém břehu rybníka Prostřední č.p. 560/1, připraví se zakres záměru - **zajistí nájemce, AD – splněno**

Nové úkoly vzešlé z jednání na KD6:

- 4) **Zástupce OŽP požaduje , aby ho do 14 dnů kontaktoval zhotovitel ohledně dořešení poškození zeleně -**

Trvalé úkoly

- 5) Provedení ochrany stromů na staveništi – bednění , ochrana kořenových systémů, **pokyn je rozšířen o průběžné ořezání a ošetření poškozených větví při manipulaci technikou, odstranění značky na dubu na hrázi Prostředního**
- 6) Přejíždění po panelové trase v místě křížení pohybu techniky s vysokotlakým plynovodem
- 7) Obnovení odvodné strouhy u č.p. 10– **v rámci stavby bude zajištěno zhotovitelem – uvedení do původního stavu před zpět převzetím dokončené stavby,**

Ostatní, ..

Termín příštího KD byl dohodnut na 18.06 v 10.00 na místě stavby

Dle jednání zapsal: Ing. Pavel Štěpán, AD

Záznam potvrdil : Ing Ondřej Kubašta TDS

Obnova rybníční soustavy Purkratice k.ú. Písek






seznam kontaktů pro realizaci

Jméno	email	telefon
Miloslav Šatra	miloslav.satra@mupisek.cz	482 440 650
Miroslav Dušek	prachenske.rybarstvi@seznam.cz	
Milena Hladíková	milena.hladikova@mupisek.cz	
Václav Zámečník	zamecnik@lmpisek.cz	
Petra Doktorová	doktorova@kraj-jihocesky.cz	
David Schwedt	david.schwedt@mupisek.cz	
Michal Maňhal	michal.manhal@mupisek.cz	
Petr Ježek	jezekp@hydrokov.cz	724008491
Ondřej Kubasta	kubasta@vhsconsult.cz	
Pavel Štěpán	pstepi@seznam.cz	721949840
Monika Kočvarová	kocvarova@hydrokov.cz	
Josef Klíma	klima@hydrokov.cz	741540189


Prezenční listina

Název akce: KD.6. Purkratický vodotěr

Místo konání, datum: 4.6.2024

Poř. číslo	Jméno a příjmení	Organizace	Kontakt, e-mail	Podpis účastníka
1	Jan Mazák DiS	Povodí Últava, státní podnik	Jan.mazak@pvl.cz	
2	Miroslav DUŠEK	Prachenská rybářství	prachenske.rybarstvi@seznam.cz	
3	Václav Zámečník	Lesy národní přírodní		
4	ŠATRA Mil.	Mil - ZP		
5	Pavel Štěpán	AD		

Situace úpravy litorálu - Nádvorný

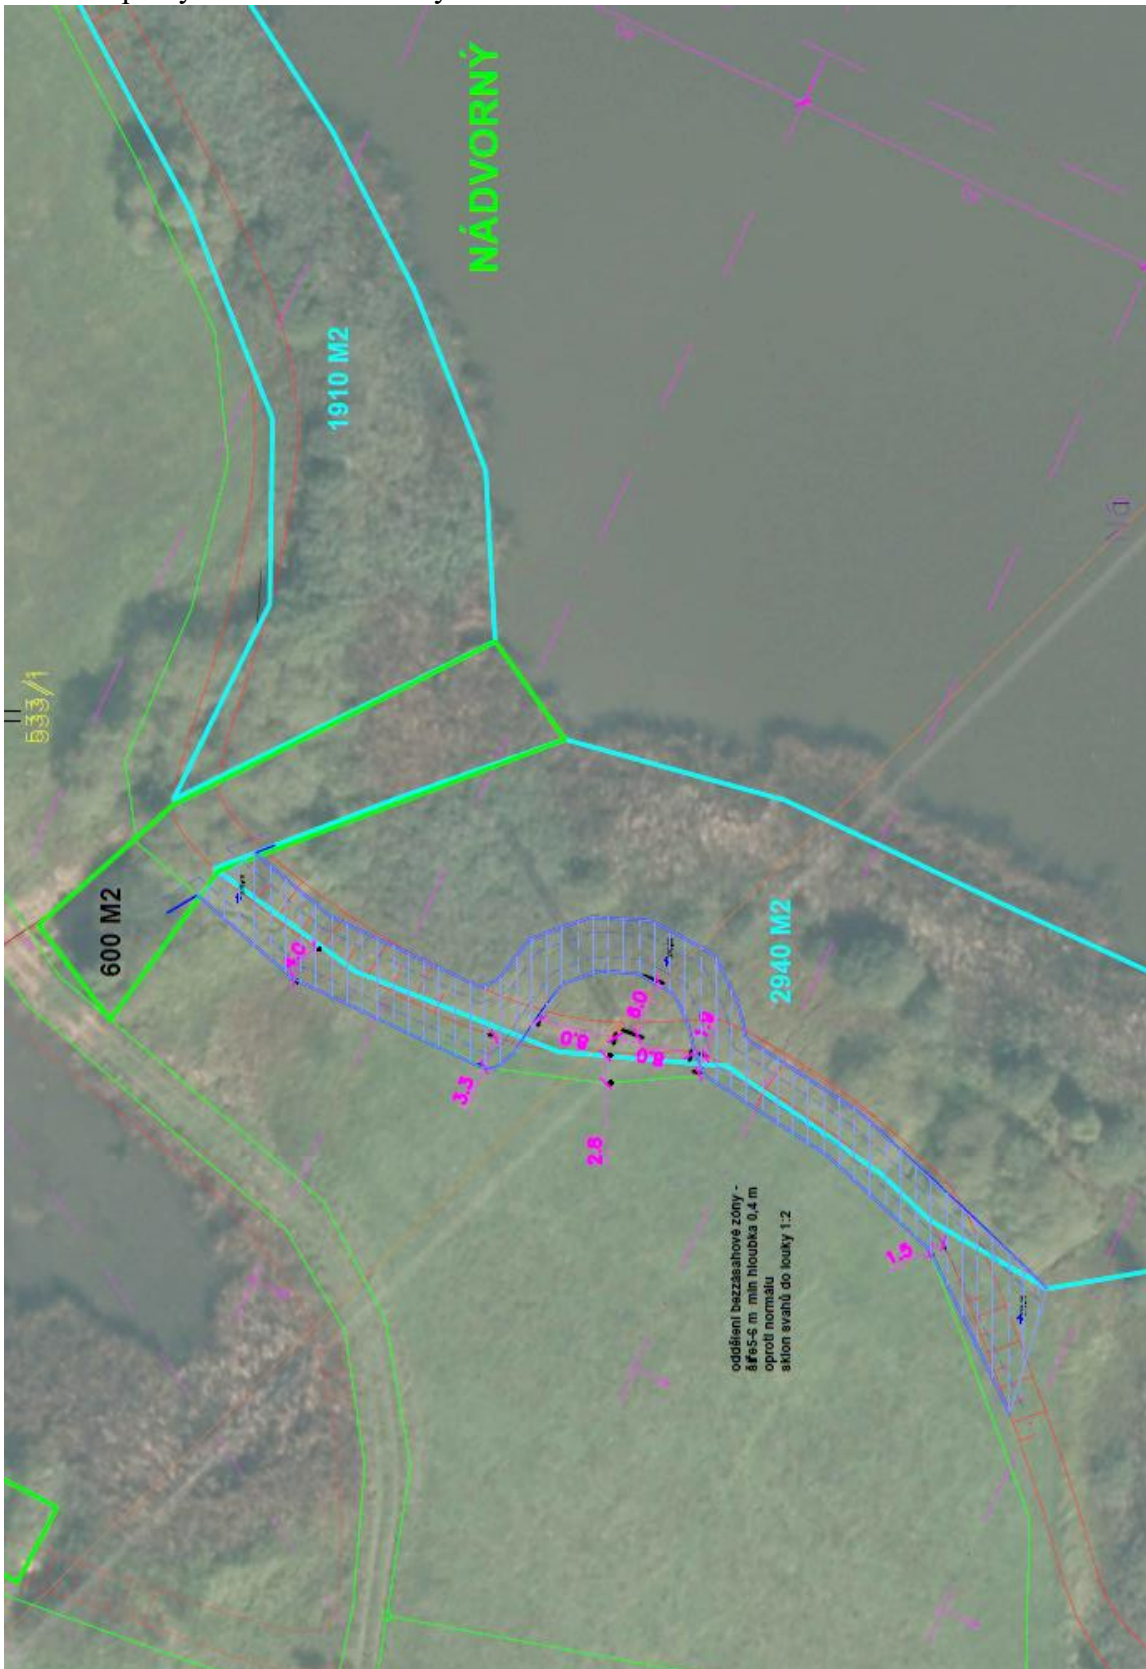

Záznam z kontrolního dne č. 7 – 25.06.2021, 12:00 (dále jen KD7)

List č. 1

KD7 proběhl dne 25.06 od 12:00 do 13:00 za účasti zástupců OŽP Písek, investora, zhotovitele, nájemce, AD (TDI,) - viz prezenční listina - níže. Na jednání byl řešen další postup a dále byly stanoveny nové úkoly pro zajištění řádného postupu stavby – viz níže.

Prohlídka realizace stavby:

Rybník Zálesný - Prostor stavby je vyčištěn – proběhlo vykácení náletových porostů v prostoru výtopy a hráze rybníka a odvoz dřevní hmoty. Je provedeno vytěžení řídkého sedimentu a dokončena modelace dna pláně. – připraveno na kontrolní měření MZE

Rybník Loučný – dtto Zálesný – je použit jako mezideponie pro část těžného sedimentu – rozvoz na podzim - po skončení sklizně

Rybník Nádvorný – Dokončena modelace- připraveno na kontrolní měření MZE provedena panelová trasa pro vývoz. připraveny deponie na stavbu hráze - probíhá úprava okolo litorálu , stávající kabel v hrázi - viz níže

Rybník Rákosný – proběhlo kácení , vypuštěný, těžba sedimentu – přerušena vzhledem ke klimatickým podmínkám – přístup přes výtopu Nádvorného - provedeno pročištění stoky pod Rákosným pro odstranění uniklého materiálu z prostoru Rákosného – viz KD6.

Rybník Prostřední – je vypuštěný , .. Je provedena finální úprava pláně- připraveno na kontrolní měření MZE, připraveny deponie na stavbu hráze a protierozní terénní úpravy na levém břehu – předána PD ke schválení stavebním úřadem

Všeobecně – Byl řešen překop hráze na Nádvorném při výskytu silového kabelu – dalšími dotazy u správců sítí bylo zjištěno že není nikde evidován (MO, dráhy, policie) Přítomní se shodli, že jde s velkou pravděpodobností o původní armádní kabel , který ale již MO neeviduje. Bude řešeno na příštím KD

OŽP konstatoval na pochůzce výskyt kuňky- v daném prostoru v obvodu stavby nedojde do konce září k jakýmkoli zásahům stavební techniky – viz trvalé úkoly

Úkoly vzešlé z jednání na KD6 - plnění:

- 1) **Zástupce OŽP požaduje , aby ho do 14 dnů kontaktoval zhotovitel ohledně dořešení poškození zeleně** - splněno

Nové úkoly vzešlé z jednání na KD6:

- 2) **nejsou**

Trvalé úkoly

- 3) Provedení ochrany stromů na staveništi – bednění , ochrana kořenových systémů, **pokyn je rozšířen o průběžné ořezání a ošetření poškozených větví při manipulaci technikou, ~~odstranění značky na dubu na hrázi Prostředního~~**
- 4) Přejíždění po panelové trase v místě křížení pohybu techniky s vysokotlakým plynovodem
- 5) Obnovení odvodné strouhy u č.p. 10– **v rámci stavby bude zajištěno zhotovitelem – uvedení do původního stavu před zpět převzetím dokončené stavby,**
- 6) **Respektování prostoru mezi hrází Loučného a nasypanou deponií – pruh od výpusti k stoce od Prostředního – výskyt kuňka**

Ostatní, .

Termín příštího KD byl dohodnut na 9.07 v 12.00 na místě stavby

Dle jednání zapsal: Ing. Pavel Štěpán, AD

Záznam potvrdil : Ing Ondřej Kubašta TDS

Obnova rybníční soustavy Purkratice k.ú. Písek

seznam kontaktů pro realizaci

Jméno	email	telefon
Miloslav Šatra	miloslav.satrap@mupisek.cz	482 440 650
Miroslav Dušek	prachenske.rybarstvi@seznam.cz	
Milena Hladíková	milena.hladikova@mupisek.cz	
Václav Zámečník	zamecnik@lmpisek.cz	
Petra Doktorová	doktorova@kraj-jihocesky.cz	
David Schwedt	david.schwedt@mupisek.cz	
Michal Maňhal	michal.manhal@mupisek.cz	
Petr Ježek	jezekp@hydrokov.cz	724008491
Ondřej Kubasta	kubasta@vhsconsult.cz	
Pavel Štěpán	pstepi@seznam.cz	721949840
Monika Kočvarová	kocvarova@hydrokov.cz	
Josef Klíma	klima@hydrokov.cz	741540189

Prezenční listina

Název akce: KP 4 Purkratická soustava

Místo konání, datum: 25.6.2021

Poř. číslo	Jméno a příjmení	Organizace	Kontakt, e-mail	Podpis účastníka
1	MILENA HLADÍKOVÁ	MĚSTO PÍSEK		
2	Václav Zámečník	hry město Písek		
3	Karel Fedubář	Město Písek		
4	David Schwedt	Mú Písek, z.p.		
5	Michal Maňhal	Město Písek, p.ř.p.		
6	JOSEF KLÍMA	HYDROKOV S.R.O.		
7	ŠATRA Miloslav	Město Písek		
8	DUŠEK Miroslav	Prachenská rybníkářská o.s.		
9	PEL HLADÍK	Město Písek		
10	PETRA DOKTOROVÁ	KÚ Písek		
11	PETRA JAROŠOVÁ	Mú PÍSEK		
12	Pavel Štěpán	AD		

Záznam z kontrolního dne č. 8 – 09.07.2021, 12:00 (dále jen KD8)

List č. 1

KD9 proběhl dne 23.07 od 12:00 do 13:00 za účasti zástupců ~~OŽP Písek~~, investora, zhotovitele, nájemce, AD (TDI,) - viz prezenční listina - níže. Na jednání byl řešen další postup a dále byly stanoveny nové úkoly pro zajištění řádného postupu stavby – viz níže.

Prohlídka realizace stavby:

Rybník Zálesný - Prostor stavby je vyčištěn – proběhlo vykácení náletových porostů v prostoru výtopy a hráze rybníka a odvoz dřevní hmoty. Je provedeno vytěžení řídkého sedimentu a dokončena modelace dna pláně. – připraveno na kontrolní měření MZE , jsou zahájeny práce na hrázovém tělese

Rybník Loučný – dtto Zálesný – je použit jako mezideponie pro část těžného sedimentu – rozvoz na podzim - po skončení sklizně

Rybník Nádvorný – Dokončena modelace- připraveno na kontrolní měření MZE provedena panelová trasa pro vývoz. připraveny deponie na stavbu hráze - probíhá úprava okolo litorálu , stávající kabel v hrázi - viz níže

Rybník Rákosný – proběhlo kácení , vypuštěný, těžba sedimentu – přístup přes výtopu Nádvorného - provedeno pročištění stoky pod Rákosným pro odstranění uniklého materiálu z prostoru Rákosného , byly vytyčeny sítě křížující odtok a řešen požadavek vlastníka p.č. 523 (opevnění a úprava břehu) – viz další viz úkoly.

Rybník Prostřední – je vypuštěný , .. Je provedena finální úprava pláně- připraveno na kontrolní měření MZE, připraveny deponie na stavbu hráze a protierozní terénní úpravy na levém břehu

Všeobecně – Byl řešen překop hráze na Nádvorném při výskytu silového kabelu — dle předběžné dohody bude kabel vypnut a přerušen- jde o původní vojenský kabel, který již není MO evidován

Kontrolní měření těžby sedimentu (MZE) bude provedeny na Nádvorném, Prostředním a Zálesném bez ohledu na dotěžení Rákosného – úkoly níže

Úkoly vzešlé z jednání na KD8 - plnění:

- 1) **nejsou**

Nové úkoly vzešlé z jednání na KD9:

- 2) Nájemce (Zhotovitel) zkontaktuje správce toku (Povodí) ohledně možného kácení s ohledem na přístup k mechanizace pod hráz Rákosného a podél odtoku
- 3) Se správci sítí (CETIN, EG-D) bude svolána schůzka za účasti města pro stanovení podmínek provádění stavby v blízkosti jejich sítí pod hrází Rákosného (zajistí AD, nájemce)
- 4) Zhotovitel zajistí vytyčení hranice parcely p.č. 23 do parcely rybníka pro dořešení požadavku vlastníka p.č. 523 (opevnění a úprava břehu) na dalším KD

Trvalé úkoly

- 5) Provedení ochrany stromů na staveništi – bednění , ochrana kořenových systémů, **pokyn je rozšířen o průběžné ořezání a ošetření poškozených větví při manipulaci technikou,**
- 6) Přejíždění po panelové trase v místě křížení pohybu techniky s vysokotlakým plynovodem
- 7) Obnovení odvodné strouhy u č.p. 10– **v rámci stavby bude zajištěno zhotovitelem – uvedení do původního stavu před zpět převzetím dokončené stavby,**
- 8) **Respektování prostoru mezi hrází Loučného a nasypanou deponií – pruh od výpusti k stoce od Prostředního – výskyt kuřka**

Ostatní, .

Termín příštího KD byl dohodnut na 06.08 v 12.00 na místě stavby

Dle jednání zapsal: Ing. Pavel Štěpán, AD

Záznam potvrdil : Ing Ondřej Kubašta TDS

Obnova rybníční soustavy Purkratice k.ú. Písek







seznam kontaktů pro realizaci

Jméno	email	telefon
Miloslav Šatra	miloslav.satra@mupisek.cz	482 440 650
Miroslav Dušek	prachenske.rybarstvi@seznam.cz	
Milena Hladíková	milena.hladikova@mupisek.cz	
Václav Zámečník	zamecnik@lmpisek.cz	
Petra Doktorová	doktorova@kraj-jihocesky.cz	
David Schwedt	david.schwedt@mupisek.cz	
Michal Maňhal	michal.manhal@mupisek.cz	
Petr Ježek	jezekp@hydrokov.cz	724008491
Ondřej Kubasta	kubasta@vhsconsult.cz	
Pavel Štěpán	pstepi@seznam.cz	721949840
Monika Kočvarová	kocvarova@hydrokov.cz	
Josef Klíma	klima@hydrokov.cz	741540189

Prezenční listina

Název akce: KD Purkratice

Místo konání, datum: 23.08.2021 1200

Poř. číslo	Jméno a příjmení	Organizace	Kontakt, e-mail	Podpis účastníka
1	MILENA HLADIKOVA	MĚSTO PÍSEK		
2	PETRA DOKTOROVA	KÚ PÍSEK		
3	ZÁMEČNÍK	Letný ústav Písek		
4	KLÍMA	HYDROKOV		
5	DUŠEK Miroslav	Prachénské rybníkářství		
6	ŠTEPÁN Pavel	AD		
7				
