

EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/787/14**



Číslo smlouvy zhotovitele: **JI/JC/2014/040**

**KUJCP018JLA1**

**SMLOUVA O DÍLO**  
**Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 C)**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I. Strany**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300


Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,  
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu  
Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:  
**Ing. Zdeňka Szcotková**, investiční technik odboru regionálního  
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského  
úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386 720 356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je  
oprávněn(a):

**SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK**  
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,  
tel. č. 606 715 690  
IČ: 70971641



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoba vykonávající technický dozor:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení (bude doplněno před podpisem smlouvy)	tel. č. (bude doplněno před podpisem smlouvy)
3	Okres Jindřichův Hradec - Modernizace silnice III/4088 N. Dvory-kř. II /152	Roman Pátek	606 612 232
3	Okres Jindřichův Hradec – Modernizace silnice III/40917 Olšany - H. Meziříčko - Palupín	Aleš Kolman	606 683 573

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.  
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Bankovní spojení: KB, a.s., č. ú. 7408201/0100  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
Michal Altrichter , ředitel oblasti Jih tel. č. 733 780 301

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant tel. č. 737 716 590

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Vít Weselý  
tel. č. 567 574 848

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Michal Kořínek  
tel. č. 733 780 411

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Pavel Pelikán  
tel. č. 733 780 332

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



### Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 7. 10. 2014 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

### „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8C)“

### II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje zavazuje k provedení díla:

**„Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8C)“,**  
a to za níže uvedené okresy (části veřejné zakázky):

Část díla	Název části
3	Okres Jindřichův Hradec - Modernizace silnice III/4088 N. Dvory - kř.II/152
3	Okres Jindřichův Hradec – Modernizace silnice III/40917 Olšany - H.Meziříčko - Palupín


Zhotovitel zhotoví pouze ty shora uvedené části díla, u kterých byla jeho nabídka hodnocena jako nejvhodnější. K tomu bude při podpisu této smlouvy připojena jako její příloha rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Zhotovitel naopak není jakkoliv oprávněn plnit či účtovat jakékoliv odměny, smluvní pokuty či náhrady škod za ty části plnění, u kterých jeho nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější.

Plnění kterékoliv části díla je možné zahájit pouze po předání písemného pokynu objednatele k plnění příslušné části díla. Bez předání písemného pokynu nelze poskytovat jakékoliv plnění a nelze účtovat jakékoliv odměny, smluvní pokuty či náhrady škod.

Pokud se dále v této smlouvě používá pojem „dílo“ rozumí se vždy jeho konkrétní jednotlivá část.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




3. Místo stavby:

Část díla	Název části a místo stavby
3	Okres Jindřichův Hradec - Modernizace silnice III/4088 N.Dvory-kř.II/152
3	Okres Jindřichův Hradec – Modernizace silnice III/40917 Olšany-H.Meziříčko-Palupín

4. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady, bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

### III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
  - a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo**, nedohodnou-li se strany jinak.
  - b) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): **do níže uvedeného počtu kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Část díla	Název části	Počet kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
3	Okres Jindřichův Hradec- Modernizace silnice III/4088 N.Dvory- kř.II/152	40
3	Okres Jindřichův Hradec – Modernizace silnice III/40917 Olšany- H.Meziříčko-Palupín	40


- Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
- Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).
- V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
- Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. A 2.) samostatným předávacím protokolem.

#### IV. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:

Část díla	Název části	Celkem v Kč bez DPH	DPH	Celkem v Kč vč. DPH
3	Okres Jindřichův Hradec	18 933 425	3 976 019	22 909 444

- Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, že o provedení provizorních položek obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná za objednatele jednat ve věci provádění stavby.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



3. Změna sjednané ceny je možná pouze
  - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
  - 5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
  - 5.2. Vícepráce budou řešeny takto:


Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacích řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s., pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
  - 5.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
  - 5.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

## V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ


Směr budoucnost - cíl prosperita



2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Veškeré položky stavebního rozpočtu (včetně tzv. „provizorních položek“), kde jsou jako měrné jednotky uvedeny Kč, KPL nebo SOUBOR, zhotovitel vykalkuluje tak, aby byl schopen po dokončení stavby na požádání objednatele doložit stanovení celkové fakturované částky příslušné položky formou podrobnějšího popisu stavebních prací s rozsahem či výkazů práce (timesheet) a výkazu použitého materiálu (nepostačí pouhé předložení případných subdodavatelských faktur). Pro projektové práce se pro timesheet použijí hodinové sazby dle ceníku UNIKA.
8. Faktura vystavená zhotovitelem bude označena logem poskytovatele dotace, názvem veřejné zakázky a číslem projektu. Číslo projektu (č. **proj.:CZ.1.14/1.1.00/30.02976**) bude uvedeno v textu faktury v části, která odkazuje na název veřejné zakázky.
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

#### VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.



EVROPSKÁ UNIE


PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni






EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněný zástupce objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
  13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněného zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatel a v souladu se ZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
  14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně foto publicity (billboard + plaketa), umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
  15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
  16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
  17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
  18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
  19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky na předmět plnění podle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat stejné (původní) požadavky na kvalifikovaného člena realizačního týmu.
23. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.
24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

## VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV. 1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ


Směr budoucnost - cíl prosperita



6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

#### VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinelé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ


Směr budoucnost - cíl prosperita



- povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
  7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou kolaudaci.
  8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
  9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti pro zhotovitele.
  10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí či kolaudačního souhlasu.

#### IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců**.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezabavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce **24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

#### X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
  - a) Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
  - b) Projektová dokumentace zpracovaná Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
7. Stavba je spolufinancována z dotačních fondů EU (ROP NUTS II Jihozápad), proto je zhotovitel povinen respektovat podmínky z této skutečnosti vyplývající.
8. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Sekretariátu regionální rady, MMR, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




9. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je určen v podmínkách o přidělení dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Přesný vzhled takového označení předá po odsouhlasení poskytovatelem dotace objednatel zhotoviteli před vlastní instalací.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho financováním (způsobem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění), na jednom místě do doby uplynutí tří let od uzavření operačního programu – tj. nejméně do konce roku 2025 dle č. 90 Nařízení (ES) 1083/2006. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta stanovená ve výše citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za projekt. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré dokumenty související s realizací díla označit logem poskytovatele dotace – viz publicita projektu.

#### XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je - li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

#### XII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši (viz níže v tabulce) za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši (viz níže v tabulce) za vadu a kalendářní den.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši (viz níže v tabulce) za každý kalendářní den prodlení.

Část díla	Název části	Pokuta dle odst. 2 „odstranění vad díla“	Pokuta dle odst. 3 „odstranění vad záruka“	Pokuta dle odst. 4 „vyklizení staveniště“
3	Okres Jindřichův Hradec	15.000,-	5.000,-	10.000,-

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

### XIII. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Zhotovitel se zavazuje s objednatelům uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání nebo zkušebního provozu.
3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelům zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
4. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců) dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Tato smlouva byla schválena Radou Jihočeského kraje usnesením č. 1274/2014/RK – 51 ze dne 27. 11. 2014.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




Přílohy:

- Oceněný výkaz výměr a soupis prací a dodávek
- Projektová dokumentace (bude doplněno při podpisu smlouvy)
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 15. 12. 2014

V Českých Budějovicích dne 16-01-2015


za objednatele:

  
.....  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje




V Jihlavě dne 6.1.2015

za zhotovitele:

  
.....  
Michal Altrichter  
ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s.

**COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005   
Tel: 286003505, Fax: 286003520



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Výkaz výměr

Modernizace silnice III/4088 N.Dvory - kř.II/152 průtah


JKSO - 822 2 - komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/4088	SO 101	3,563-4,010 4,445-6,222 km 3,563-zač.obce N.Dvory	2,224	5,9	m2	13 121,600	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 2224 * 5,9 = 13122	10 Kč	131 216 Kč
					m2	13 121,600	574 152	obrusná vrstva-ACO 16+, tl.60 mm 2224 * 5,9 = 13122	268 Kč	3 516 589 Kč
					m2	1 334,400	56932	dosypání krajnice štěrkodrť 50 mm 2224 * 0,6 = 1334,40	84 Kč	112 090 Kč
					ks	110,000	912 28	směrové sloupky z plast. hmot vč.odr.pás. 110	312 Kč	34 320 Kč
<b>SO 101 celkem</b>									<b>3 794 214 Kč</b>	
III/4088	SO 102	4,010-4,445 průtah N.Dvory	0,435	5,9	m2	2 566,500	567 534	obnova a opr.reykl.s reprof.za studena cem.a asf.do 180 mm - s odv. 40 mm 435 * 5,9 = 2566,5	330 Kč	846 945 Kč
					m2	2 566,500	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 435 * 5,9 = 2566,50	11 Kč	28 232 Kč
					m2	2 566,500	574 142	obrusná vrstva-ACO 11+, tl.50 mm 435 * 5,9 = 2566,50	244 Kč	626 226 Kč
					ks	6,000	89 922	výšková úprava mříží 6	1 443 Kč	8 658 Kč
<b>SO 102 celkem</b>									<b>1 510 061 Kč</b>	
	vedlejší a ostatní náklady				ks	1		DIO ( viz samostatný výkaz výměr )		39 512 Kč
					ks	1		pamětní deska (plast imitace bronzu)		6 300 Kč
					ks	1		billboard		7 000 Kč
<b>Vedlejší a ostatní náklady celkem</b>									<b>52 812 Kč</b>	
<b>Modernizace silnice III/4088 N.Dvory - kř.II/152 průtah celkem</b>									<b>5 357 087 Kč</b>	
									<b>včetně DPH</b>	<b>6 482 075,15 Kč</b>


Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

Přehledná situace :

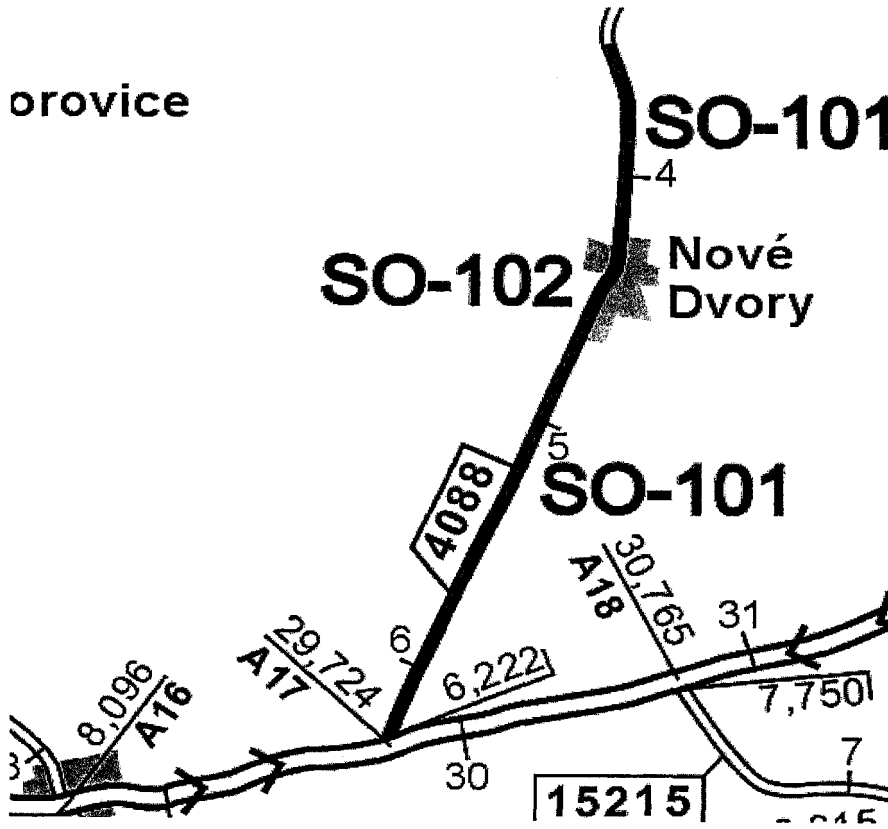

orovice

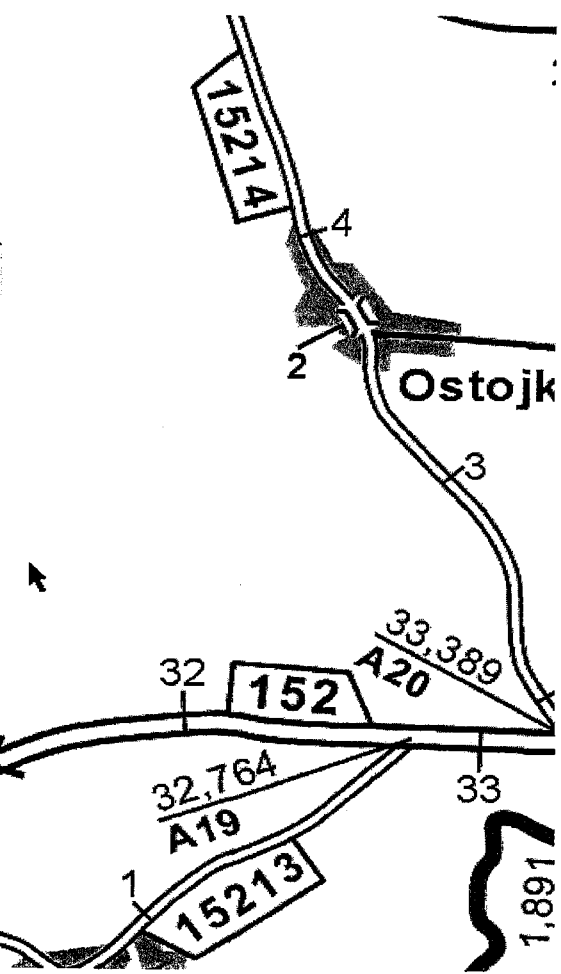

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Výkaz výměr DIO

Modernizace silnice III/4088, N.Dvory-kř.II/152 průtah

JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena			
III/4088	DIO	3,563-4,010 4,445-6,222	2,224	5,9	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	6 300 Kč	6 300 Kč			
										1			
					ks	4,00	914...	přelepění DZ vč. odlepení	125 Kč	500 Kč			
										4			
					ks	36,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 4(A15)+4(A7a)+10(B20a)+4(B21a)+4(B26)+2(IS 11b)+8(IS 11c)=36	187 Kč	6 732 Kč			
					ks	540,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 36 * 15 dní = 540	19 Kč	10 260 Kč			
					ks	2,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	187 Kč	374 Kč			
										2			
					ks	30,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 2 * 15 dní = 30	25 Kč	750 Kč			
					ks	2,00	916 122	doprav světló výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	1 249 Kč	2 498 Kč			
										2			
					ks	30,00	916122R	doprav světló výstražná souprava 3 ks - nájem 2 * 15 dní = 30	187 Kč	5 610 Kč			
					ks	20,00	916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a	50 Kč	1 000 Kč			
					20								
ks	300,00	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem 20 * 15 dní = 300	12 Kč	3 600 Kč								
ks	4,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	187 Kč	748 Kč								
					4								
ks	60,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem 4 * 15 dní = 60	19 Kč	1 140 Kč								
DIO celkem bez DPH										39 512 Kč			

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Výkaz výměr

Modernizace silnice III/40917 Olšany - H.Meziříčko - Palupín

JKSO - 822 2 - komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/40917	SO 101	0,000-1,026 1,326-2,760 3,440-6,289 Olšany-V.Jeníkov- H.Meziříčko-Palupín	5,309	4,8	m2	25 046,300	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 5329 * 4,7 = 25046,3	10 Kč	250 463 Kč
						25 046,300	574 132	ložná vrstva -ACO11+tl.35mm, vyrovnání 5329 * 4,7 = 25046,3	168 Kč	4 207 778 Kč
					m2	25 046,300	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 5329 * 4,7 = 25046,3	10 Kč	250 463 Kč
						25 046,300	574 142	obrusná vrstva-ACO 16+,tl.50mm 5329 * 4,7 = 25046,3	222 Kč	5 560 279 Kč
					m2	3 197,400	56932	dosypání krajnice štěrkokřt 100 mm 5329 * 0,3 * 2,00 = 3197,40	114 Kč	364 504 Kč
						ks	266,000	912 28	směrové sloupky z plast. hmot vč.odr.pás. 266	312 Kč
					<b>SO 101 celkem</b>					
III/40917	SO102	2,785-3,440 průtah H.Meziříčko	0,655	5,2	m2	3 406,000	567 544	obnova a opr.reykl.s reprof.za studena cem.a asf.do 180 mm,s odv. 50 mm 655 * 5,2 = 3406	330 Kč	1 123 980 Kč
						3 406,000	572 213	spoj postřik z emuze do 0,5 kg/m2 655 * 5,2 = 3406	11 Kč	37 466 Kč
					m2	3 406,000	574 142	obrusná vrstva-ACO 16+,tl.50mm 655 * 5,2 = 3406	230 Kč	783 380 Kč
						ks	13,000	89 922	výšková úprava hydrantů,šoupat 13	1 086 Kč
<b>SO 102 celkem</b>									<b>1 958 944 Kč</b>	
III/40917	SO 103	1,026-1,326 průtah V.Jeníkov	0,300	4,8	m2	1 440,000	567 544	obnova a opr.reykl.s reprof.za studena cem.a asf.do 180 mm,s odv. 50 mm 300 * 4,8 = 1440	330 Kč	475 200 Kč
						1 440,000	572 213	spoj postřik z emuze do 0,5 kg/m2 300 * 4,8 = 1440	11 Kč	15 840 Kč
					m2	1 440,000	574 142	obrusná vrstva-ACO 16+,tl.50mm 300 * 4,8 = 1440	234 Kč	336 960 Kč
						ks	5,000	89 922	výšková úprava hydrantů,šoupat 5	1 086 Kč
<b>SO 103 celkem</b>									<b>833 430 Kč</b>	
	vedlejší a ostatní náklady				ks	1		DIO (viz samostatný výkaz výměr)		54 185 Kč
					ks	1		pamětní deska (plast imitace bronzu)		6 300 Kč
					ks	1		billboard		7 000 Kč
<b>Vedlejší a ostatní náklady celkem</b>									<b>67 485 Kč</b>	

Modernizace silnice III/40917 Olšany - H.Meziříčko - Palupín celkem


13 576 338 Kč

včetně DPH 16 427 368,50 Kč

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládaný, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované dřtě, s nulovou tolerancí.

Přehledná situace :

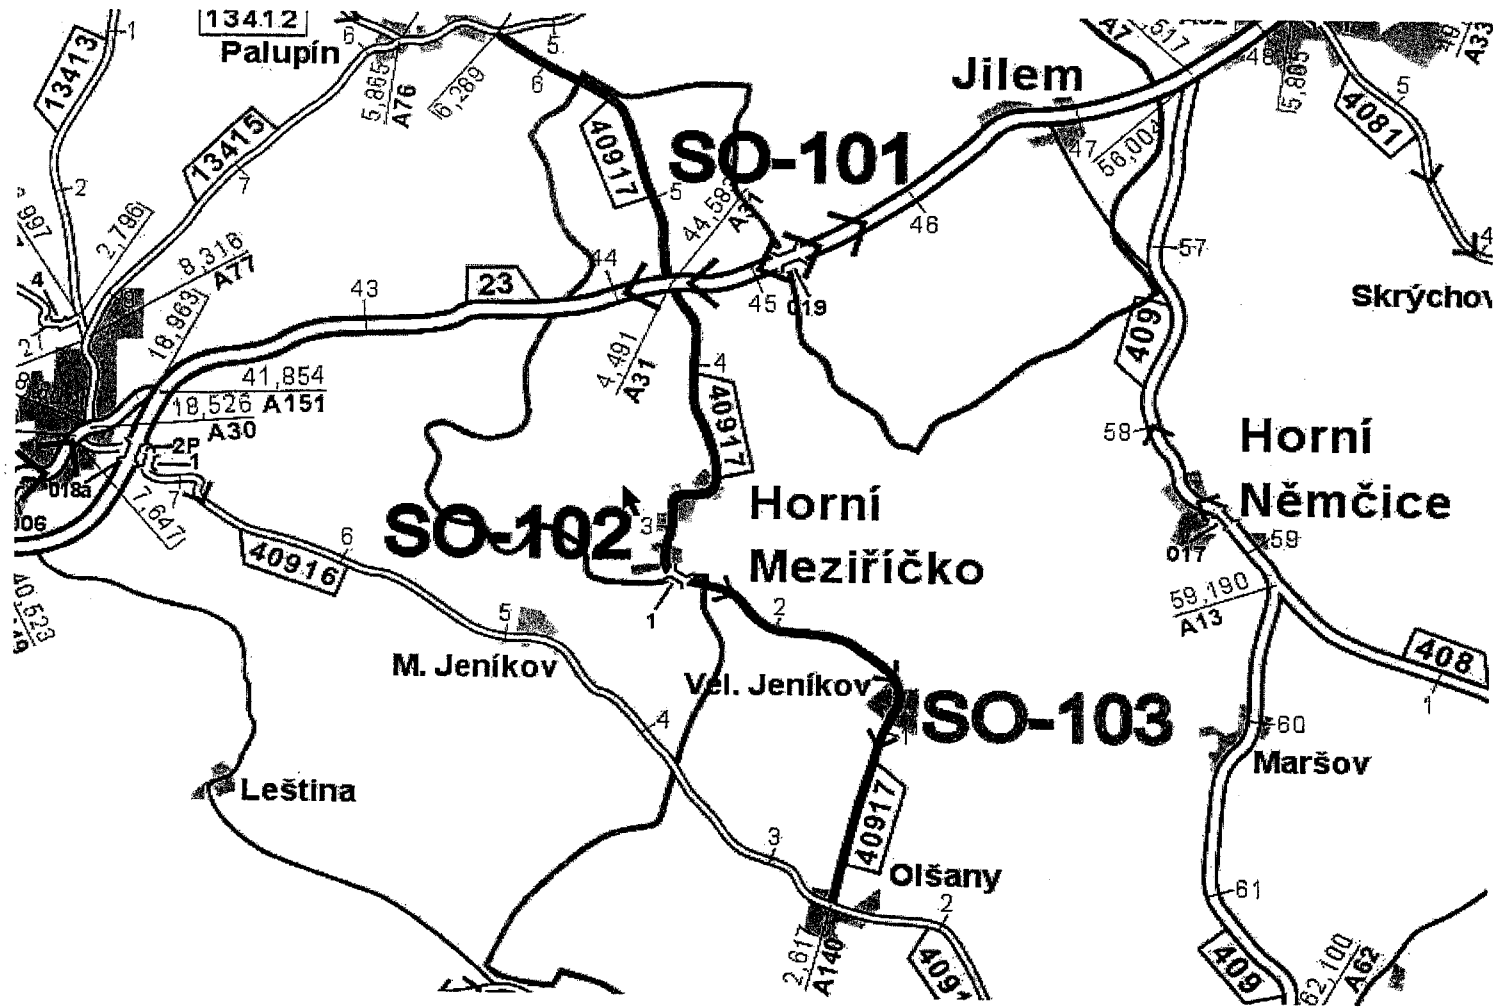


Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Výkaz výměr DIO

Modernizace silnice III/40917, Olšany-H.Meziříčko-Palupín

JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
II/40917	DIO	0,000-1,026 1,326-2,760 H.Meziříčko-Palupín	5,309	4,8	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	6 300 Kč	6 300 Kč
					ks	4,00	914...	přelepění DZ vč. odlepení	125 Kč	500 Kč
		2,785-3,440 průtah H.Meziříčko	0,655	5,2	ks	40,00	914 122	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 4(A15)+4(A7a)+10(B20a)+6(B21a)+4(B26)+2(IS 11b)+10(IS 11c)=40	187 Kč	7 480 Kč
					ks	800,00	914122R	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 40 * 20 dní = 800	19 Kč	15 200 Kč
		1,026-1,326	0,300	4,8	ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	187 Kč	748 Kč
					ks	80,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4 * 20 dní = 80	25 Kč	2 000 Kč
		ks	1,00	916 152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	1 249 Kč	1 249 Kč			
		ks	20,00	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem 1 * 20 dní = 20	487 Kč	9 740 Kč			
		ks	30,00	916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	50 Kč	1 500 Kč			
		ks	600,00	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem 30 * 20 dní = 600	12 Kč	7 200 Kč			
		ks	4,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	187 Kč	748 Kč			
		ks	80,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem 4 * 20 dní = 80	19 Kč	1 520 Kč			
		DIO celkem bez DPH								

## ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY P8C



Název zadavatele:	Jihočeský kraj
Sídlo zadavatele:	U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Název veřejné zakázky:	Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 C)
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení

Zadavatel rozhodl o

### výběru nejvhodnější nabídky

podané na plnění shora uvedené veřejné zakázky. Zadavatel současně upozorňuje uchazeče na lhůtu pro podání námitek podle § 110 odst. 4 a zákaz uzavření smlouvy podle § 82 odst. 1 zákona.

Nejvhodnějšími nabídkami jsou pro jednotlivé části veřejné zakázky (okresy) nabídky uchazečů:

Část VZ	Název části veřejné zakázky	Nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče (bližší identifikace uchazeče je uvedena výše v tabulce)
1	Okres České Budějovice	EUROVIA CS, a.s.
2	Okres Český Krumlov	SWIETELSKY stavební s.r.o.
3	Okres Jindřichův Hradec	COLAS CZ, a.s.
4	Okres Písek	STRABAG a.s.
5	Okres Prachatice	STRABAG a.s.
6	Okres Strakonice	ZNAKON, a.s.
7	Okres Tábor	STRABAG a.s.



Zadavatel dále níže uvádí další údaje o procesu zadání veřejné zakázky:

I.

Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena

Č.	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Sídlo/místo podnikání	Právní forma	IČ	DIČ
1.	EUROVIA CS, a.s.	Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19	a.s.	45274924	CZ45274924
2.	COLAS CZ, a.s.	Praha 9, Ke Kličovu 9, PSČ 190 00	a.s.	26177005	CZ26177005
3.	ZNAKON, a.s.	Sousedovice 44, PSČ 386 01	a.s.	26618055	CZ26618055
4.	Porr a.s.	Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00	a.s.	43005560	CZ43005560
5.	ALPINE Bau CZ s.r.o.	Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí	s.r.o.	02604795	CZ02604795
6.	Metrostav a.s.	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	akciov á společ nost	00014915	CZ00014915
7.	Skanska a.s.	Praha 4 - Chodov, Libalova 1/2348, PSČ 14900	akciov á společ nost	28271303	CZ28271303
8.	ROBSTAV stavby k.s.	Praha 2, Italská 1580/26, PSČ 120 00	k.s.	27430774	CZ27430774
9.	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	Louny, Václava Majera 573, PSČ 440 01	s.r.o.	10442481	CZ10442481
10.	Silnice Klatovy a.s.	Klatovy, Vídeňská 190	akciov á společ nost	45357307	CZ45357307
11.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	České Budějovice - České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04	s.r.o.	48035599	CZ48035599
12.	BERGER BOHEMIA a. s.	Plzeň, Klatovská 410, okres Plzeň-město	akciov á společ nost	45357269	CZ45357269
13.	D.I.S., spol. s r.o.	Brno - Královo Pole, Křížikova 3009/72a, PSČ 612 00	spol. s r.o.	46975616	CZ46975616
14.	STRABAG a.s.	Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00	a.s.	60838744	CZ60838744

**II.**

Výsledné pořadí nabídek pro jednotlivé části veřejné zakázky

<b>1. část (Okres České Budějovice)</b>			
Č.	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Nabídková cena bez DPH	Pořadí
1.	EUROVIA CS, a.s.	8 373 631,98 Kč	1
2.	COLAS CZ, a.s.	9 301 918,00 Kč	6
3.	Skanska a.s.	8 999 579,00 Kč	2
4.	ROBSTAV stavby k.s.	9 239 835,00 Kč	5
5.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	9 022 159,45 Kč	3
6.	D.I.S., spol. s r.o.	9 829 623,00 Kč	7
7.	STRABAG a.s.	9 067 383,12 Kč	4
Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:			
EUROVIA CS, a.s.			

**2. část (Okres Český Krumlov)**

Č.	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Nabídková cena bez DPH	Pořadí
1.	EUROVIA CS, a.s.	12 089 756,17 Kč	3
2.	ALPINE Bau CZ s.r.o.	13 156 338,00 Kč	6
3.	Skanska a.s.	12 603 269,00 Kč	4
4.	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	14 474 900,00 Kč	7
5.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	11 891 061,79 Kč	1
6.	D.I.S., spol. s r.o.	12 910 535,00 Kč	5
7.	STRABAG a.s.	12 076 095,72 Kč	2
Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:			
<b>SWIETELSKY stavební s.r.o.</b>			

3. část (Okres Jindřichův Hradec)			
Č.	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Nabídková cena bez DPH	Pořadí
1.	EUROVIA CS, a.s.	19 277 889,11 Kč	4

2.	COLAS CZ, a.s.	18 933 425,00 Kč	1
3.	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	22 246 600,00 Kč	6
4.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	19 274 754,56 Kč	3
5.	D.I.S., spol. s r.o.	19 938 631,00 Kč	5
6.	STRABAG a.s.	19 153 009,69 Kč	2
Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:			
COLAS CZ, a.s.			

4. část (Okres Písek)			
Č.	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Nabídková cena bez DPH	Pořadí
1.	EUROVIA CS, a.s.	4 638 480,22 Kč	4
2.	COLAS CZ, a.s.	4 799 087,00 Kč	7
3.	ZNAKON, a.s.	4 901 622,57 Kč	8

4.	Porr a.s.	4 613 718,79 Kč	2
5.	Skanska a.s.	4 620 010,00 Kč	3
6.	ROBSTAV stavby k.s.	4 797 316,00 Kč	6
7.	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	5 031 800,00 Kč	9
8.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	4 680 008,28 Kč	5
9.	D.I.S., spol. s r.o.	5 309 364,00 Kč	10
10.	STRABAG a.s.	4 178 128,96 Kč	1
Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:			
<b>STRABAG a.s.</b>			

5. část (Okres Prachatice)			
Č.	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Nabídková cena bez DPH	Pořadí
1.	EUROVIA CS, a.s.	4 629 573,96 Kč	2
2.	COLAS CZ, a.s.	4 904 992,00 Kč	5

3.	ZNAKON, a.s.	4 900 187,58 Kč	4
4.	Skanska a.s.	4 877 383,00 Kč	3
5.	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	5 636 300,00 Kč	8
6.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	4 985 566,66 Kč	6
7.	D.I.S., spol. s r.o.	5 205 909,00 Kč	7
8.	STRABAG a.s.	4 575 727,33 Kč	1
Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:			
<b>STRABAG a.s.</b>			

6. část (Okres Strakonice)			
Č.	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Nabídková cena bez DPH	Pořadí
1.	ZNAKON, a.s.	29 934 578,05 Kč	1
2.	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	34 912 400,00 Kč	7

3.	Silnice Klatovy a.s.	30 543 295,88 Kč	4
4.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	30 073 535,20 Kč	3
5.	BERGER BOHEMIA a. s.	33 821 964,47 Kč	6
6.	D.I.S., spol. s r.o.	31 510 927,00 Kč	5
7.	STRABAG a.s.	29 992 450,33 Kč	2
Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:			
<b>ZNAKON, a.s.</b>			

7. část (Okres Tábor)			
Č.	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Nabídková cena bez DPH	Pořadí
1.	EUROVIA CS, a.s.	10 848 127,10 Kč	7
2.	COLAS CZ, a.s.	10 612 912,00 Kč	5
3.	Porr a.s.	10 540 660,88 Kč	4
4.	Metrostav a.s.	10 482 721,90 Kč	3

5.	ROBSTAV stavby k.s.	10 685 952,00 Kč	6
6.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	10 324 801,77 Kč	2
7.	D.I.S., spol. s r.o.	11 010 556,00 Kč	8
8.	STRABAG a.s.	10 295 357,44 Kč	1
Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:			
<b>STRABAG a.s.</b>			

15-12-2014

V Českých Budějovicích dne \_\_\_\_\_

*Handwritten signature*

