



KUJCP00SWFD6

Č.smlouvy obj. SD/OREG/277/12

číslo smlouvy zhot. 2080043ZSL

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany**Objednatel : Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.úctu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Bc. Ludvík Zima, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic KÚ

tel.č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Jiří Letovský, investiční technik OREG, oddělení veřejných zakázek, investic a řízení
projektů KÚ

tel.č. 386720363

K výkonu technického dozoru stavebníka jako investora stavby je oprávněna firma:

Správa a údržba silnic JČK

IČ: 70971641

jednající

Miloslav Ouředník, ředitel SÚS JČK, tel.č. 387 021 010

se sídlem

Nemanická 10, 370 10 České Budějovice

Osoby vykonávající stavební dozor na jednotlivých částech stavby:

II/162 Frymburk - Blatná - Bohdalovice – p. **Jiří Němeček**, tel. **602 838 379**II/163 Slupečná - Lipno - Loučovice; II/160 Rožmberk nad Vltavou - Koller - p. **Jiří****Němeček**, tel. **602 838 379**

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel:**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1

kontaktní adresa: závod Č. Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

č. účtu: 1141380144/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, ve vložce 1561

certifikace ISO: 9001, 14001, 18001

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Novák

tel.č. 387 203 417

Odpovědný geodet:

tel.č.

Vedením stavby je pověřen: Ing. Jan Gucko

tel.č. 731 601 641

Zástupce stavbyvedoucího: Zdeněk Slabý

tel.č. 731 601 651

Kteří jsou zmocnění zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman tel.č. 731 601 635

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele) (vyplní uchazeč)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace zavazuje k provedení díla, které sestává z následujících dílčích úseků dle samostatných výkazů výměr:

II/162 Frymburk - Blatná - Bohdalovice,

II/163 Slupečná - Lipno - Loučovice; II/160 Rožmberk nad Vltavou - Koller

Místo stavby: silnice II. a III. třídy v okrese Český Krumlov

Druh výstavby: oprava, modernizace

Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu i nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem a v souladu s obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.
4. Součástí díla je též zhotovení zejména zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí třetích osob, písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jakoby je prováděl on sám. Práce na hlavním stavebním objektu provede zhotovitel vlastními kapacitami. Za vlastní kapacity se považují zaměstnanci v pracovním poměru k osobě zhotovitele nebo k osobě zhotovitelem ovládané nebo k osobě zhotovitele ovládající. Pokud bude tato podmínka porušena, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny díla. Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek, a to pod pokutou ve výši 25 % z ceny veřejné zakázky.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště** (předpoklad červenec 2012)
Výstavba bude dokončena: **do 60 kalendářních dnů ode dne předání staveniště**

Technologická přestávka, nebo jiné přerušení prací, je možné pouze na základě dohody s investorem a v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek (např. údaje ČHMÚ apod.), či jiných prokazatelných a objektivních důvodů, které neumožní zachování technologických postupů.

2. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatnými předávacími protokoly pro dílčí úseky vymezené samostatnými výkazy výměr.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Cena bez DPH 68 632 314,20 Kč
(slovy: šedesátosmmilionůšestsetřicetdvatisícetřistačtrnáct Korun českých dvacet haléřů)
DPH ve výši 13 726 462,84 Kč
(slovy: třináctmilionůsedmsetdvacetšesttisícčtyřistašedesátdvě Koruny české osmdesátčtyři haléře)

Cena s DPH ve výši 82 358 777,04 Kč
(slovy: Osmdesátdvamilionytřístapadesátosmtisícšedemsetšedmdesátsedm Korun českých čtyři haléře)

(dále též „Cena za provedení díla“)

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
 - d) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
 - e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito podmínkami.

6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

6.2. Vícepráce budou oceněny takto

na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

6.3. Méněpráce budou oceněny takto

do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy včetně provizorních položek, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu – Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku OREG KÚ nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
3. Splátnost daňového dokladu bude **do 60 dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.). Zhotovitel je povinen odevzdávat vážní lístky obalované směsí průběžně (po jednotlivých dodávkách) technickému dozoru nebo v jeho nepřítomnosti pověřenému pracovníkovi příslušného závodu SÚS – /platí u souvislých oprav silnic – pásmovky/.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek TDI) do výše 90 % fakturované částky za příslušný měsíc. Tímto způsobem bude zapláceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla jako celku (dle čl. II.odst. 1.), zbývajících 5 % bude uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele, po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby nebo díla jako celku. Ustanovení čl. V.1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 550 a násl. obchodního zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Zhotovitel prokázal objednateli ve své nabídce odběrné místo živičných směsí doložením potvrzeného tiskopisu „Závazný příslib na dodávku obalovaných směsí“ z obalovny v dopravní vzdálenosti v souladu s příslušnými TP a ČSN a v množství nutném pro řádné provedení příslušných prací. Tento doklad je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Objednatel a technický resp. technický dozor investora (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.



7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věci provádění stavby dle této smlouvy.
13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a stavební dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
14. Zhotovitel si smluvně zajistí u oprávněné organizace provedení Záchraného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění. Prokazatelné náklady na jeho provedení uhradí objednatel. Smlouva o provedení výzkumu bude objednateli předána ještě před zahájením výkopových prací a bude obsahovat i kalkulaci nákladů na jeho provedení. Zahájení výkopových prací oznámí zhotovitel v předstihu oprávněné organizaci, se kterou bude smlouva uzavřena.
15. Při dodávce obalovaných směsí budou pravidelně a průběžně dodávány technickému dozoru nebo jinému pověřenému pracovníkovi vážní lístky, dokladující množství dodané směsi. Vážní lístky budou odevzdány v ten den, ve kterém bude směs na stavbu dodána.

VII. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 14 dnů po uzavření smlouvy o dílo, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1.
3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.

2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn. **36 měsíců na obrusné vrstvy a 60 měsíců na ostatní práce.**
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisu bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
 - Nabídka zhotovitele
 - Zvláštní technické kvalitativní podmínky uvedené stavby (ZTKP), pokud jsou součástí projektu pro zadání stavby a doplňky k těmto podmínkám
 - Technické kvalitativní podmínky (TKP) vydané MDS ČR, platné k datu Oznámení zadávacího řízení
 - Technické podmínky (TP) MD ČR, resp. MDS ČR
 - Oborový třídík stavebních konstrukcí a prací staveb PK
 - Zadávací dokumentace
 - Zápis o předání staveniště
2. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů následující:
 - smlouva o dílo
 - dokumenty uvedené v pořadí dle odst. 1
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
8. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění či ke škodám z provozní činnosti, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XI. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý kalendářní den, který uplyne mezi lhůtou dokončení a dnem předání díla objednateli smluvní pokutu ve výši 62.000,- Kč. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbujuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za vadu a den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení a vyčištění staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla.
6. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
7. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.


X. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu v souladu s ustanovením § 640 z.č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne 19.7.2012
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 17-07-2012
za zhotovitele:

Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje





EUROVIA VINCI

EUROVIA CS, s. s.
Národní 10
113 19 Praha 1

Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.

Program modernizace komunikací II. a III. třídy Jihočeského kraje (P3)
Okres Český Krumlov

II/162 Větřní - Blatná – Frymburk	38 259 041,80 Kč
II/163 Slupečná – Lipno – Loučovice; II/160 Rožmberk nad Vltavou	30 373 272,40 Kč
NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	68 632 314,20 Kč
DPH 20 %	13 726 462,84 Kč
CELKEM CENA VČ. DPH	82 358 777,04 Kč




EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 1

Ing. Zdeněk NOVÁK
ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.

Poznámka:

- * Uvedený rozsah prací je předpokládaný pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu)
- * Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací a budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami)
- * Přebytečný materiál bude uskladněn na skládce SÚS JčK Český Krumlov, skládka Kájov
- * Oprava vozovky vč. rozjezdů, sjezdů, autob. zastávek, křižovatek
- * Kontaktní osoba p.J.Eder - tel.606500580
- * Realizace bude prováděna pokud možno za úplné uzavírky - způsob projedná zhotovitel
- * Vytýčení inženýrských sítí zajistí dodavatel
- * Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JčK, závod Český Krumlov
- * U všech položek bude uváděna jednotková cena

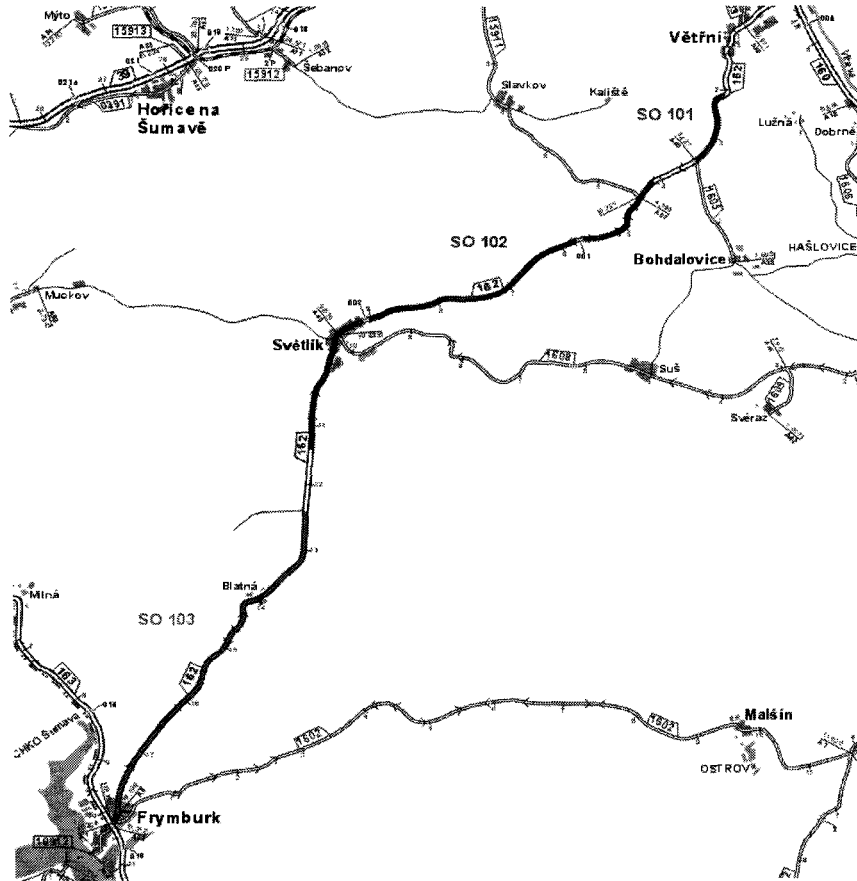Přehledná situace :



P.

Rekapitulace stavby : ČK Rekonstrukce silnice Větrní -

SO č. 101	3 262 972,00 Kč
SO č. 102	18 190 209,80 Kč
SO č. 103	15 052 930,00 Kč
SO č. 104	1 752 930,00 Kč
Celkem bez DPH	38 259 041,80 Kč
DPH 20%	7 651 808,36 Kč
Celkem s DPH	45 910 850,16 Kč

- Blatná - Frymburk, silnice II/162

Stavba: ČK - Rekonstrukce silnice Větrní - Blatná - Frymburk, silnice II/162
 Objekt: SO 101 - II/162 2,168 - 3,427 km d= 1259 m, š= 6 m,
 Rozpočet: SO 101 - II/162 2,168 - 3,427 km d= 1259 m, š= 6 m,

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
1 Zemní práce										
1	113725		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM fréz.tl.50mm,30% plochy(diagnostika) (1259*6*0,05)/100*30=113,310 [A]	M3	113,31	730,00	82 716,30	0,00	0,00	82 716,30
1 Zemní práce							82 716,30	0,00	0,00	82 716,30
5 Komunikace										
2	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM se ztuhnutím,š=0,25m□□1259*2*0,25=629,500 [A]	M2	629,50	85,00	53 507,50	0,00	0,00	53 507,50
3	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 1259*6=7 554,000 [A]	M2	7 554,00	13,00	98 202,00	0,00	0,00	98 202,00
4	574142		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM obrus.vrstva,ACO 11,tl.50mm□□1259*6=7 554,000 [A]	M2	7 554,00	213,00	1 609 002,00	0,00	0,00	1 609 002,00
5	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání,ACO 16,tl.30mm 1259*6*0,03*2,4=543,888 [A]	T	543,89	1 740,00	946 368,60	0,00	0,00	946 368,60
6	577411a		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání,ACO 16,tl.50mm,30% plochy(diagnostika) 113,31*2,4=271,944 [A]	T	271,94	1 740,00	473 175,60	0,00	0,00	473 175,60
5 Komunikace							3 180 255,70	0,00	0,00	3 180 255,70
Celkem:							3 282 972,00	0,00	0,00	3 282 972,00

ASPE 8

Stavba: ČK - Rekonstrukce silnice Větrní - Blatná - Frymburk, silnice II/162
 Objekt: SO 102 - II/162 4,172 - 11,410 d=7238m š=6m
 Rozpočet: SO 102 - II/162 4,172 - 11,410 d=7238m š=6m

Poř.č.	Položka	Typ	Text	M.J	Množství	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
1 Zemní práce										
1	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM fréz.tl.80mm,500m,průtah Světlík □ 500*6*0,08=240,000 [A]	M3	240,00	940,00	225 600,00	0,00	0,00	225 600,00
2	113728a		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM lok.poruchy,fréz.tl.50mm,9500m2 9500*0,05=475,000 [A]	M3	475,00	880,00	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00
1 Zemní práce							643 600,00	0,00	0,00	643 600,00
5 Komunikace										
3	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM se zhuťněním,š=0,25m □ □ 7238*2*0,25=3 619,000 [A]	M2	3 619,00	85,00	307 615,00	0,00	0,00	307 615,00
4	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 7238*6=43 428,000 [A]	M2	43 428,00	13,00	564 564,00	0,00	0,00	564 564,00
5	574142		ASFALTOVÝ BETON TRĚ II TL 50MM obrus.vrstva,ACO 11 □ □ 7238*6=43 428,000 [A]	M2	43 428,00	213,00	9 250 164,00	0,00	0,00	9 250 164,00
6	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání,ACO 16,tl.30mm 7238*6*0,03*2,4=3 126,816 [A]	T	3 126,82	1 740,00	5 440 666,80	0,00	0,00	5 440 666,80
7	577411a		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU lok.poruchy,9500m2,ACO 16,tl.50mm 9500*0,05*2,4=1 140,000 [A]	T	1 140,00	1 740,00	1 983 600,00	0,00	0,00	1 983 600,00
5 Komunikace							17 546 609,80	0,00	0,00	17 546 609,80
Celkem:							18 190 209,80	0,00	0,00	18 190 209,80

Stavba: ČK - Rekonstrukce silnice Větrní - Blatná - Frymburk, silnice II/162
 Objekt: SO 103 - II/162 12,410 - 18,184km d=5774m š=6m
 Rozpočet: SO 103 - II/162 12,410 - 18,184km d=5774m š=6m

Poř.č.	Položka	Typ	Text	M.J.	Množství	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
1 Zemní práce										
1	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM fréz.tl.50mm,30% plochy(diagnostika) (5774*6*0,05)/100*30=519,660 [A]	M3	519,66	900,00	467 694,00	0,00	0,00	467 694,00
1 Zemní práce							467 694,00	0,00	0,00	467 694,00
5 Komunikace										
2	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM se zhutněním,š=0,25m□ 5774*2*0,25=2 887,000 [A]	M2	2 887,00	85,00	245 395,00	0,00	0,00	245 395,00
3	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 5774*6=34 644,000 [A]	M2	34 644,00	13,00	450 372,00	0,00	0,00	450 372,00
4	574142		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM obrus.vrstva,ACO 11□□5774*6=34 644,000 [A]	M2	34 644,00	213,00	7 379 172,00	0,00	0,00	7 379 172,00
5	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání,ACO 16.tl.30mm 5774*6*0,03*2,4=2 494,368 [A]	T	2 494,37	1 740,00	4 340 203,80	0,00	0,00	4 340 203,80
6	577411a		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání,ACO 16.tl.50mm,30% plochy(diagnostika) (5774*6*0,05*2,4)/100*30=1 247,184 [A]	T	1 247,18	1 740,00	2 170 093,20	0,00	0,00	2 170 093,20
5 Komunikace							14 585 236,00	0,00	0,00	14 585 236,00
Celkem:							15 052 930,00	0,00	0,00	15 052 930,00


Stavba: ČK - Rekonstrukce silnice Větrní - Blatná - Frymburk, silnice II/162
 Objekt: SO 104 - doplňující údaje
 Rozpočet: SO 104 - doplňující údaje

Poř.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
0 Všeobecné konstrukce a práce										
1			billboard vč.dodání,osazení,odstranění	KUS	1,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
2			pamětní plaketa vč.dodání a osazení	KUS	1,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
4	DIO		dopravně inženýrské opatření	KPL	1,00	105 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						120 000,00		0,00		120 000,00
5 Komunikace										
3	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU oprava objízdných tras,AC	T	1 027,00	1 590,00	1 632 930,00	0,00	0,00	1 632 930,00
5 Komunikace						1 632 930,00		0,00		1 632 930,00
Celkem:						1 752 930,00		0,00		1 752 930,00

Poznámka:

- * Uvedený rozsah prací je předpokládaný pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu)
- * Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací a budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami)!
- * Přebytečný materiál bude uskladněn na skládce SÚSJč Český Krumlov, skládka Vyšší Brod
- * Oprava vozovky vč. rozjezdů, sjezdů, autob. zastávek, křižovatek
- * Kontaktní osoba p. J. Eder - tel. 606500580
- * Realizace bude prováděna pokud možno za úplné uzavírky - způsob projedná zhotovitel
- * Vyřízení inženýrských sítí zajistí dodavatel
- * Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JčK, závod Český Krumlov
- * U všech položek bude uváděna jednotková cena

Přehledná situace :

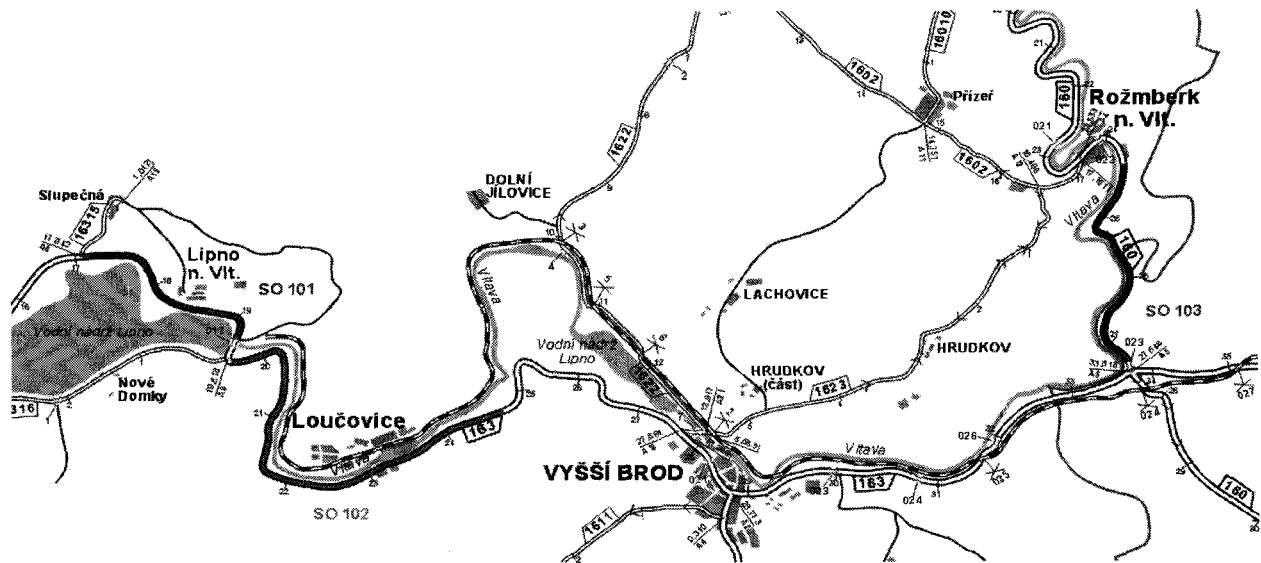

P.

Rekapitulace stavby : ČK Rekonstrukce silnice,silnice II/163 Slupečná - Lipno nad Vltavou - Loučovice, rekonstrukce silnice Rožmberk nad Vltavou, silnice II/160

SO č. 101	6 390 636,00 Kč
SO č. 102	14 949 491,20 Kč
SO č. 103	7 578 705,20 Kč
SO č. 104	1 454 440,00 Kč
Celkem bez DPH	30 373 272,40 Kč
DPH 20 %	6 074 654,48 Kč
Celkem s DPH	36 447 926,88 Kč

Stavba: ČK - Rek.silnice II/163 Slupečná-Lipno nad Vítavou-Loučovice,rek.silnice Rožmberk n.Vlt.,silnice II/160
 Objekt: SO 101 - II/163 17,062 - 19,449 km, d= 2387 m, š= 7 m,
 Rozpočet: SO 101 - II/163 17,062 - 19,449 km, d= 2387 m, š= 7 m,

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
1 Zemní práce										
1	113725		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM fréz.tl.80mm,průtah Lipno,1000m ² 1000*7*0,08=560,000 [A]	M3	560,00	720,00	403 200,00	0,00	0,00	403 200,00
1 Zemní práce							403 200,00	0,00	0,00	403 200,00
5 Komunikace										
2	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM se zhutněním,š=0,5m ² (2387-1000)*2*0,5=1 387,000 [A]	M2	1 387,00	85,00	117 895,00	0,00	0,00	117 895,00
3	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 2387*7=16 709,000 [A]	M2	16 709,00	13,00	217 217,00	0,00	0,00	217 217,00
4	574142		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM obrus.vrstva,ACO 11 ² 2387*7=16 709,000 [A]	M2	16 709,00	213,00	3 559 017,00	0,00	0,00	3 559 017,00
5	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání,ACO 16,tl.30mm 2387*7*0,03*2,4=1 203,048 [A]	T	1 203,05	1 740,00	2 093 307,00	0,00	0,00	2 093 307,00
5 Komunikace							5 987 436,00	0,00	0,00	5 987 436,00
Celkem:							6 390 636,00	0,00	0,00	6 390 636,00

Stavba: ČK - Rek.silnice II/163 Slupečná-Lipno nad Vítavou-Loučovice,rek.silnice Rožmberk n.Vit.,silnice II/160
 Objekt: SO 102 - II/163 19,653 - 24,679km d=5026m š=6m
 Rozpočet: SO 102 - II/163 19,653 - 24,679km d=5026m š=6m

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
1 Zemní práce										
2	113725		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM fréz.tl.90mm,průtah Loučovice+čerp.stanice,1200m ² 1200*6*0,09=648,000 [A]	M3	648,00	720,00	466 560,00	0,00	0,00	466 560,00
3	113725a		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM fréz.tl.50mm,lok.poruchy,9000m ² , 9000*0,05=450,000 [A]	M3	450,00	720,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
1 Zemní práce							790 560,00	0,00	0,00	790 560,00
5 Komunikace										
4	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM se zhutněním,š=0,5m	M2	5 026,00	85,00	427 210,00	0,00	0,00	427 210,00
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 5026*6=30 156,000 [A]	M2	30 156,00	13,00	392 028,00	0,00	0,00	392 028,00
6	574142		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM obrus.vrstva,ACO 11 ² 5026*6=30 156,000 [A]	M2	30 156,00	213,00	6 423 228,00	0,00	0,00	6 423 228,00
7	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání,ACO 16,tl.40mm	T	2 894,98	1 740,00	5 037 265,20	0,00	0,00	5 037 265,20
8	577411a		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU lok.opravy,ACO 16,tl.50mm,9000m ² 9000*0,05*2,4=1 080,000 [A]	T	1 080,00	1 740,00	1 879 200,00	0,00	0,00	1 879 200,00
5 Komunikace							14 158 931,20	0,00	0,00	14 158 931,20
Celkem:							14 949 491,20	0,00	0,00	14 949 491,20

Stavba: ČK - Rek.siilnice II/163 Slupečná-Lipno nad Vítavou-Loučovice,rek.siilnice Rožmberk n.Vit.,siilnice II/160
 Objekt: SO 103 - II/160 24,396 - 27,572km d=3176m š=6m
 Rozpočet: SO 103 - II/160 24,396 - 27,572km d=3176m š=6m

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
5 Komunikace										
1	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM se zhutněním, š=0,25m 3176*2*0,25=1 588,000 [A]	M2	1 588,00	56,00	88 928,00	0,00	0,00	88 928,00
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 3176*6=19 056,000 [A]	M2	19 056,00	13,00	247 728,00	0,00	0,00	247 728,00
3	574142		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM obrus.vrstva,ACO 11 3176*6=19 056,000 [A]	M2	19 056,00	213,00	4 058 928,00	0,00	0,00	4 058 928,00
4	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání,ACO 16,tl.40mm 3176*6*0,04*2,4=1 829,376 [A]	T	1 829,38	1 740,00	3 183 121,20	0,00	0,00	3 183 121,20
5 Komunikace							7 578 705,20		0,00	7 578 705,20
Celkem:							7 578 705,20		0,00	7 578 705,20

Stavba: ČK - Rek.silnice II/163 Slupečná-Lipno nad Vltavou-Loučovice,rek.silnice Rožmberk n.Vit.,silnice II/160
 Objekt: SO 104 - doplňující údaje
 Rozpočet: SO 104 - doplňující údaje

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
0 Všeobecné konstrukce a práce										
1			billboard vč.dodání,osazení,odstranění	KUS	1,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
2			pamětní plaketa vč.dodání a osazení	KUS	1,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
4	DIO		dopravně inženýrské opatření	KPL	1,00	145 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
							157 000,00	0,00		157 000,00
5 Komunikace										
3	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU oprava objízdných tras,AC	T	816,00	1 590,00	1 297 440,00	0,00	0,00	1 297 440,00
							1 297 440,00	0,00		1 297 440,00
Celkem:							1 454 440,00	0,00		1 454 440,00
