

Číslo smlouvy vlastníka CB 2013_00063
 Číslo smlouvy stavebníka 010/13/236/03/00

SRM 8000008560



KUJCP0162L4Y

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

č. CB 2013_00063

uzavřená dle ustanovení § 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Telefónica Czech Republic, a.s.

Se sídlem: Praha 4, Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4

IČ: 601 93 336

DIČ: CZ60193336

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
 odd. B, vložka 2322

Zastoupená: Ing.Miroslavem Kotem , Supervizorem, Výstavba přístupové
 sítě Čechy , dle plné moci ze dne 24.4.2012

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Centrála Praha

Číslo účtu: 27-4908440207/0100

(dále jen „Telefónica“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací ::

Jihočeský kraj

Se sídlem : U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76

zastoupený : Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

IČ : 70890650

DIČ : CZ70890650

Bankovní spojení : ČSOB a.s., Č. Budějovice

Číslo účtu : 199783072/0300

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu :

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Společnost Telefónica je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy. Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vyvolává ve smyslu § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena pod označením :

VPI Malenice,kříž III_1442 se žst

Název stavby dle stavebníka :

Křížení komunikace III/1442 s železniční tratí u obce Malenice, objekt SO 401 Přeložka sdělovacího vedení

Čl. 2 Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je realizace překládky SEK v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a úhrada nákladů překládky SEK ve smyslu § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., resp. závazek společnosti Telefónica zajistit realizaci překládky SEK a závazek Stavebníka uhradit její náklady.

Čl. 3 Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech dle projektové dokumentace překládky SEK „VPI Malenice,kříž III_1442 se žst“, která je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou :

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) nebo územního souhlasu,
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (či jiné písemné smlouvy ve smyslu § 104 zákona č. 127/2005 Sb.) s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost Telefónica.

3.5 Společnost Telefónica je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společně s Telefónicou odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4 Náklady na překládku SEK

4.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 16 je povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

4.2 Výše nákladů na Překládku dle bodu 4.2. a 4.4. této smlouvy známých ke dni uzavření této smlouvy činí **146 845,00Kč (bez DPH)**. (slovy:stočtyřicetšesttisícsmsetčtyřicetpět korun českých bez DPH

Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací a nákladů v době výstavby.

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.

4.3 K této ceně bude připočtena DPH v sazbě nebo sazbách podle platných právních předpisů.

4.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti Telefónica vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 4. bod 4.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti Telefónica uhradit. Může se jednat například o :

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o zřízení věcného břemene, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 6 bodu 6.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 6 bodu 6.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem věcných břemen (vázanoucích na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na projekt dopravně inženýrských opatření,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací předmětného díla podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,

- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 5

Platební podmínky

5.1 Platbu za náklady na Překládku dle Čl. 4 bod 4.2 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit ve výši, která je specifikována v článku 4.2 této smlouvy Kč (bez DPH) na základě daňového dokladu (faktury) po realizaci Překládky do 60 dnů ode dne jeho vystavení.

5.2 Daňový doklad dle Čl. 5 bod 5.1 bude vystaven do 30 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. VI bod. 6.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit jej ve lhůtě splatnosti.

5.3 Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňový doklad bude Stavebníkovi zasílán na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

5.4 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti Telefónica uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude daňovým dokladem vystaveným společností Telefónica stanoveno jinak.

Dnem úhrady daňového dokladu (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Stavebníka.

Čl. 6

Práva a povinnosti smluvních stran

6.1 V souvislosti s realizací Překládky se Telefónica zavazuje

- před realizací Překládky :
- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (případně jinou písemnou smlouvu ve smyslu § 104 zákona č. 127/2005 Sb.) s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s § 5 zákona č. 184/2006 Sb.

• po realizaci Překládky :

- Zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.
- Zajistit nezbytné geometrické plány věcných břemen a vložení břemen na příslušné pracoviště Katastrálního úřadu.

6.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

• před realizací Překládky :

- předá Vlastníkovi SEK platné územní rozhodnutí před zahájením vlastní stavby
- Zajistí koordinaci na staveništi

6.3 Telefónica se zavazuje, že realizaci Překládky zajistí v koordinaci se stavebníkem do **30.11.2014**.

a to za předpokladu, že nejpozději 5 měsíců před tímto datem budou zajištěny ve prospěch společnosti Telefónica všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 6. bodu 6.2 této smlouvy, jinak nejpozději do 5 měsíců od jejich zajištění ve prospěch Telefónica.

6.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi Telefónica a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene) popřípadě jiné písemné smlouvy event. zřízení věcného břemene ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových věcných břemen, které společnost Telefónica vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti Telefónica jako náklady vzniklé společnosti Telefónica v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti Telefónica za uhrazení správních poplatků za vklad věcných břemen do Katastru nemovitostí event, případně nákladů vzniklých společnosti Telefónica v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.


6.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti Telefónica při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení věcného břemene potřebnou součinnost.

6.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 6 bodu 6.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti Telefónica.

6.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany ujednaly, že za den doručení oznámení dle předchozí věty považují třetí den ode dne předání oznámení k poštovní přepravě.

Čl. 7 Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Čl. 4 bodů 4.2, 4.4, 5.1 a 5.4 této smlouvy povinen, povinnost



Stavebníka zaplatit společnosti Telefónica smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 , není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3., trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8

Kontaktní osoby

a) Za vlastníka :

ve věcech smluvních: Theodor Valenta funkce: specialista pro výstavbu sítě Čechy
e-mail: theodor.valenta@telefonica.com , tel. 606 694 076

ve věcech technických: Theodor Valenta funkce: specialista pro výstavbu sítě Čechy
e-mail: theodor.valenta@telefonica.com , tel. 606 694 076

b) Za stavebníka :

ve věcech finančních: Ing. Jiří Klása, vedoucí ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje, e-mail: klasa@kraj-jihocesky.cz , tel. +420 386 720 134

ve věcech technických: Jaroslav Mrázek, technik ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje, e-mail: mrazek@kraj-jihocesky.cz , tel. +420 386 720 544

Čl.9

Odstoupení od smlouvy

Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou některé platby dle Čl. 5 bodu 5.1, 5.2, 5.5 dle této smlouvy a toto prodlení trvá déle než 60 dní, je společnost Telefónica oprávněna od této smlouvy odstoupit.

Čl. 10

Rozvazovací podmínka

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu *ustanovení § 36 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.*

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.


11.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž dva obdrží společnost Telefónica a dva Stavebník.

Přílohy :

1. projektová dokumentace Překládky.
2. specifikace nákladů Překládky
3. Územní rozhodnutí MěÚV/0876/2013/Šo (str . 1)
4. Pověření ing. Kota


České Budějovice dne 2.12.2013

České Budějovice dne 20.12.2013


Telefónica Czech Republic, a.s. :
Ing. Miroslav Kot
Supervizor pro výstavbu přístupové sítě

Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336

1025


Jihočeský kraj :
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



Název stavby: VPI Malenice,kříž III_1442 se žst

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Chrt
KPO: Jihočeský
HOST:
VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.185	KMP:	11.700	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.117	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	9 990,10 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	51 163,05 Kč
MONTÁŽ	23 328,33 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	5 294,37 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	10 810,74 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	8 462,22 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	6 092,91 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. TCZ	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	31 703,39 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 146 845,11 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 117 005,51 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 29 839,60 Kč

Seznam položek


Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	9 990,10 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	12.00 m	174,12 Kč
952354 S		Rýha v poli 35/100	185.00 m	44 581,30 Kč
952378 S		Sondáž pro zaměř. stáv. tras neodpov.TSM	8.00 ks	4 626,08 Kč
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	185.00 m	1 781,55 Kč

MONTÁŽ

955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	36.00 m	614,16 Kč
955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	36.00 m	514,08 Kč
952641 S	Měření kapacitních nerovnováh během stavby	55.00 ks	7 823,75 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	246,44 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	53.00 ks	1 506,79 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	53.00 ks	1 002,76 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	132,50 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks	246,44 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	100.00 ks	2 379,00 Kč
955002 S	Montáž nadložního lana ve výkopu	117.00 m	1 113,84 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	2.00 ks	1 889,32 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	36.00 m	580,68 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	153.00 m	3 035,52 Kč
955048 S	Zrušení nadložního lana ve výkopu	113.00 m	748,06 Kč
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	113.00 m	1 494,99 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	53.00 m	781,22 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 513,15 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	53.00 m	658,26 Kč
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 513,15 Kč
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	4 964,60 Kč
955609 S	Převod dig.mapových podk.do standardu TSM-stavba	153.00 m	674,73 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	3 384,96 Kč
955314	Uzavření sml.s odkl.podm.a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	5 077,26 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	6 092,91 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
306074 S		Drát bronzový D 2,80 mm ČSN 423058	26.00 kg	6 407,44 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	153.00 m	618,12 Kč
300121 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	117.00 m	19 540,17 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	8.00 ks	2 345,84 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	20.00 ks	557,20 Kč
407582 S		Souprava čistící 4413S	1.00 ks	400,49 Kč
313816 S		Spojka kabelová SCX 75/15-300(68/15)	2.00 ks	1 084,54 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	7.00 m	261,66 Kč
302441 S		Trubka vrapovaná 125/107 s lankem	5.00 m	353,85 Kč
303483 S		Víčko plastové trubky 125/110 mm	2.00 ks	134,08 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0,00 Kč
403175 S		Pěna montážní Soudal 300ml	1.00 ks	0,00 Kč
316064 S		Přípravek vysoušecí silikagel 10x50g	2.00 sad	0,00 Kč

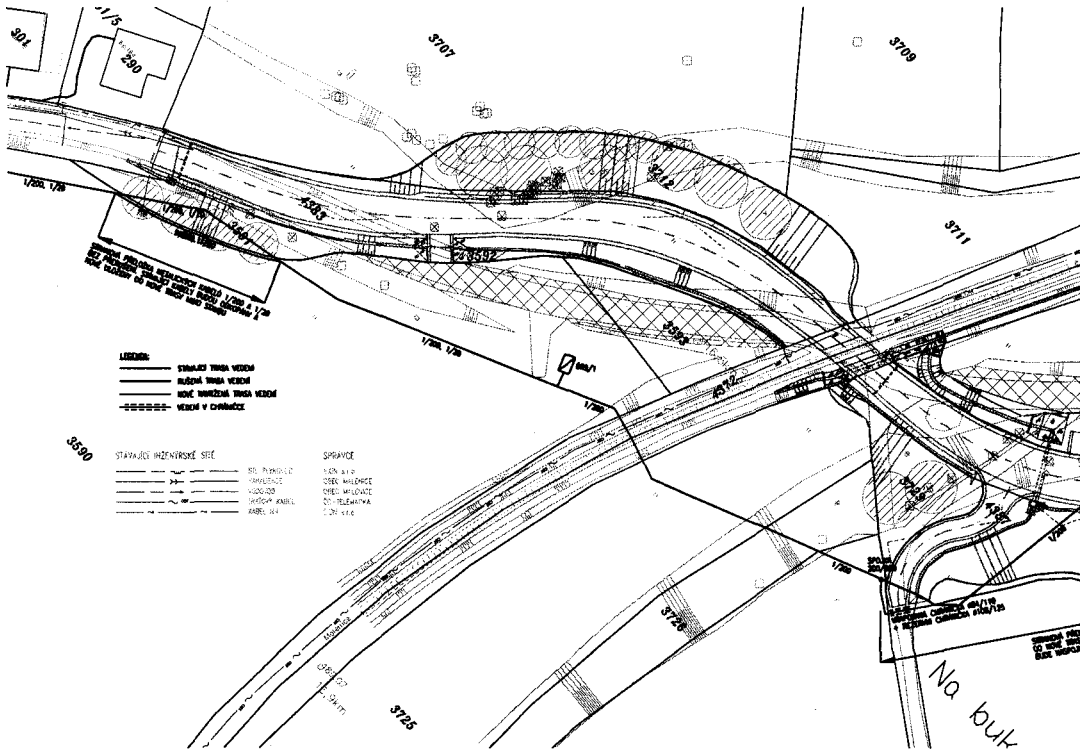

3708
 3707
 3711
 3725
 3726
 Na buk
 1/200

- LEŽENÍ:**
- KANALY ŽELEZNIČNÍ VEDENÍ
 - KANALY ŽELEZNIČNÍ VEDENÍ
 - KANALY ŽELEZNIČNÍ VEDENÍ
 - KANALY ŽELEZNIČNÍ VEDENÍ
 - VEDENÍ V ČIHLÁČCE

3530


STRAŽNÍ ŽELEZNIČNÍ SÍŤ

- SV. PŘEKONČE
- PŘEKONČE
- KANALY
- ŽELEZNIČNÍ KANALY
- KANALY

SÍŤ SÍŤ

- SV. PŘEKONČE
- PŘEKONČE
- KANALY
- ŽELEZNIČNÍ KANALY
- KANALY

Všechny údaje mají být ověřeny v terénu a vzhledem k tomu, že se jedná o plán, není možné v něm udělat žádné změny.

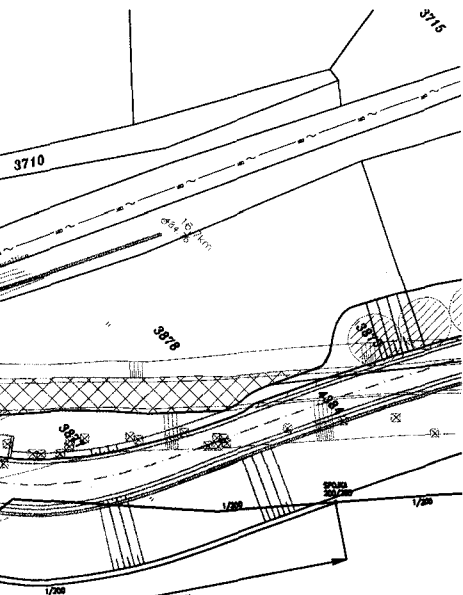

1.20m
 1.50m
 17.00m
 17.75m
 3623

Účel: KRŽENÍ KOMUNIKACE III/1442 S ŽELEZNIČNÍ TRATÍ U OBCE MALENICE	Číslo objemu: 401
--	----------------------


Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2, ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 76	Návrhář: Datum: Podpis:
---	-------------------------------

Autorizace DS/PDPS SIS	Ing. František Stránský – ATELIER S I S U Malého 26, 370 01 České Budějovice	Návrhář: Datum: 08/2013
----------------------------------	---	----------------------------


JOSEF CHRT - INTEGRAL JOSEF CHRT OS KOŘEŠOVÁ 409/12, BUDŮVŮV 725 01 80 IČO 709 85 729	Záp. příjmení: Chrt Josef Vypisovatel: Chrt Josef	JOSEF CHRT - INTEGRAL
---	--	-----------------------

Kraj: JIHOČESKÝ Název: MALENICE Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2, ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 76 Objekt:	SO 401 PŘELOŽKA SĎELOVACÍHO VEDEŇ DS/PDPS	Čís. zakázky: 28077 Čís. akce: 28077-1/1 Datum: 09/2013 Formát: A4/A4 Měřítko: 1:500 Stupeň:
Příloha: SITUACE 1:500	Část: C2 Čís. přílohy: 2.	Soupráva:

SO 401 - Přeložka sdělovacího vedení bez přerušení
VIZ. PŘÍLOHA 2.

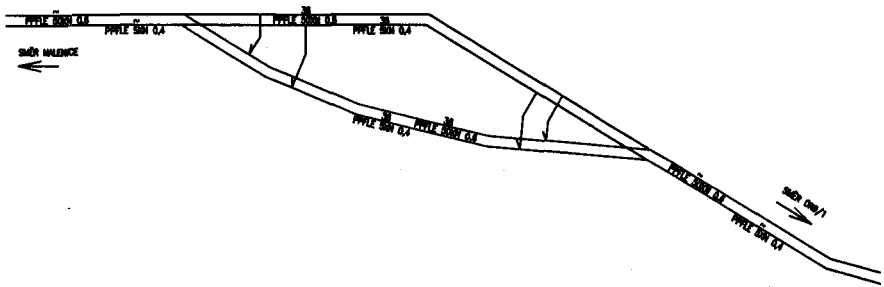


SO 401 - Přeložka sdělovacího vedení vložením nové délky
VIZ. PŘÍLOHA 2.

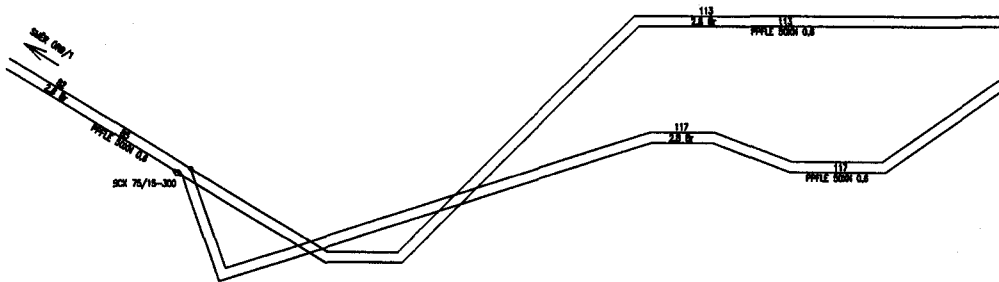

Stavba: KŘÍŽENÍ KOMUNIKACE III/1442 S ŽELEZNIČNÍ TRATÍ U OBCE MALENICE	Číslo objektu: 401
---	-----------------------

Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2, ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 76	Razítko: Ověřil: Datum: Podpis:
---	---



Koordinátor DSP/PDPS: ATELIER SYNOČKA SOUŘADKOVÁNÍ SIS Ing. František Stráský - ATELIER S I S U Malše 20, 370 01 České Budějovice	Razítko: Ověřil: <i>Chrt</i> Datum: 08/2013 Podpis:
--	---

JOSEF CHRT - INTEGREL JOSEF CHRT DIS. KVĚTNOVÁ 400/12, RUDOLFOV Tel 775 971 960 IČO 706 65 729	JOSEF CHRT - INTEGREL	
	Zodp. projektant: Chrt Josef	Chrt Josef

Kraj: JIHOČESKÝ	Čís. zakázky: 28077
Kat. území: MALENICE	Čís. akce: 28077-71
Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ, U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2, ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 76	Datum: 08/2013
Objekt: SO 401 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ	Formát: 2xA4
	Měřítko:
	Stupeň: DSP/PDPS
Příloha: SCHÉMA ZAPOJENÍ	Souprava:
	Část: C2
	Čís. přílohy: 3.

Městský úřad Volyně


odbor stavební úřad a ŽP

Nám. Svobody 41, 387 01 Volyně
tel.: 383 317 222, fax: 383 317 225

Č.j.: MěÚV/1970/2013
Spis. zn.: MěÚV/0876/2013/Šo
Vyřizuje: Jan Šochman

Volyně dne 10.5.2013

Toto rozhodnutí nabylo
právní moci

dne: 08-06-2013
MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor stavební úřad a ŽP
VOLYNĚ
387 01


ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Volyně, odbor stavební úřad a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 4.3.2013 podal investor:

Jihočeský kraj, IČO 70890650, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice 1, v zastoupení příspěvkovou organizací:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, Nemanická č.p. 2133/10, České
Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby

pod ozn.:

"KŘÍŽENÍ KOMUNIKACE III/1442 A ŽELEZNIČNÍ TRATI U OBCE MALENICE"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3591 (ostatní plocha), parc. č. 3592 (ostatní plocha), parc. č. 3712 (ostatní plocha), parc. č. 3729 (ostatní plocha), parc. č. 3824 (ostatní plocha), parc. č. 3830 (trvalý travní porost), parc. č. 3877 (ostatní plocha), parc. č. 3879 (ostatní plocha), parc. č. 3881 (trvalý travní porost), parc. č. 3882 (ostatní plocha), parc. č. 3884 (trvalý travní porost), parc. č. 3885 (ostatní plocha), parc. č. 3888 (ostatní plocha), parc. č. 4372 (ostatní plocha), parc. č. 4383 (ostatní plocha), parc. č. 4384 (ostatní plocha), parc. č. 4387 (ostatní plocha) v katastrálním území Malenice, obec Malenice (parcelní čísla jsou uvedena po provedené digitalizaci KN).

Druh a účel umístěvané stavby:

Stavba obsahuje:

- Účel stavby: Je přestavba stávajícího úrovnového železničního přejezdu železniční trati Strakonice - Vimperk se silnicí III/1442 na bezpečnější bez signalizačního zařízení.
- Popis stavby: Přestavba přejezdu obsahuje přeložku části silnice III/1442 v délce 416,22 m v kategorii S 6,5. Začátek úpravy je na konci zástavby obce Malenice. Konec úpravy je cca 270 m za přejezdem. Příčné uspořádání je dané kategorií silnice a obsahuje: jízdní pruhy 2x 2,75 m a nezpevněná krajnice 2x 0,50 m. Nezpevněná krajnice je navržena z obou stran s rozšířením o

Čj.: 565/2012/LU

V Praze dne 21.04.2012

POVĚŘENÍ

Společnost Telefonica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, PSČ 140 22, IČ 60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, (dále jen "Společnost") tímto pověřuje svého zaměstnance pana

Miroslava Kota

os.č. 3672, bytem Starý Pelhřimov 89, Pelhřimov, PSČ 393 01, r.č. 600222/2072, aby za Společnost

- jednal a činil úkony týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, stavebními úřady, s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné komunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral, pro zajištění oprávnění dle § 104 odst. 1 a 2 zákona č. 127/2005 Sb., smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen, smlouvy o zřízení (nebo zániku) věcných břemen či jiné písemné smlouvy ve smyslu § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo na výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí, ohlášení vzniku, změny či zániku práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí a následně za Společnost v těchto věcech jednal a Společnost zastupoval v řízeních o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí.

Pověřený zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn zavazovat Společnost do částky ve výši 200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Společnost dále pověřuje zaměstnance, aby za Společnost uzavíral,

- smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě, a kdy kupní cena nepřesáhne částku ve výši 200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých),
- smlouvy o dílo, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 16 zák.č.127/2005 (dále jen "Překládka") Společnosti pro stavebníka, kdy cena za dílo nepřesáhne částku ve výši 200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
- jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou.

Pověřený zaměstnanec je oprávněn ve všech shora uvedených věcech činit veškeré úkony, včetně přejímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti.

Telefonica Czech Republic, a.s.
Představenstvo

JUDr. Jakub Chytil
člen představenstva

Ing. Martin Bek
člen představenstva

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE
Běžné číslo ověřovací knihy: O- <i>11219, 23/4/2012</i>
Ověřuji, že podpisy na této listině přede mnou uznaly za vlastní tyto osoby, jejichž totožnost byla zjištěna z úředních průkazů:
JUDr. Jakub CHYTIL, nar. 24.5.1961, Praha 2 - Nové Město, Karlovo nám. 292/15,
Ing. Martin BEK, nar. 18.2.1969, Praha 3 - Žižkov, Pod Parukářkou 2/2762.
V Praze dne 24. dubna 2012

Jitka Hodžiková
notářský tajemník
pověřený JUDr. Marií Malou
notářem se sídlem v Praze

