

EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/085/15**
Číslo smlouvy zhotovitele: **07/2015**



KUJCP018JIBH

SMLOUVA O DÍLO

Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9 B)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje


Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Ing. Zdeňka Szcotková, investiční technik odboru regionálního
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského
úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je
oprávněn(a):

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK

se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,
tel. č. 606 715 690
IČ: 70971641



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>	tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>
1	Okres České Budějovice- Modernizace silnice III/15523 Komařice-Heřmaň	Petr Nachtigal	606 633 836
3	Okres Jindřichův Hradec- Modernizace silnice III/1519 křiž. II/151 – Dolní Němčice	Aleš Kolman	606 683 573

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: D.I.S., spol. s r.o.
se sídlem: Křížíkova 3009/72a, 612 00 Brno
IČ: 46975616
DIČ: CZ46975616
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 7248310207/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Richard Lang, jednatel společnosti tel. č. 545 128 545

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Vašíček tel. č. 548 534 531

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Roman Krčil
tel. č. 545 128 572, 724 059 975

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Jaroslav Šťastný
tel. č. 545 128 589, 602 748 437


Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jakub Slaviček
tel. č. 545 128 535, 602 731 791

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9. 2 2015 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9B)“



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje zavazuje k provedení díla:

„Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9B)“,
a to za níže uvedené okresy (části veřejné zakázky):

Část díla	Název části
1	Okres České Budějovice-Modernizace silnice III/15523 Komařice-Heřmaň
3	Okres Jindřichův Hradec-Modernizace silnice III/1519 křiž. II/151- Dolní Němčice

Pokud se dále v této smlouvě používá pojem „dílo“ rozumí se vždy jeho konkrétní jednotlivá část.


Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.

3. Místo stavby:

Část díla	Název části a místo stavby
1	Okres České Budějovice-Modernizace silnice III/15523 Komařice-Heřmaň
3	Okres Jindřichův Hradec-Modernizace silnice III/1519 křiž. II/151- Dolní Němčice

4. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dilenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady, bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo**, nedohodnou-li se strany jinak.
 - b) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): **do níže uvedeného počtu kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště**.

Část díla	Název části	Počet kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
1	Okres České Budějovice	30
3	Okres Jindřichův Hradec	30

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) samostatným předávacím protokolem.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:

Část díla	Název části	Celkem v Kč bez DPH	DPH	Celkem v Kč vč. DPH
1	Okres České Budějovice	15 524 336,-	3 260 110,-	18 784 446,-
3	Okres Jindřichův Hradec	5 118 441,-	1 074 873,-	6 193 314,-

2. Tato cena (resp. ceny jednotlivých částí díla) je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, že o provedení provizorních položek obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná za objednatele jednat ve věci provádění stavby.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 5.2. Vícepráce budou řešeny takto:
- Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacího řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s., pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
- 5.3. Méněpráce budou oceněny takto:
- Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




5.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Veškeré položky stavebního rozpočtu (včetně tzv. „provizorních položek“), kde jsou jako měrné jednotky uvedeny Kč, KPL nebo SOUBOR, zhotovitel vykalkuluje tak, aby byl schopen po dokončení stavby na požádání objednatele doložit stanovení celkové fakturované částky příslušné položky formou podrobnějšího popisu stavebních prací s rozsahem či výkazů práce (timesheet) a výkazu použitého materiálu (nepostačí pouhé



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



předložení případných subdodavatelských faktur). Pro projektové práce se pro timesheet použijí hodinové sazby dle ceníku UNIKA.

8. Faktura vystavená zhotovitelem bude označena logem poskytovatele dotace, názvem veřejné zakázky a číslem projektu. Číslo projektu (č. proj.: **CZ.1.14/1.1.00/33.03210**) bude uvedeno v textu faktury v části, která odkazuje na název veřejné zakázky.
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti




EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
 9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
 10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyzoomí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
 11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
 12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – - před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
 13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
 14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně foto publicity (billboard + plaketa),




EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
 16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
 17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
 18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
 19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
 20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
 21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
 22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky na předmět plnění podle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat stejné (původní) požadavky na kvalifikovaného člena realizačního týmu.
 23. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.
 24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ


Směr budoucnost - cíl prosperita



2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel, resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou kolaudaci.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti pro zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí či kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců**.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ


Směr budoucnost - cíl prosperita



2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce **24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisu bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - a) Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ


Směr budoucnost - cíl prosperita



5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
7. Stavba je spolufinancována z dotačních fondů EU (ROP NUTS II Jihozápad), proto je zhotovitel povinen respektovat podmínky z této skutečnosti vyplývající.
8. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Sekretariátu regionální rady, MMR, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
9. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je určen v podmínkách o přidělení dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Přesný vzhled takového označení předá po odsouhlasení poskytovatelem dotace objednatel zhotoviteli před vlastní instalací.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho financováním (způsobem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění), na jednom místě do doby uplynutí tří let od uzavření operačního programu – tj. nejméně do konce roku 2025 dle č. 90 Nařízení (ES) 1083/2006. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta stanovená ve výše citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za projekt. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré dokumenty související s realizací díla označit logem poskytovatele dotace – viz publicita projektu.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Smluvní pokuty


1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši (**viz níže v tabulce**) za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši (**viz níže v tabulce**) za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši (**viz níže v tabulce**) za každý kalendářní den prodlení.

Část díla	Název části	Pokuta dle odst. 2 <i>„odstranění vad díla“</i>	Pokuta dle odst. 3 <i>„odstranění vad záruka“</i>	Pokuta dle odst. 4 <i>„vyklizení staveniště“</i>
1	Okres České Budějovice	15.000,-	5.000,-	10.000,-
3	Okres Jindřichův Hradec	15.000,-	5.000,-	10.000,-

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




2. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání nebo zkušebního provozu.
3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
4. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců) dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Tato smlouva byla schválena Radou Jihočeského kraje usnesením č. 235/2015/RK-59 ze dne 26. 3. 2015.


Přílohy:

- Oceněný výkaz výměr a soupis prací a dodávek

V Českých Budějovicích dne 11-05-2015


za objednatele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



V Brno dne 7.5.2015

za zhotovitele:



Ing. Richard Lang
jednatel společnosti

spol. s r.o.
ČK09/72a
312 00 Brno
469 75 616



Rekapitulace P9 B

	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
ČB P9 B	15 524 336	3 260 110	18 784 446 Kč
JH P9 B	5 118 441	1 074 873	6 193 314 Kč
CELKEM	20 642 777	4 334 983	24 977 760 Kč



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Soupi prací

Modernizace silnice III/15523 Komařice - Heřmaň

JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	stančení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č. položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/15523	SO 101	0,000 - 1,870 Komařice - Střížov p.p.č. 2248/3 KU Komařice p.p.č. 953 KU Střížov nad Malší	1,870	5,2 - 5,5	m2	9 926,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 1820*5,3+20*14=9926	12 Kč	119 112,00 Kč
					m2	10 097,5	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 1870*5,25+20*14=10097,5	12 Kč	121 170,00 Kč
					m2	265,0	572 113	infiltrační postřik z emulze do 0,5 kg/m2 50*5,3=265	12 Kč	3 180,00 Kč
					m2	10 097,5	574 132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm 1870*5,25+20*14=10097,5	152 Kč	1 534 820,00 Kč
					m2	8 241,5	574 152	ložná vrstva ACL 22+, tl. 60 mm 1555*5,3=8241,5	221 Kč	1 821 371,50 Kč
					m2	1 684,5	574 142	ložná vrstva ACL 16+, tl. 50 mm 265*5,3+20*14=1684,5	184 Kč	309 948,00 Kč
					m3	397,0	113 727	frézování voz.asf.-odvoz do 16km,tl.40mm (1820*5,3+20*14)*0,04=397,04	530 Kč	210 431,20 Kč
					t	19,1	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu z asf betonu I. tř tl. 30 mm (vyrovnání profilu) 50*5,3*0,03*2,4=19,08	2 073 Kč	39 552,84 Kč
					m2	265,0	567 564	obnova a opr. recykl. s reprof. za strudena cem. a asf. do 300 mm s odvozem 80 mm 50*5,3=265	360 Kč	95 400,00 Kč
					m	26,0	91 911	řezání asf. krytu tl. do 50mm 26	46 Kč	1 196,00 Kč
					m2	1 092,0	56 962	zpev.krajnice z rec.mater.,tl.do 100mm,š=0,3m 1820*0,3*2=1092	61 Kč	66 612,00 Kč
					m	3 740,0	91 511	VDZ barvou hlaké (vodící čára 125 mm s balotinou - zřízením) 1870*2=3740	13,00 Kč	48 620,00 Kč
SO 101 celkem									4 371 413,54 Kč	
III/15523	SO 102	1,870 - 2,530 Střížov p.p.č. 953 KU Střížov nad Malší	0,660	5,7 - 7,5	m2	4 092,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 660*6,2=4092	12 Kč	49 104,00 Kč
					m2	4 092,0	572 113	infiltrační postřik z emulze do 0,5 kg/m2 660*6,2=4092	12 Kč	49 104,00 Kč
					m2	4 092,0	574 141	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm 660*6,2=4092	152 Kč	621 984,00 Kč
					t	245,5	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu z asf betonu I. tř tl. 25 mm (vyrovnání profilu) 660*6,2*0,025*2,4=245,52	2 073 Kč	508 962,96 Kč
					m2	4 092,0	567 554	obnova a opr. recykl. s reprof. za strudena cem. a asf. do 250 mm s odvozem 70 mm 660*6,2=4092	288 Kč	1 178 496,00 Kč
					ks	10,0	899 23	výšková úprava krycích hrnců 10	398 Kč	3 980,00 Kč
					ks	16,0	899 22	výšková úprava mříží 16	398 Kč	6 368,00 Kč
					m	1 320,0	91 511	VDZ barvou hlaké (vodící čára 125 mm s balotinou - zřízením) 660*2=1320	13,00 Kč	17 160,00 Kč
SO 102 celkem									2 435 158,96 Kč	
	SO 103	2,530 - 5,295 Střížov - Borovnice	2,765	5,1 - 5,3	m2	13 641,5	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 1745*5,2+870*5,25=13641,5	12 Kč	163 698,00 Kč
					m2	14 328,3	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2	12 Kč	171 939,00 Kč

III/15523		p.p.č. 953 KU Střížov nad Malší p.p.č.1526 KU Borovnice u Českých Budějovic			m2	825,0	572 113	1745*5,15+870*5,2+150*5,45=14328,25 infiltrační postřik z emulze do 0,5 kg/m2 150*5,5=825	12 Kč	9 900,00 Kč				
					m2	14 328,3	574 132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm 1745*5,15+870*5,2+150*5,45=14328,25	152 Kč	2 177 894,00 Kč				
					m2	9 074,0	574 152	ložná vrstva ACL 22+, tl. 60 mm 1745*5,2=9074	221 Kč	2 005 354,00 Kč				
					m3	545,7	113 727	frézování voz.asf.-odvoz do 16km,tl.40mm (1745*5,2+870*5,25)*0,04=545,66	530 Kč	289 199,80 Kč				
					m2	4 567,5	574 142	ložná vrstva ACL 16+, tl. 50 mm 870*5,25=4567,5	184 Kč	840 420,00 Kč				
					t	59,4	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu z asf betonu I. tř tl. 30 mm (vyrovnání profilu) 150*5,5*0,03*2,4=59,4	2 073 Kč	123 136,20 Kč				
						3,870 - 3,970	0,100	5,5	m2	825,0	567 564	obnova a opr. recykl. s reprof. za studena cem. a asf. do 300 mm s odvozem 80 mm 150*5,5=825	360 Kč	297 000,00 Kč
						5,000 - 5,050	0,050							
									m	5,2	91 911	řezání asf. krytu tl. do 50mm 5,2	46 Kč	239,20 Kč
									m2	1 569,0	56 962	zpev.krajnice z rec.mater.,tl.do 100mm,š=0,3m 2615*0,3*2=1569	61 Kč	95 709,00 Kč
									m	5 530,0	91 511	VDZ barvou hlaké (vodící čára 125 mm s balotinou - zřizování) 2765*2=5530	13,00 Kč	71 890,00 Kč

SO 103 celkem

6 246 379,20 Kč

III/15523	SO 104	5,620 - 6,250 Borovnice - Heřmaň p.p.č.1526 KU Borovnice u Českých Budějovic p.p.č.368/2 KU Nedabyle	0,630	5,3 - 5,6	m2	3 402,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 630*5,4=3402	12 Kč	40 824,00 Kč
					m2	3 370,5	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 630*5,35=3370,5	12 Kč	40 446,00 Kč
					m2	3 370,5	574 132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm 630*5,35=3370,5	152 Kč	512 316,00 Kč
					m2	3 402,0	574 142	ložná vrstva ACL 16+, tl. 50 mm 630*5,4=3402	184 Kč	625 968,00 Kč
					m3	136,1	113 727	frézování voz.asf.-odvoz do 16km,tl.40mm 630*5,4*0,04=136,08	530 Kč	72 122,40 Kč
					m	5,3	91 911	řezání asf. krytu tl. do 50mm 5,3	46 Kč	243,80 Kč
					m2	378,0	56 962	zpev.krajnice z rec.mater.,tl.do 100mm,š=0,3m 630*0,3*2=378	61 Kč	23 058,00 Kč
					m	1 260,0	91 511	VDZ barvou hlaké (vodící čára 125 mm s balotinou - zřizování) 630*2=1260	13,00 Kč	16 380,00 Kč

SO 104 celkem


1 331 358,20 Kč

	SO 105	6,250 - 6,450 Heřmaň p.p.č.1526 KU Borovnice u Českých Budějovic p.p.č.368/2 KU Nedabyle	0,200	5,3 - 8,5	m2	1 297,5	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 75*8,3+125*5,4=1297,5	12 Kč	15 570,00 Kč	
					m2	1 297,5	572 113	infiltrační postřik z emulze do 0,5 kg/m2 75*8,3+125*5,4=1297,5	12 Kč	15 570,00 Kč	
					m2	1 297,5	574 141	obrus.vrstva ACO 16,tl.50mm 75*8,3+125*5,4=1297,5	190 Kč	246 525,00 Kč	
					t	93,4	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu z asf betonu I. tř tl. 30 mm (vyrovnání profilu) (75*8,3+125*5,4)*0,03*2,4=93,42	2 073 Kč	193 659,66 Kč	
					m2	1 297,5	567 564	obnova a opr. recykl. s reprof. za studena cem. a asf. do 300 mm s odvozem 80 mm 75*8,3+125*5,4=1297,5	360 Kč	467 100,00 Kč	
					ks	1,0	899 23	výšková úprava krycích hrnců	1	398 Kč	398,00 Kč
					ks	3,0	899 22	výšková úprava mříží	3	398 Kč	1 194,00 Kč
					ks	1,0	899 21	výšková úprava poklopů	1	398 Kč	398,00 Kč


III/15523				1			
	m3	126,0	122 736	odkopávky a prokopávky obecné tř. I. odvoz do 12 km, hl. 70 cm 120*1,5*0,7=126	290 Kč	36 540,00 Kč	
	m3	72,0	21 452	sanační vrstva z kameniva drceného (0-125) 120*1,5*0,4=72	864 Kč	62 208,00 Kč	
	ks	1,0	89 712	vpust' kanalizační kompletní z beton dílců, hloubka 1,0 m, včetně zemních prací a připojení na kanalizaci do vzdálenosti 1 m. 1	5 426 Kč	5 426,00 Kč	
	m	75,0	91 511	VDZ barvou hladké (vodící čára 250 mm s balotinou - zřízení) 75	13,00 Kč	975,00 Kč	
	ks	2,0	91 511	VDZ barvou hladké V 11a (autobusová zastávka žlutá barva - zřízení) 2	13 Kč	26,00 Kč	
	m	325,0	91 511	VDZ barvou hladké (vodící čára 125 mm s balotinou - zřízení) 200+125=325	13,00 Kč	4 225,00 Kč	
SO 105 celkem						1 049 814,66 Kč	
Celkem za objekty						15 434 124,56 Kč	
	vedlejší a ostatní náklady		1	DIO (viz samostatný výkaz výměr)	67180	67 180,00 Kč	
		ks	1	pamětní deska (plast imitace bronzu)	5 758 Kč	5 758,00 Kč	
		ks	1	billboard	17 273 Kč	17 273,00 Kč	
Vedlejší a ostatní náklady celkem						90 211,00 Kč	
Modernizace silnice III/15523 Komařice - Heřmaň celkem						15 524 335,56 Kč	
						včetně DPH	18 784 446,03 Kč

Poznámka :


- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládáný, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.



DIS, spol. s r.o.
Křižkova 3009/72a
012 03 Brno
Č. 469 75 616



Přehledná situace :

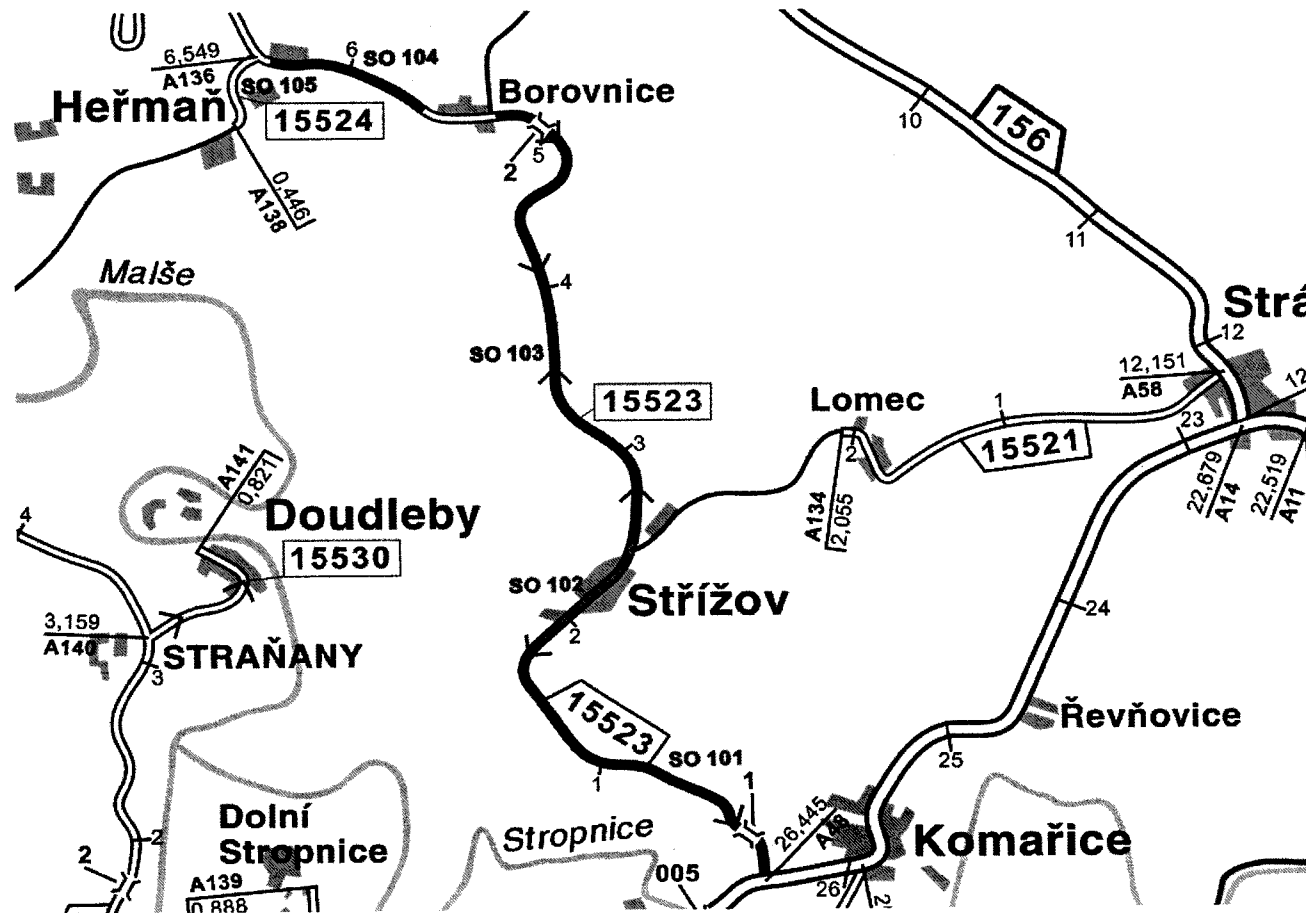

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Soupis prací DIO

Modernizace silnice III/15523 Komařice - Heřmaň

č. silnice	objekt	stančení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č. položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena				
III/15523	SO 106 DIO				Kč	1,0	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objíždky (projednání s úřady) 1	288 Kč	288,00 Kč				
					ks	100,0	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 6(A15)+10(A7a)+6(B1)+14(B20a)+6(B21a)+2(B26)+8(A6b)+6(IS11b)+16(IS11c)+6(E13)+4(IP10a)+8(IP10b)+8(IP10b)=100	23 Kč	2 300,00 Kč				
					ks	2000,0	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 100*20 dní=2000	12 Kč	24 000,00 Kč				
					ks	8,0	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 8 (IP 22)=8	23 Kč	184,00 Kč				
					ks	200,0	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 8*25 dní=200	12 Kč	2 400,00 Kč				
					ks	4,0	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž 4	23 Kč	92,00 Kč				
					ks	60,0	914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel folie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem 4*15 dní=60	23 Kč	1 380,00 Kč				
					ks	2,0	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	115 Kč	230,00 Kč				
					ks	40,0	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 2*20 dní=40	230 Kč	9 200,00 Kč				
					ks	2,0	916 152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž 2	230 Kč	460,00 Kč				
					ks	40,0	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem 2*20 dní=40	403 Kč	16 120,00 Kč				
					ks	40,0	916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a demontáž 40	23 Kč	920,00 Kč				
					ks	600,0	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem 40*15=600	6 Kč	3 600,00 Kč				
					ks	2,0	916 312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž 2	23 Kč	46,00 Kč				
					ks	30,0	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem 2*15 dní=30	8 Kč	240,00 Kč				
					ks	40,0	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž 40	23 Kč	920,00 Kč				
					ks	600,0	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem 40*15 dní=600	8 Kč	4 800,00 Kč				
					SO 106celkem									67 180,00 Kč

SPRÁVA SILNIC P. O.
K. O. 3609/72a
Březnice
3609 75 616

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Soupis prací

Modernizace silnice III/1519, křiž. II/151- Dolní Němčice

JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	stanoviště a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/1519	SO 101	0,000-2,100 křiž. II/151-Dolní Němčice	2,100	5,9	m3	371,7	113 725	frézování voz.asf.30 mm sronání-odvoz do 8km 2100 * 5,9 * 0,03 = 371,7	530 Kč	197 001,00 Kč
					m3	30,0	113 725	fréz. voz.asf.60 mm,lok.výspr -odvoz do 8 km 500 * 1 * 0,06 = 30,0	530 Kč	15 900,00 Kč
					m	500,0		sanace příčných trhlin dle TP115,TP 87 odhad po prohlídce vozovky	104 Kč	52 000,00 Kč
					t	72,0	577 411	vrstvy pro obn. a opr. lok.výspr.z asf.betonu 500 * 1 * 0,06 * 2,40 = 72,0	2 073 Kč	149 256,00 Kč
					m2	12 390,0	572 213	spoj postřik z emuze do 0,5 kg/m2 2100 * 5,9 = 12390,0	12 Kč	148 680,00 Kč
					m2	12 390,0	574 132	ložná vrstva -ACO 11,tl.35mm, vyrovnaní 2100 * 5,9 = 12390,0	147 Kč	1 821 330,00 Kč
					m2	12 390,0	572 213	spoj postřik z emuze do 0,5 kg/m2 2100 * 5,9 = 12390,0	12 Kč	148 680,00 Kč
					m2	12 390,0	574152	obrusná vrstva ACO 16+ tl. 50 mm 2100 * 5,9 = 12390,0	190 Kč	2 354 100,00 Kč
					m2	1 260,0	56961	dopl.krajnice z rec.mat tl.do 50 mm 2100 * 0,6 = 1260,0	92 Kč	115 920,00 Kč
					ks	100,0	912 28	směrové sloupky z plast. hmot vč.odr.pás. 100	176 Kč	17 600,00 Kč
					m	4 200,0	91 511	vodící čára 125 mm s balotinou,zřízení 2100 * 2 = 4200,0	13,00 Kč	54 600,00 Kč
SO 101 celkem									5 075 067,00 Kč	
Stavební objekty celkem									5 075 067,00 Kč	
vedlejší a ostatní náklady							DIO (viz samostatný soupis prací)	20343	20 343,00 Kč	
					ks	1	pamětní deska (plast imitace bronzu)	5 758 Kč	5 758,00 Kč	
					ks	1	billboard	17 273 Kč	17 273,00 Kč	
Vedlejší a ostatní náklady celkem									43 374,00 Kč	

Modernizace silnice III/1519, křiž. II/151- Dolní Němčice celkem									5 118 441,00 Kč	
									včetně DPH	6 193 313,61 Kč


Poznámka :
1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

JKSO, spol. s r.o.
Číslo účtu: 2609/72a
602 00 Brno
Č. 469 75 616

dis

6

Přehledná situace :

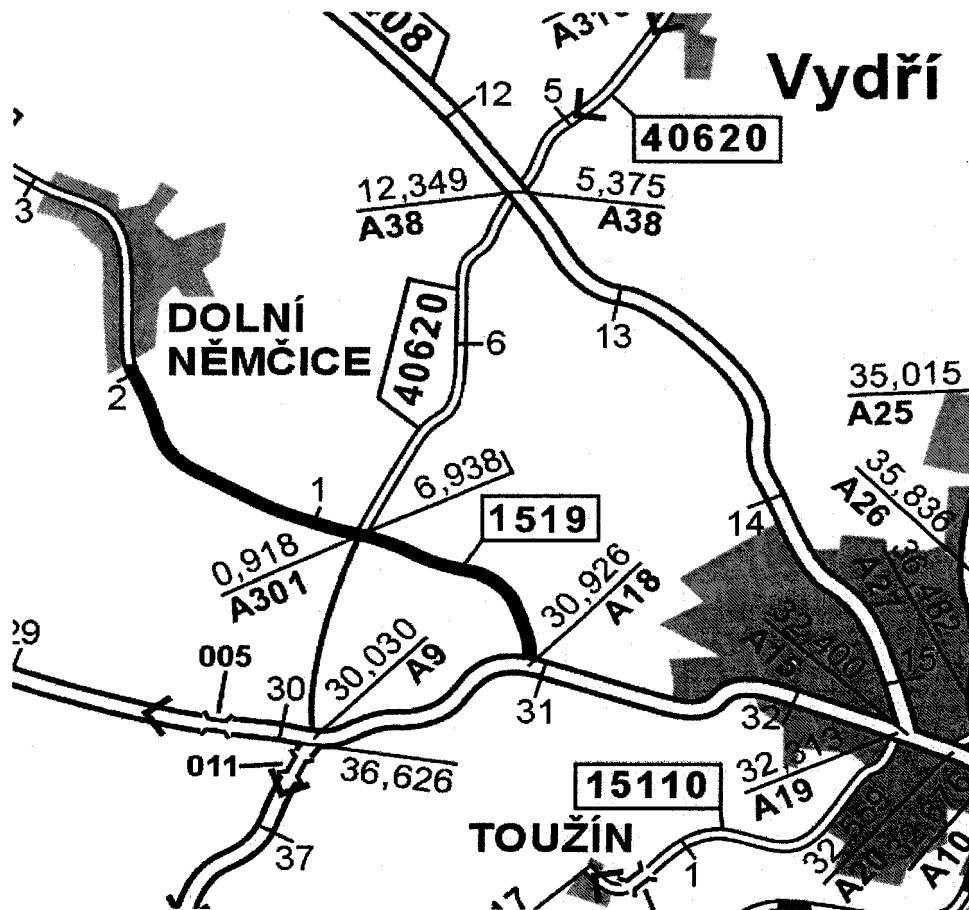

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Soupis prací DIO

Modernizace silnice III/1519, křiž. II/151- Dolní Němčice

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č. položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena			
III/1519	SO 102 DIO				Kč	1,0	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objíždky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	288 Kč	288,00 Kč			
									1				
					ks	10,0	914...	přeplepení DZ vč. odlepení	23 Kč	230,00 Kč			
									10				
					ks	40,0	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	23 Kč	920,00 Kč			
									6(A15)+6(A7a)+8(B20a)+6(B21a)+4(B26)+2(IS 11b)+8(IS 11c)=40				
					ks	460,0	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	12 Kč	5 520,00 Kč			
									46 * 10 dní = 460				
					ks	4,0	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	23 Kč	92,00 Kč			
									4				
					ks	40,0	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	12 Kč	480,00 Kč			
									4 * 10 dní = 40				
					ks	2,0	916 122	doprov světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	115 Kč	230,00 Kč			
									2				
					ks	20,0	916122R	doprov světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	230 Kč	4 600,00 Kč			
									2 * 10 dní = 20				
					ks	1,0	916 152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	230 Kč	230,00 Kč			
									1				
ks	10,0	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem	403 Kč	4 030,00 Kč								
				1 * 10 dní = 10									
ks	25,0	916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	23 Kč	575,00 Kč								
				25									
ks	250,0	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem	6 Kč	1 500,00 Kč								
				25 * 10 dní = 250									
ks	8,0	916 312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	23 Kč	184,00 Kč								
				8									
ks	80,0	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem	8 Kč	640,00 Kč								
				8 * 10 dní = 80									
ks	8,0	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	23 Kč	184,00 Kč								
				8									
ks	80,0	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	8 Kč	640,00 Kč								
				8 * 10 dní = 80									

SO 102 celkem

20 343,00 Kč

Křižovka 3009/12
612 00 Bmo
IČ: 469 75 616
