

KUJCP00SWFP I

EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.

Č. smlouvy SDL/OREG/130/12

číslo smlouvy zhotovitele 2080038ZSL

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650 „JSME PLÁTCI DPH“

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněna:

obchodní firma: Správa a údržba silnic JČk

zastoupená: Miloslavem Ouředníkem tel. č.: 387 021 010

osoba vykonávající TD na stavbě: Jiří Marek, tel. č.: 606 612 231

Vladimír Krafka, tel. č.: 606 683 572

se sídlem Nemanická 10, 370 10 České Budějovice

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

Alena Frdlíková - investiční technik OREG KÚ

tel.č. 386720217

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: obchodní firma EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1

kontaktní adresa: Planá 72, 370 01 Č. Budějovice

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

č. účtu: 1141380144/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, ve vložce 1561

certifikace ISO: 9001, 14001, 18001

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Novák

tel.č.. 387 203 417

Odpovědný geodet: bude oznámen po předání staveniště

Vedením stavby je pověřen: František Venus

tel.č. 731 601 643

P.

Zástupce stavbyvedoucího: Zdeněk Slabý tel.č. 731 601 651
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku.
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman tel.č. 731 601 635

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace, zavazuje k provedení díla:

- A. Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Hluboká – Schaditz**
- B. Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Nová Bystřice – Grametten**
- C. Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Nová Bystřice – Grametten, II. etapa**

Projekt bude financován v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 – 2013.

3. Místo stavby: Jindřichohradecko
4. Druh výstavby: kompletní obnova povrchu vozovky
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení, nebo při kolaudaci stavby, nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.
7. Součástí díla je též zhotovení zejména zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
8. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí třetích osob, písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla jakoby je prováděl on sám. Pokládku živичných směsí však zhotovitel provede pouze vlastními kapacitami. Za vlastní kapacity se považují zaměstnanci v pracovním poměru k osobě zhotovitele nebo k osobě zhotovitelem ovládané nebo k osobě zhotovitele ovládající. Pokud bude tato podmínka porušena je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z ceny díla. Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek, a to pod pokutou ve výši 25% z ceny veřejné zakázky.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště**
Výstavba bude dokončena: do **45** kalendářních dnů ode dne předání staveniště
Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatnými předávacími protokoly pro jednotlivé akce vymezené samostatnými výkazy výměr.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového výkazu výměr pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy:

celkem bez DPH	30 821 520,80 Kč
<u>DPH 20%</u>	<u>6 164 304,16 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	36 985 824,96 Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná..
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
 - d) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
 - e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané

ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.

6.2. Vícepráce budou oceněny takto

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

6.3. Méněpráce budou oceněny takto

a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatel.

V. Platební podmínky

1. **Fakturace** bude prováděna odděleně samostatnými fakturami – daňovými doklady **pro jednotlivé akce vymezené samostatnými výkazy výměr.**
2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce technickým dozorem. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
3. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu – Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku OREG KÚ nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
4. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 dnů** od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.
5. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.). Zhotovitel je povinen odevzdávat vážní lístky obalované směsí průběžně (po jednotlivých dodávkách)

technickému dozoru nebo v jeho nepřítomnosti pověřenému pracovníkovi příslušného závodu SÚS.

6. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami – viz bod 1 (po odsouhlasení všech položek TDI) do výše 90 % fakturované částky za příslušný měsíc. Tímto způsobem bude zapláceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny pro každou jednotlivou akci uvedenou ve čl. II. odst. 2. této smlouvy. Zbývajících 10% bude uvolněno následujícím způsobem: 5% bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončené akce (dle čl. II. 2 a v souladu s odst.1), zbývajících 5% bude uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele, po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v příslušném samostatném zápise o předání a převzetí stavby pro každou jednotlivou akci (dle čl. II. 2). Ustanovení čl. V.1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
7. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH ve smyslu zákona o DPH, §92e – režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví. Přijaté zdanitelné plnění nepoužije pro svou ekonomickou činnost.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 550 a násl. obchodního zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Zhotovitel prokáže objednateli, a to nejpozději do uzavření této smlouvy o dílo, odběrné místo živičných směsí vlastním živnostenským oprávněním popřípadě jiným zástupným dokladem a v případě nákupu živičné směsi od jiného subjektu předloží smlouvu, dohodu či závazný příslib (popřípadě jiný doklad, který objednatel uzná) na jejich dodávku z obalovny, a to v obou případech v dopravní vzdálenosti v souladu s příslušnými TP a ČSN a v množství nutném pro řádné provedení příslušných prací. Požadované doklady budou nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy

a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Investor a technický dozor investora (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Zhotovitel je povinen po odfrézování obrusné vrstvy příslušného úseku přizvat, nejméně s dvoudenním předstihem technický dozor a společně určit skutečný rozsah poškození a následně stanovit příslušný způsob opravy případných trhlin a její skutečný (a nutný) rozsah.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věci provádění stavby dle této smlouvy.
14. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

VII. Předání staveniště

1. Realizace díla se předpokládá v období 06-07/2012. Staveniště bude předáno nejpozději **do 14ti dnů** od podpis smlouvy o dílo, pokud se obě strany nedohodnou jinak – viz. výše uvedené.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1.
3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivého uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn. **36 měsíců na obrusné vrstvy a 60 měsíců na ostatní práce**.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (viz čl. III. 2) bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto

smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezavazuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexními zápisy o předání a převzetí.

4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
 - Nabídka zhotovitele
 - Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací MDS OPK čj. 475/02-120 RS/1 ze dne 22.10. 2002
 - Zvláštní technické kvalitativní podmínky uvedené stavby (ZTKP), pokud jsou součástí projektu pro zadání stavby a doplňky k těmto podmínkám
 - Technické kvalitativní podmínky (TKP) vydané MDS ČR, platné k datu Oznámení zadávacího řízení
 - Technické podmínky (TP) MD ČR, resp. MDS ČR
 - Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK
 - Zadávací dokumentace
 - Zápis o předání staveniště
 - Potvrzení o odběrném místě živichých směsí a v případě nákupu živiché směsi od jiného subjektu smlouva, dohoda či závazný příslib na jejich dodávku z obalovny v dopravní vzdálenosti v souladu s příslušnými TP a ČSN a v množství nutném pro řádné provedení prací dle této smlouvy.
2. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů následující:
 - smlouva o dílo
 - dokumenty uvedené v pořadí dle odst. 1

3. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele pro jednotlivé akce vymezené samostatnými výkazy výměr a uvedené ve čl. II. odst. 2 této smlouvy, předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
4. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
5. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
6. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
7. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý kalendářní den, který uplyne mezi lhůtou dokončení a dnem předání díla objednateli smluvní pokutu ve výši 31 000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10 000,-- Kč za každý den prodlení.


3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000,- za vadu a den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení a vyčištění staveniště, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0, 05 % z ceny díla.
6. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
7. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.


XIII. Všeobecná ustanovení


1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu v souladu s ustanovením § 640 z.č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatel zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne 20.6.2012
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 15-06-2012
za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje




Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.

41

PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s. (zmocnitel) se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 452 74 924 uděluje plnou moc pro svého zaměstnance (zmocněnce),

pana Ing. Zdeňka Nováka

rodné číslo 6706100907

Touto plnou mocí zmocnitel zmocňuje jmenovaného zaměstnance

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení zastupoval firmu EUROVIA CS, a.s. při všech jednáních a právních úkonech, které souvisí se získáváním a realizací zakázek, a to včetně zakázek veřejných. Zmocněnec je oprávněn zejména: jednat s dodavateli, zhotoviteli, zadavateli, objednateli; podepisovat nabídky a žádosti o účast; podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů; zastupovat zmocnitele ve správních a soudních řízeních, které souvisí se získáváním a realizací zakázek. Dále je zmocněnec též oprávněn, mimo již výše uvedené, uzavírat k tomu potřebné smlouvy, např. kupní, o dílo, a také dohody o jejich změnách ve formě písemných dodatků takových smluv.

Jednání zmocněnce na základě této plné moci přímo zavazuje firmu EUROVIA CS, a.s.

Tato plná moc je omezena na závazky zmocnitele, které jsou ke zhotovení díla potřebné a nezbytné, a to na závazky, které nepřesahují hodnotu 100 mil. Kč (bez DPH). Předchozí věta tohoto odstavce platí pro veřejné zakázky, které zadávají veřejní, dotovaní nebo sektoroví zadavatelé, a to v souladu s jejich definicí v zákoně o veřejných zakázkách.

Pro ostatní zakázky s jinými subjekty, než které jsou uvedeny v předchozím odstavci, je tato plná moc omezena na závazky zmocnitele, které jsou ke zhotovení díla potřebné a nezbytné, a to pro závazky, které nepřesahují hodnotu 50 mil. Kč (bez DPH).


Tato plná moc je účinná do 31. 12. 2012.

V Praze

EUROVIA CS, a.s.



Ing. Martin Borovka
předseda představenstva



Ing. Zdeněk Synáček
člen představenstva



EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 1



Ověření - legalizace

Běžné číslo položky ověřovací knihy: O 1943/2011 a 2034/2011


Ověřuji, že dnes přede mnou tuto listinu vlastnoručně podepsali -----


p. Martin BOROVIKA, nar. 24.2.1974, -----
bytem Panenské Břežany, K Dálnici 183, okr. Praha - východ, -----

p. Ing. Zdeněk SYNÁČEK, nar. 29.11.1959, -----
bytem Praha 10 - Hostivař, Řepčická 1261/24, -----

jejichž totožnost byla prokázána úředními průkazy. -----

V Praze dne 16-12-2011



Petra Polánová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Lucií Foukalovou
notářkou se sídlem v Praze



OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z listů
slovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

V Karlových Varech, dne - 2 - 01 - 2012


Daniela Jordánová
notářská tajemnice
z pověření notářky
Mgr. Adély Gabányiové




OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Litvinovice

Uč. č. vidimace
tento opis byl:
rozsahující stran
souhlasí slovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
opisem:
.....
opisem nebo kopií pořízenou ze spisu
.....
rozsahující stran

v Litvinovicích, dne 17-05-2012
MAJEROVÁ JANA

Jména a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla
(nebo otisk jmenovky)
Nahodit se štamptem







Rekapitulace stavby:

Zlepšení přístupových komunikací v rámci Evropské územní spolupráce ČR - Rakousko 2007 - 2013

	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
Zlepšení přístupové komunikace k hr.přechodu Hluboká - Schaditz	19 302 375,20	3 860 475,04	23 162 850,24
Zlepšení přístupové komunikace k hr.přechodu Nová Bystřice - Grametten	6 150 188,80	1 230 037,76	7 380 226,56
Zlepšení přístupové komunikace k hr.přechodu Nová Bystřice - Grametten, II. Etapa	5 368 956,80	1 073 791,36	6 442 748,16
Cena celkem	30 821 520,80	6 164 304,16	36 985 824,96


Ing. Zdeněk NOVÁK
ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.




EUROVIA CS, a.s.
Národních 10
113 19 Praha 1

Handwritten mark

Poznámka:

- * Uvedený rozsah prací je předpokládán pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu)
- * Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací a budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami)
- * Plošné výměry jsou vč. rozjezdů sil.III.tř.(příp.MK) a závlivů autob.zastávek
- * Součástí dodání obrusné vrstvy je včetně očištění povrchu, ošetření spár a napojení
- * Úprava rozjezdu bude provedena včetně zafrézování v místě napojení na stávající povrch.
- * Kontaktní osoba p.L.Vojta - tel.602 156 957
- * Realizace bude prováděna pokud možno za úplné uzavírky - způsob projedná zhotovitel
- * Vytyčení inženýrských sítí zajistí dodavatel
- * Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JČK, závod J.Hradec
- * U všech položek bude uváděna jednotková cena
- * S ohledem na nutnost vyloučení veškeré dopravy z důvodu pokládky obrusné vrstvy v celé šíři najednou, je nutné zajistit náhradní autobusovou dopravu

Prehledná situace :

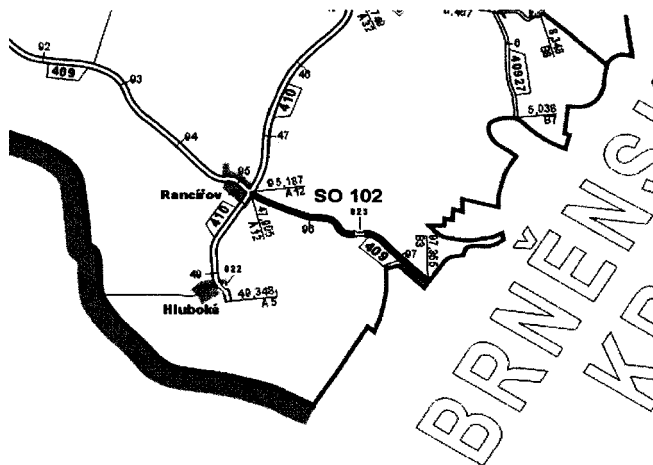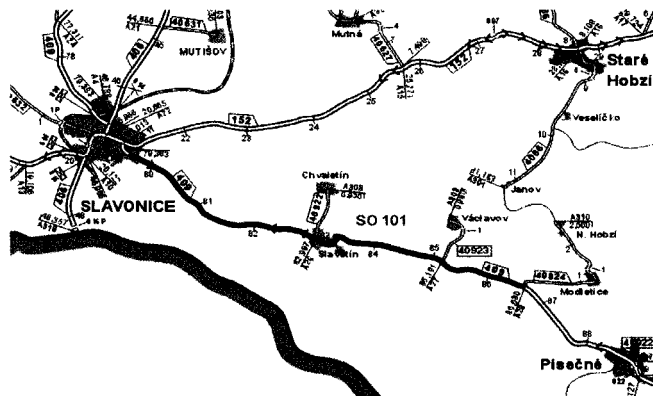

Rekapitulace stavby: JH - Zlepšení přístupové komunikace k hr.přechodu Hluboká - Schaditz

SO c. 101	13 668 210,00 Kc
SO c. 102	4 083 970,00 Kc
SO c. 103	1 550 195,20 Kc
Celkem bez DPH	19 302 375,20 Kc
DPH 20 %	3 860 475,04 Kc
Celkem s DPH	23 162 850,24 Kc

Stavba: JH - Zlepšení přístupové komunikace k hr.přechodu Hluboká - Schaditz
 Objekt: SO 101 - II/409 79,500 - 86,630 km, d= 7130 m, š= 5,6 m,
 Rozpocet: SO 101 - II/409 79,500 - 86,630 km, d= 7130 m, š= 5,6 m,

5 Komunikace									
1	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM se zhuťněním,š=0,5m	M2	7 130,00	55,00	392 150,00	0,00	0,00	392 150,00
2	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 7130*5,6=39 928,000 [A]	M2	39 928,00	13,50	539 028,00	0,00	0,00	539 028,00
4	574122	ASFALTOVÝ BETON TR II TL 30MM podkl.vrstva,ACO 11,tl.30mm□ 7130*5,6=39 928,000 [A]	M2	39 928,00	138,00	5 510 064,00	0,00	0,00	5 510 064,00
3	574132	ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM obrus.vrstva,ACO 11□ 7130*5,6=39 928,000 [A]	M2	39 928,00	181,00	7 226 968,00	0,00	0,00	7 226 968,00
5 Komunikace						13 668 210,00	0,00	0,00	13 668 210,00

ASPE 8

Stavba: JH - Zlepšení přístupové komunikace k hr.přechodu Hluboká - Schaditz
 Objekt: SO 102 - II/409 95,187 - 97,355 km, d= 2168 m, š= 5,5 m,
 Rozpocet: SO 102 - II/409 95,187 - 97,355 km, d= 2168 m, š= 5,5 m,

Objekt	Průběh	Typ	Průřez	M2	Množství	Podklad	Průběh	Průřez	M2	Množství	Podklad	Průběh	Průřez	M2	Množství	Podklad
5 Komunikace																
1	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM se zhutněním,š=0,5m	M2	2 168,00	55,00	119 240,00	0,00	0,00	119 240,00						
2	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 2168*5,5=11 924,000 [A]	M2	11 924,00	13,50	160 974,00	0,00	0,00	160 974,00						
4	574122		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 30MM podkl.vrstva,ACO 11□ 2168*5,5=11 924,000 [A]	M2	11 924,00	138,00	1 645 512,00	0,00	0,00	1 645 512,00						
3	574132		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM obrus.vrstva,ACO 11□ 2168*5,5=11 924,000 [A]	M2	11 924,00	181,00	2 158 244,00	0,00	0,00	2 158 244,00						
5 Komunikace										4 083 970,00	0,00	0,00	4 083 970,00			


Stavba: JH - Zlepšení přístupové komunikace k hr.přechodu Hluboká - Schaditz
 Objekt: SO 103 - doplňující údaje
 Rozpocet: SO 103 - doplňující údaje

Objekt	Práce	Typ	MJ	Množství	Jednotka	Objem	Objem	Objem	Objem
0 Všeobecné konstrukce a práce									
4	DIO	dopravně inženýrské opatření	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1	VDZ	vodící čára, š=125mm, s balotinou - zřízení	BM	18 596,00	31,20	580 195,20	0,00	0,00	580 195,20
2	publicita	billboard včetně dodání, osazení, odstranění	ks	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2	publicita	pamětní deska včetně dodání a osazení	ks	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						635 195,20	0,00	0,00	605 195,20
5 Komunikace									
3	577411	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU oprava objízdných tras, AC	T	525,00	1 800,00	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
5 Komunikace						945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
						1 580 195,20	0,00	0,00	1 540 195,20

Poznámka:

- * Uvedený rozsah prací je předpokládán pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu)
- * Všecké práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací a budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami)
- * Plošné výměry jsou vč. rozjezdů sil.III.ř. (příp.MK) a zářívů autob.zastávek
- * Součástí dodání obrusné vrstvy je včetně očištění povrchu, ošetření spár a napojení
- * Úprava rozjezdů bude provedena včetně zafrézování v místě napojení na stávající povrch.
- * Kontaktní osoba p.L.Vojta - tel.602 156 957
- * Realizace bude prováděna pokud možno za úplné uzavírky - způsob projedná zhotovitel
- * Vytyčení inženýrských sítí zajistí dodavatel
- * Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JČK, závod J.Hradec
- * U všech položek bude uváděna jednotková cena

Prehledná situace :

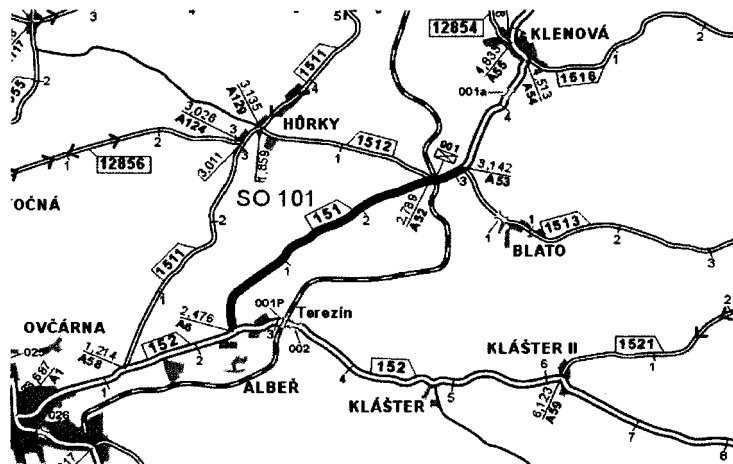

P.

Rekapitulace stavby: JH - Zlepšení přístupové komunikace k hr.přechodu Nová Bystřice - Grametten

SO c. 101	5 605 328,00 Kc
SO c. 102	544 860,80 Kc
Celkem bez DPH	6 150 188,80 Kc
DPH 20 %	1 230 037,76 Kc
Celkem s DPH	7 380 226,56 Kc

Stavba: JH - Zlepšení přístupové komunikace k hr.přechodu Nová Bystřice - Grametten
 Objekt: SO 101 - II/151 0,000 - 3,142 km, d= 3142 m, š= 5,2 m,
 Rozpocet: SO 101 - II/151 0,000 - 3,142 km, d= 3142 m, š= 5,2 m,

5 Komunikace									
2	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM se zhuťněním, š=0,5m	M2	3 142,00	55,00	172 810,00	0,00	0,00	172 810,00
3	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 3142*5,2=16 338,400 [A]	M2	16 338,40	13,50	220 568,40	0,00	0,00	220 568,40
5	574122	ASFALTOVÝ BETON TR II TL 30MM podkl.vrstva, ACO 11, tl.30mm□ 3142*5,2=16 338,400 [A]	M2	16 338,40	138,00	2 254 699,20	0,00	0,00	2 254 699,20
4	574132	ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM obrus.vrstva, ACO 11, tl.40mm□ 3142*5,2=16 338,400 [A]	M2	16 338,40	181,00	2 957 250,40	0,00	0,00	2 957 250,40
5 Komunikace						5 605 328,00	0,00	0,00	5 605 328,00


Stavba: JH - Zlepšení přístupové komunikace k hr.přechodu Nová Bystřice - Grametten
 Objekt: SO 102 - doplňující údaje
 Rozpocet: SO 102 - doplňující údaje

0 Všeobecné konstrukce a práce									
1	publicita	BILLBOARD VCETNE DODÁNÍ, OSAZENÍ, ODSTRANENÍ	KS	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1	publicita	PAMETNÍ PLAKETA VCETNE DODÁNÍ A OSAZENÍ	KS	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3	DIO	dopravne inženýrské opatření	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4	VDZ	vodící čára, š=125mm, s balotinou - zřízení	BM	6 284,00	31,20	196 060,80	0,00	0,00	196 060,80
0 Všeobecné konstrukce a práce						246 060,80	0,00	0,00	246 060,80
5 Komunikace									
2	577411	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU oprava objízdných tras,AC	T	166,00	1 800,00	298 800,00	0,00	0,00	298 800,00
5 Komunikace						298 800,00	0,00	0,00	298 800,00

Poznámka:

- * Uvedený rozsah prací je předpokládán pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu)
- * Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací a budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami)
- * Plošné výměry jsou vč. rozjezdů sil.III.ř. (příp.MK) a zářívů autob.zastávek
- * Součástí dodání ohrusné vrstvy je včetně očištění povrchu, ošetření spár a napojení
- * Úprava rozjezdu bude provedena včetně zafrézování v místě napojení na stávající povrch.
- * Kontaktní osoba p.L.Vojta - tel.602 156 957
- * Realizace bude prováděna pokud možno za úplné uzavírky - způsob projedná zhotovitel
- * Vytyčení inženýrských sítí zajistí dodavatel
- * Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JČK, závod J.Hradec
- * U všech položek bude uváděna jednotková cena

Prehledná situace :

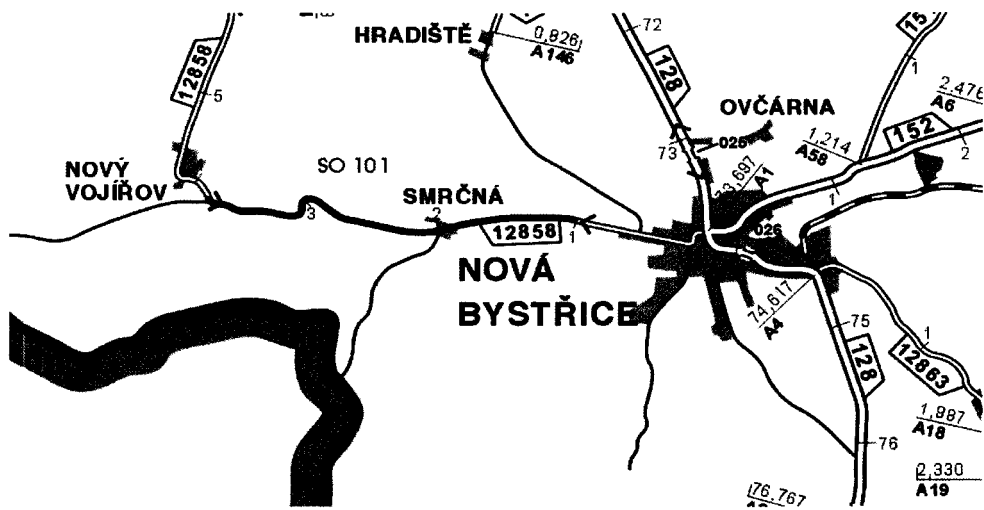

Rekapitulace stavby: JH - Zlepšení přístupové komunikace k hr.přechodu Nová Bystřice - Grametten, II. etapa

SO c. 101	4 873 752,00 Kc
SO c. 102	495 204,80 Kc
Celkem bez DPH	5 368 956,80 Kc
DPH 20 %	1 073 791,36 Kc
Celkem s DPH	6 442 748,16 Kc



Stavba: JH - Zlepšení přístupové komunikace k hr.přechodu Nová Bystřice - Grametten, II. etapa
 Objekt: SO 101 - III/12858 1,000 - 3,952km, d=2952m š= 4,8m
 Rozpocet: SO 101 - III/12858 1,000 - 3,952km, d=2952m š= 4,8m

5 Komunikace									
1	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM se zhuštění,š=0,5m	M2	2 952,00	55,00	162 360,00	0,00	0,00	162 360,00
2	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 2952*4,8=14 169,600 [A]	M2	14 169,60	13,50	191 289,60	0,00	0,00	191 289,60
3	574122	ASFALTOVÝ BETON TR II TL 30MM podkl.vrstva,ACO11,tl.30mm□ 2952*4,8=14 169,600 [A]	M2	14 169,60	138,00	1 955 404,80	0,00	0,00	1 955 404,80
4	574132	ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM obrus.vrstva,ACO11,tl.40mm□ 2952*4,8=14 169,600 [A]	M2	14 169,60	181,00	2 564 697,60	0,00	0,00	2 564 697,60
5 Komunikace						4 873 752,00	0,00	0,00	4 873 752,00

Stavba: JH - Zlepšení přístupové komunikace k hr.přechodu Nová Bystřice - Grametten, II. etapa
 Objekt: SO 102 - doplňující údaje
 Rozpocet: SO 102 - doplňující údaje

0 Všeobecné konstrukce a práce									
4	Publicita	BILLBOARD VCETNE DODÁNÍ, OSAZENÍ, ODSTRANENÍ	KS	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
5	Publicita	PAMETNÍ PLAKETA VCETNE DODÁNÍ A OSAZENÍ	KS	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2	DIO	dopravné inženýrské opatření	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3	VDZ	vodící čára, š=125mm, s balotinou-zřízení	BM	5 904,00	31,20	184 204,80	0,00	0,00	184 204,80
0 Všeobecné konstrukce a práce						234 204,80	0,00	0,00	234 204,80
5 Komunikace									
1	577411	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU oprava objízdnych tras,AC	T	145,00	1 800,00	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00
5 Komunikace						261 000,00	0,00	0,00	261 000,00
