

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/136/15

Číslo smlouvy zhotovitele: .....



KUJCP018JI5B

## SMLOUVA O DÍLO

Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9 B)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I. Strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201


Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:  
**Ing. Zdeňka Szczotková**, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

### SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK

se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,  
tel. č. 606 715 690  
IČ: 70971641

*Handwritten mark*



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Směr budoucnost - cíl prosperita

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>	tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>
4	Okres Písek –Modernizace silnice III/1387 Horní Novosedly	Ing. Pešta Rudolf	721 968 873
7	Okres Tábor – Modernizace silnice III/0336 Ratibořské Hory - Lopeček	David Miloš	606 633 829
7	Okres Tábor – Modernizace silnice III/0338 Ratibořské Hory - Dub	David Miloš	606 633 829

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** **ROBSTAV stavby k.s.**  
se sídlem: Italská 1580/26, 120 00 Praha  
IČ: 27430774  
DIČ: CZ27430774  
Bankovní spojení: komerční banka a.s.  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76014

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Ing. Radek Kozák,** tel. č. 377 242 127  
**Ing. Petr Čechal** tel. č. 777 664 930

Odpovědný geodet: Ing. Ivan Pyšek tel. č. 603 106 529


Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Radek Kozák  
tel. č. 377 242 127

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Petr Čecha  
tel. č. 777 664 930

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Čechal  
tel. č. 777 664 930

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



### Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10. 2. 2015 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

### „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9B)“

### II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje zavazuje k provedení díla:

### „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9B)“, a to za níže uvedené okresy (části veřejné zakázky):

Část díla	Název části
4	Okres Písek –Modernizace silnice III/1387 Horní Novosedly
7	Okres Tábor – Modernizace silnice III/0336 Ratibořské Hory - Lopeček
7	Okres Tábor – Modernizace silnice III/0338 Ratibořské Hory - Dub


Pokud se dále v této smlouvě používá pojem „dílo“ rozumí se vždy jeho konkrétní jednotlivá část.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.

3. Místo stavby:

Část díla	Název části a místo stavby
4	Okres Písek –Modernizace silnice III/1387 Horní Novosedly
7	Okres Tábor – Modernizace silnice III/0336 Ratibořské Hory - Lopeček
7	Okres Tábor – Modernizace silnice III/0338 Ratibořské Hory - Dub



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




4. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady, bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

### III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
  - a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo**, nedohodnou-li se strany jinak.
  - b) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): **do níže uvedeného počtu kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.

Část díla	Název části	Počet kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
4	Okres Písek	10
7	Okres Tábor	60

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Směr budoucnost - cíl prosperita

EVROPSKÁ UNIE

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) samostatným předávacím protokolem.

#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:

Část díla	Název části	Celkem v Kč bez DPH	DPH	Celkem v Kč vč. DPH
4	Okres Písek	1 281 848,00	269 188,08	1 551 036,08
7	Okres Tábor	5 323 628,71	1 117 962,02	6 441 590,73

2. Tato cena (resp. ceny jednotlivých částí díla) je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, že o provedení provizorních položek obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná za objednatele jednat ve věci provádění stavby.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
  - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
  - 5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
  - 5.2. Vícepráce budou řešeny takto:  
Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacího řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s., pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



### 5.3. Méněpráce budou oceněny takto:


Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

### 5.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

## V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržovaných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ




Směr budoucnost - cíl prosperita

EVROPSKÁ UNIE

7. Veškeré položky stavebního rozpočtu (včetně tzv. „provizorních položek“), kde jsou jako měrné jednotky uvedeny KČ, KPL nebo SOUBOR, zhotovitel vykalkuluje tak, aby byl schopen po dokončení stavby na požádání objednatele doložit stanovení celkové fakturované částky příslušné položky formou podrobnějšího popisu stavebních prací s rozsahem či výkazů práce (timesheet) a výkazu použitého materiálu (nepostačí pouhé předložení případných subdodavatelských faktur). Pro projektové práce se pro timesheet použijí hodinové sazby dle ceníku UNIKA.
8. Faktura vystavená zhotovitelem bude označena logem poskytovatele dotace, názvem veřejné zakázky a číslem projektu. Číslo projektu (č. proj.: **CZ.1.14/1.1.00/33.03210**) bude uvedeno v textu faktury v části, která odkazuje na název veřejné zakázky.
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

#### VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Směr budoucnost - cíl prosperita

EVROPSKÁ UNIE

předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni –  
- před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím



7




PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně foto publicity (billboard + plaketa), umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky na předmět plnění podle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat stejné (původní) požadavky na kvalifikovaného člena realizačního týmu.
23. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.
24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Směr budoucnost - cíl prosperita

EVROPSKÁ UNIE

řídít se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

#### VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

#### VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a

zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou kolaudaci.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti pro zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí či kolaudačního souhlasu.



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




EVROPSKÁ UNIE

#### IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců**.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce **24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

#### X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
  - a) Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.



4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
7. Stavba je spolufinancována z dotačních fondů EU (ROP NUTS II Jihozápad), proto je zhotovitel povinen respektovat podmínky z této skutečnosti vyplývající.
8. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Sekretariátu regionální rady, MMR, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
9. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je určen v podmínkách o přidělení dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Přesný vzhled takového označení předá po odsouhlasení poskytovatelem dotace objednatel zhotoviteli před vlastní instalací.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho financováním (způsobem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění), na jednom místě do doby uplynutí tří let od uzavření operačního programu – tj. nejméně do konce roku 2025 dle č. 90 Nařízení (ES) 1083/2006. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta stanovená ve výše citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za projekt. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré dokumenty související s realizací díla označit logem poskytovatele dotace – viz publicita projektu.

#### **XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
- Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jeli již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

## XII. Smluvní pokuty

- Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
- Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši (**viz níže v tabulce**) za každý kalendářní den prodlení.
- V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši (**viz níže v tabulce**) za vadu a kalendářní den.
- Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši (**viz níže v tabulce**) za každý kalendářní den prodlení.

Část díla	Název části	Pokuta dle odst. 2 „odstranění vad díla“	Pokuta dle odst. 3 „odstranění vad záruka“	Pokuta dle odst. 4 „vyklizení staveniště“
4	Okres Písek	15.000,-	5.000,-	10.000,-
7	Okres Tábor	15.000,-	5.000,-	10.000,-

- Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
- Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

## XIII. Všeobecná ustanovení

- Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




2. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání nebo zkušebního provozu.
3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
4. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců) dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Tato smlouva byla schválena Radou Jihočeského kraje usnesením č. 235/2015/RK – 59 ze dne 26. 3. 2015.

Přílohy:

- Oceněný výkaz výměr a soupis prací a dodávek

V Českých Budějovicích dne  
za objednatele:

11 -05- 2015

  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtmán Jihočeského kraje

V Plzni dne 11 -05- 2015  
za zhotovitele:

ROBSTAV stavby k.s.  
Italská 1580/26, 120 00 Praha 2  
IČO: 274 30 774  
Ing. Radek Kozák  
člen představenstva RS Holding SE, která je  
statutárním orgánem REMVIKO k.s., která je  
statutárním orgánem ROBSTAV stavby k. s.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Soupis prací

Modernizace silnice III/1387 Horní Novosedly

JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	stanoviště a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č. položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J.)	jednotková cena	celková cena
III/1387	SO 101	0,047 - 0,980  čp. 14 vpravo - konec silnice	0,933	3,5	m2	3 265,5	572 213	spoj. posítk z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup> 933*3,5=3265,5m <sup>2</sup>	9 Kč	29 389,50 Kč
					t	313,5	577 411	vrstvy pro obnovu a opr. z asf. betonu ACO 11 933*3,5*0,04*2,4=313,5 t	1 630 Kč	511 005,00 Kč
					m2	3 265,5	572 213	spoj. posítk z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup> 933*3,5=3265,5m <sup>2</sup>	9 Kč	29 389,50 Kč
					m2	3 265,5	574 142	ACO 11+ tl. 40mm 933*3,5=3265,5m <sup>2</sup>	176 Kč	574 728,00 Kč
					t	19,2	577 411	vrstvy pro obnovu a opr. z asf. bet. ACO 11 100m <sup>2</sup> *0,08*2,4=19,2 t	1 630 Kč	31 296,00 Kč
					m2	1 900,0	56 962	zpev. krajnice z rec. mat. tl. do 100 mm 1900m <sup>2</sup>	40 Kč	76 000,00 Kč
					SO 101 celkem					
Stavební objekty celkem										1 251 808,00 Kč
vedlejší a ostatní náklady					ks	1		DIO ( viz samostatný soupis prací )		15 040,00 Kč
					ks	1		pamětní deska (plast imitace bronzu)	6 000 Kč	6 000,00 Kč
					ks	1		billboard	9 000 Kč	9 000,00 Kč
Vedlejší a ostatní náklady celkem										30 040,00 Kč
Modernizace silnice III/1387 Horní Novosedly celkem										1 281 848,00 Kč
									včetně DPH	1 551 036,08 Kč


Poznámka :


- Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- Tloušťka ohrubné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

ROBSTAV/stavby k.s.  
Italská 1580/26, 120 00 Praha 2  
IČO: 274 40 774  
DIČ: CZ27430774 (6)



Přehledná situace :

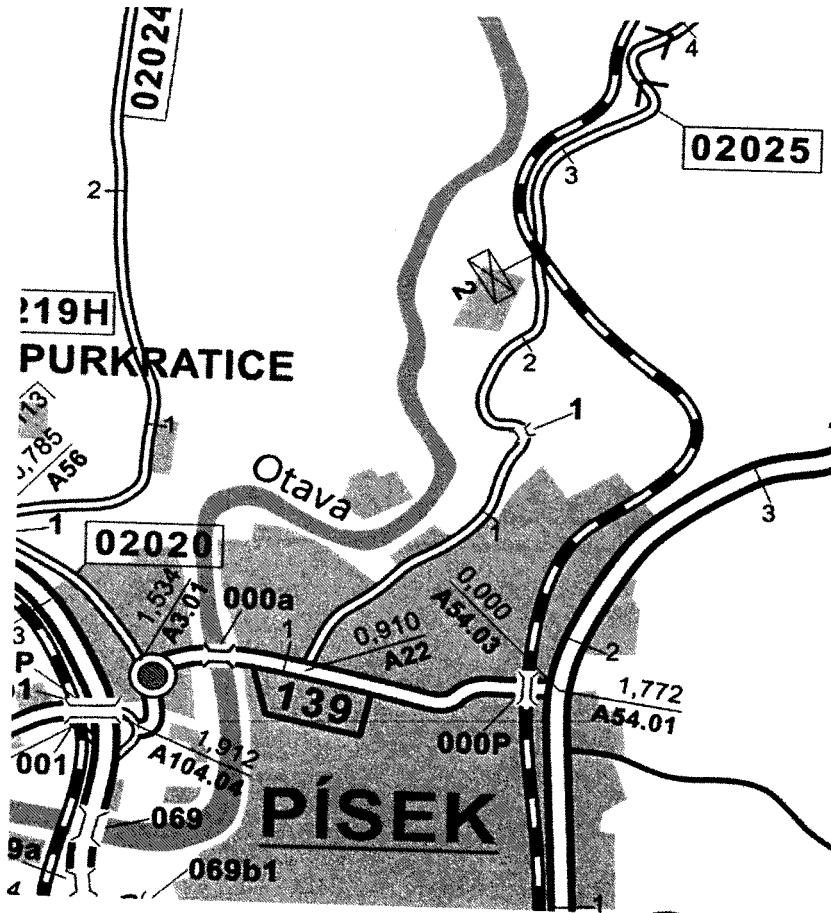

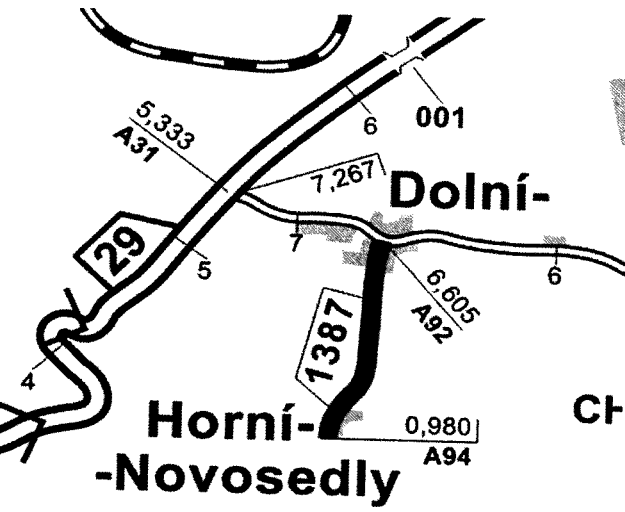

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Soupis prací DIO

Modernizace silnice III/1387 Horní Novosedly

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně vypočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
	SO 102 DIO		0,933		Kč	1,0	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava) 1	5 000 Kč	5 000,00 Kč
					ks	14,0	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+0(IS 11b)+0(IS 11c)=14	220 Kč	3 080,00 Kč
					ks	56,0	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 14*4 dní=56	80 Kč	4 480,00 Kč
					ks	2,0	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (IP 22) +0 (IS 11a)=2	220 Kč	440,00 Kč
					ks	8,0	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 2*4 dní=8	90 Kč	720,00 Kč
					ks	6,0	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž	220 Kč	1 320,00 Kč
SO 102 DIO celkem										15 040,00 Kč

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Soupis prací

Modernizace silnice III/0336 Ratibořské Hory - Lopeček


č. silnice	objekt	stanoviště a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č. položky QTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J.)	jednotková cena	celková cena	
III/0336	SO 101	Ratibořské Hory průtah	0,000 - 0,195	0,195	5	m2	975,0	567 544	recykl. a repr. za stud. do 200 mm 195*5=975	330 Kč	321 750,00 Kč
						m2	975,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 195*5=975	9 Kč	8 775,00 Kč
						m2	975,0	574 142	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm 195*5=975	220 Kč	214 500,00 Kč
						m2	50,0	574 142	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm-úprava rozjezdů 5*10=50	225 Kč	11 250,00 Kč
						ks	5,0	899 22	výšková úprava mlži 5	1 400 Kč	7 000,00 Kč
						m	390	915 111	VDZ-vod. čára 125 mm 195*2=390	40,00 Kč	15 600,00 Kč
<b>SO 101 celkem</b>										<b>578 875,00 Kč</b>	
III/0336	SO 102	Ratibořské Hory Lopeček začátek nové úpravy	0,195 - 1,250	1,055	5	m2	5 275,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 1055*5=5275	9 Kč	47 475,00 Kč
						t	379,8	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11,tl.30mm 5275*0,03*2,4=379,8	1 740 Kč	660 852,00 Kč
						m2	5 275,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 1055*5=5275	9 Kč	47 475,00 Kč
						m2	5 275,0	574 132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm 1055*5=5275	177 Kč	933 675,00 Kč
						m2	50,0	574 132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm-úprava rozjezdů 5*10=50	185 Kč	9 250,00 Kč
						m2	1 055,0	56 932	zpev.krajnice ze štěrku drtí,tl.do100mm,š=0,5m 1055*0,5*2=1055	55 Kč	58 025,00 Kč
						m	2 110	915 111	VDZ-vod. čára 125 mm 1055*2=2110	40,00 Kč	84 400,00 Kč
<b>SO 102 celkem</b>										<b>1 841 152,00 Kč</b>	
<b>Stavební objekty celkem</b>										<b>2 420 027,00 Kč</b>	
ostatní a vedlejší náklady						ks	1		DIO ( viz samostatný soupis prací )		84 530,00 Kč
						ks	1		plaketa	6 000 Kč	6 000,00 Kč
						ks	1		billboard	9 000 Kč	9 000,00 Kč
<b>doplňující údaje celkem</b>										<b>99 530,00 Kč</b>	
<b>Modernizace silnice III/0336 Ratibořské Hory - Lopeček celkem</b>										<b>2 519 557,00 Kč</b>	
										včetně DPH	3 048 663,97 Kč

Poznámka :


- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

ROBSTAV stavby k.s.  
Italská 1580/26, 120 00 Praha 2  
IČO: 274 30 774  
DIČ: CZ27430774 ©

Přehledná situace :

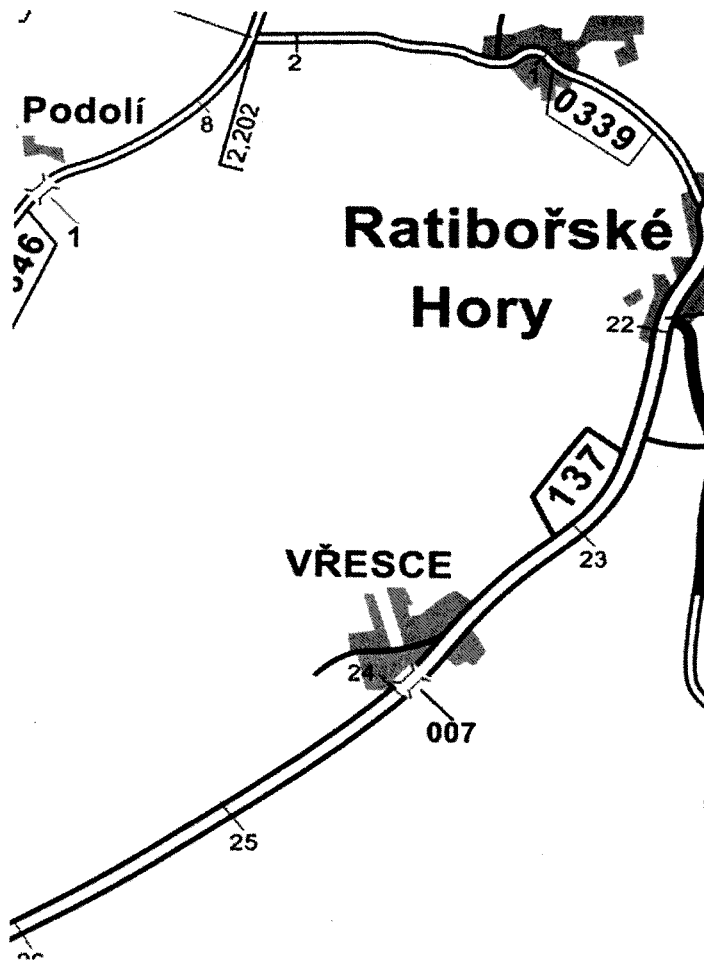

2

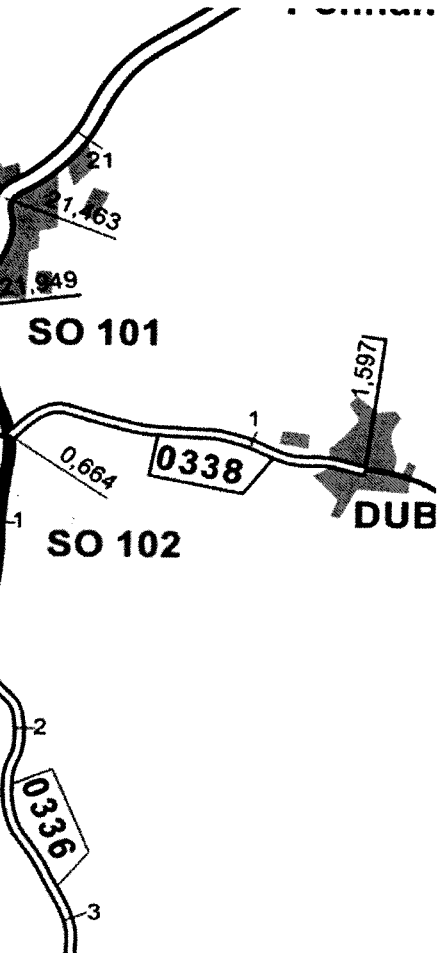

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Soupis prací DIO

Modernizace silnice III/0336 Ratibořské Hory - Lopeček

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/0336	SO 103 DIO	Ratibořské Hory křižovatka III/0338  DIO I. etapa			ks	17,0	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(B1)+6(E13)+5(IS11c)+2(B24a)+2(B24b)=17	100 Kč	1 700,00 Kč
							914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 17*30 dní=510		
						3,0	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 3(IS11a)=3	50 Kč	150,00 Kč
							914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 3*30 dní=90		
						2,0	916 122	dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	1 000 Kč	2 000,00 Kč
							916122R	dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 2*30 dní=60		
						2,0	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 2	40 Kč	80,00 Kč
							916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 2*30 dní=60		
<b>SO 103 DIO I. etapa celkem</b>									<b>45 930,00 Kč</b>	
III/0336	SO 104 DIO	křižovatka III/0338 Lopeček začátek nové úpravy  DIO II. etapa			ks	40,0	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(B1)+4(E13)+4(B20a)+2(B21a)+7(IS11b)+11 (IS11c)+B24a+B24b+3(IP10a)+IP10b+4(E3a)=40	100 Kč	4 000,00 Kč
							914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 40*10 dní=400		
						5,0	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 3(IS11a)+2(IP22)=5	80 Kč	400,00 Kč
							914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 5*10 dní=50		
						2,0	916 122	dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	1 000 Kč	2 000,00 Kč
							916122R	dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 2*10 dní=20		

				ks	2,0	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 2	300 Kč	600,00 Kč
				ks	20,0	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 2*10 dní=20	30 Kč	600,00 Kč
<b>SO 104 DIO II. etapa celkem</b>									<b>38 600,00 Kč</b>
<b>DIO celkem</b>									<b>84 530,00 Kč</b>

R



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Soupis prací

Modernizace silnice III/0338 Ratibořské Hory - Dub

JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	stanoviště a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č. položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J.)	jednotková cena	celková cena	
III/0338	SO 101	Ratibořské Hory čp. 137	0,000 - 0,175	0,175	4,5	m2	787,5	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 175*4,5=787,5	9 Kč	7 087,50 Kč
						t	56,7	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11,tl.30mm 787,5*0,03*2,4=56,7	1 740 Kč	98 658,00 Kč
						m2	787,5	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 175*4,5=787,5	9 Kč	7 087,50 Kč
						m2	787,5	574 132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm 175*4,5=787,5	175 Kč	137 812,50 Kč
						m2	175,0	56 932	zpev.krajnice ze šterkodrti,tl.do100mm,š=0,5m 175*0,5*2=175	52 Kč	9 100,00 Kč
						m	350,0	915 111	VDZ-vod. čára 125 mm 175*2=350	40,00 Kč	14 000,00 Kč
<b>SO 101 celkem</b>										<b>273 745,50 Kč</b>	
III/0338	SO 102	kolem čp. 137	0,175 - 0,235	0,060	4,5	m2	270,0	567 544	recykl. a repr. za stud. do 200 mm 60*4,5=270	340 Kč	91 800,00 Kč
						m2	270,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 60*4,5=270	9 Kč	2 430,00 Kč
						m2	270,0	574 142	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm 60*4,5=270	220 Kč	59 400,00 Kč
						m2	20,0	574 142	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm-úprava rozjezdů 2*10=20	225 Kč	4 500,00 Kč
						m	120,0	915 111	VDZ-vod. čára 125 mm 60*2=120	40,00 Kč	4 800,00 Kč
<b>SO 102 celkem</b>										<b>162 930,00 Kč</b>	
III/0338	SO 103	čp. 137 Dub z.z.	0,235 - 1,397	1,162	4,5	m2	5 229,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 1162*4,5=5229	9 Kč	47 061,00 Kč
						t	627,5	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11,tl.50mm 5229*0,05*2,4=627,5	1 740 Kč	1 091 815,20 Kč
						m2	5 229,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 1162*4,5=5229	9 Kč	47 061,00 Kč
						m2	5 229,0	574 132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm 1162*4,5=5229	175 Kč	915 075,00 Kč
						m2	50,0	574 132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm-úprava rozjezdů 5*10=50	188 Kč	9 400,00 Kč
						m2	1 162,0	56 932	zpev.krajnice ze šterkodrti,tl.do100mm,š=0,5m 1162*0,5*2=1162	52 Kč	60 424,00 Kč
m	2 324,0	915 111	VDZ-vod. čára 125 mm 1162*2=2324	40,00 Kč	92 960,00 Kč						
<b>SO 103 celkem</b>										<b>2 263 796,20 Kč</b>	
III/0338	SO 104	Dub průtah	1,397 - 1,597	0,200	4,5	m2	900,0	567 544	recykl. a repr. za stud. do 200 mm 200*4,5=900	340 Kč	306 000,00 Kč
						m2	900,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 200*4,5=900	9 Kč	8 100,00 Kč
						m2	900,0	574 142	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm 200*4,5=900	215 Kč	193 500,00 Kč
						m2	100,0	574 142	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm-úprava rozjezdů 10*10=100	225 Kč	22 500,00 Kč
						m	400,0	915 111	VDZ-vod. čára 125 mm 200*2=400	40,00 Kč	16 000,00 Kč
<b>SO 104 celkem</b>										<b>0,00 Kč</b>	
<b>Stavební objekty celkem</b>										<b>2 700 471,70 Kč</b>	
vedlejší a ostatní náklady						ks	1	DIO ( viz samostatný soupis prací )		88 600,00 Kč	
						ks	1	pamětní deska (plast imitace bronzu)	6 000 Kč	6 000,00 Kč	
						ks	1	billboard	9 000 Kč	9 000,00 Kč	
<b>Vedlejší a ostatní náklady celkem</b>										<b>103 600,00 Kč</b>	
<b>Modernizace silnice III/0338 Ratibořské Hory - Dub celkem</b>										<b>2 804 071,70 Kč</b>	
										<b>včetně DPH 3 392 926,76 Kč</b>	


Poznámka :

- Uvedený rozsah prací je předpokládaný, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované dřtí, s nulovou tolerancí.

ROBSTAV stavby k.s.  
Italská 1580/26, 120 00 Praha 2  
IČO: 274 80 774  
DIČ: CZ27430774 (6)

Přehledná situace :



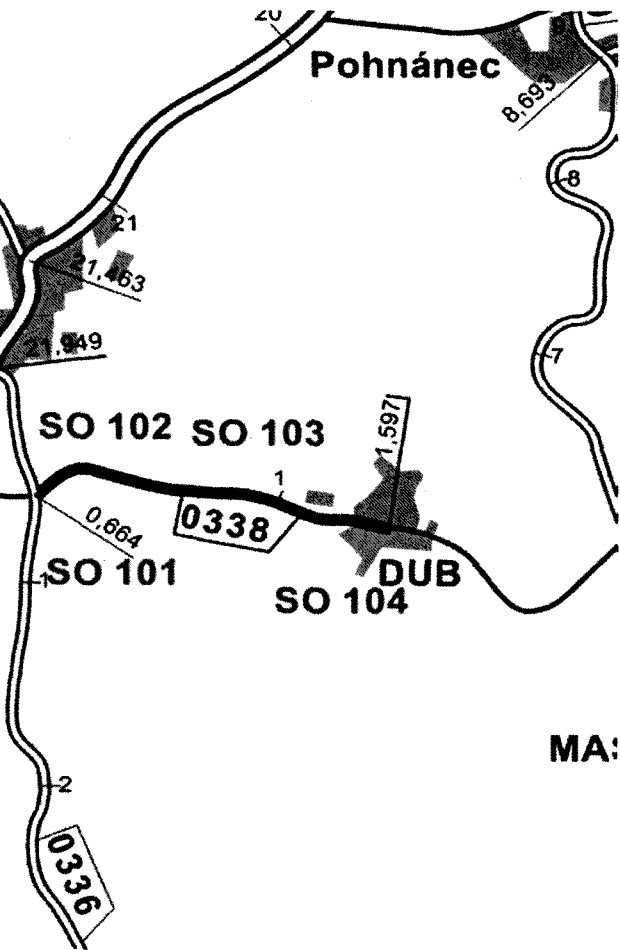

MA:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
 Soupis prací DIO

Modernizace silnice III/0338 Ratibořské Hory - Dub

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/0338	SO 105 DIO	Ratibořské Hory Dub  DIO			ks	31,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(B1)+4(E13)+5(IS11b)+12(IS11c)+B24a+B24b+IP10a+2(IP10b)+3(E3a)=31	100 Kč	3 100,00 Kč
					ks	1 860,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 31*60 dní=1860	20 Kč	37 200,00 Kč
					ks	5,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 3(IS11a)+2(IP22)=5	60 Kč	300,00 Kč
					ks	300,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 5*60 dní=300	40 Kč	12 000,00 Kč
					ks	2,00	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	1 000 Kč	2 000,00 Kč
					ks	120,00	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 2*60 dní=120	250 Kč	30 000,00 Kč
					ks	2,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 2	200 Kč	400,00 Kč
					ks	120,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 2*60 dní=120	30 Kč	3 600,00 Kč
SO 105 DIO celkem									88 600,00 Kč	

ROBSTAV stavby k.s.  
Italská 1580/23, 120 00 Praha 2

IČO: 274 30 774

DIČ: CZ27430774

