



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/128/15

Číslo smlouvy zhotovitele: 08/2015



KUJCP018JLJS

## SMLOUVA O DÍLO

Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9 C)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I. Strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:  
**Mgr. Martin Ujhelyi**, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

### SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK

se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,  
tel. č. 606 715 690  
IČ: 70971641



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>	tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>
6	Okres Strakonice – Modernizace silnice III/17726 Zámlyní - Metly	Martin Jirsa	724 029 324
6	Okres Strakonice – Modernizace silnice III/02021 Lažany - Milčice	Martin Jirsa	724 029 324
6	Okres Strakonice – Modernizace silnice III/1446 Předslavice - Bušanovice	Vlastislav Antuš	724 029 543
6	Okres Strakonice – Modernizace silnice III/13910 Rojice - Láz	Daniel Čížek	724 029 906
7	Okres Tábor – Modernizace silnice III/1224 Padařov - Drhovice	Miloš David	606 633 829

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** D.I.S., spol. s r.o.  
se sídlem: Křížíkova 3009/72a, 612 00 Brno  
IČ: 46975616  
DIČ: CZ46975616  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 7248310207/0100  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

**Ing. Richard Lang**, jednatel společnosti tel. č. 545 128 545

Odpovědný geodet: **Ing. Pavel Vašíček** tel. č. 548 534 531

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: **Ing. Roman Krčil**  
tel. č. 545 128 572, 724 059 975

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: **Jaroslav Šťastný**  
tel. č. 545 128 589, 602 748 437

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: **Ing. Jakub Slavíček**  
tel. č. 545 128 535, 602 731 791

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



### Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9. 2. 2015 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

### „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9C)“

### II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje zavazuje k provedení díla“:

**„Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9C)“,**  
a to za níže uvedené okresy (části veřejné zakázky):

Část díla	Název části
6	Okres Strakonice –Modernizace silnice III/17726 Zámlyní - Metly
6	Okres Strakonice –Modernizace silnice III/02021 Lažany - Milčice
6	Okres Strakonice –Modernizace silnice III/1446 Předslavice - Bušanovice
6	Okres Strakonice – Modernizace silnice III/13910 Rojice - Láz
7	Okres Tábor – Modernizace silnice III/1224 Padařov - Drhovice

Pokud se dále v této smlouvě používá pojem „dílo“ rozumí se vždy jeho konkrétní jednotlivá část.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.

3. Místo stavby:

Část díla	Název části a místo stavby
6	Okres Strakonice –Modernizace silnice III/17726 Zámlyní - Metly



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



6	Okres Strakonice –Modernizace silnice III/02021 Lažany - Milčice
6	Okres Strakonice –Modernizace silnice III/1446 Předslavice - Bušanovice
6	Okres Strakonice – Modernizace silnice III/13910 Rojice - Láz
7	Okres Tábor – Modernizace silnice III/1224 Padařov - Drhovice

4. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhůtovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady, bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

### III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
  - a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo**, nedohodnou-li se strany jinak.
  - b) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): **do níže uvedeného počtu kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště**.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Část díla	Název části	Počet kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
6	Okres Strakonice	15
7	Okres Tábor	60


- Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
- Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).
- V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
- Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) samostatným předávacím protokolem.

#### IV. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:

Část díla	Název části	Celkem v Kč bez DPH	DPH	Celkem v Kč vč. DPH
6	Okres Strakonice	7 583 443,-	1 592 523,-	9 175 966,-
7	Okres Tábor	7 573 700,-	1 590 477,-	9 164 177,-

- Tato cena (resp. ceny jednotlivých částí díla) je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, že o provedení provizorních položek obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná za objednatele jednat ve věci provádění stavby.
- Změna sjednané ceny je možná pouze



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 5.2. Vícepráce budou řešeny takto:
- Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacního řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s., pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
- 5.3. Méněpráce budou oceněny takto:
- Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 5.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

## V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplacen nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Veškeré položky stavebního rozpočtu (včetně tzv. „provizorních položek“), kde jsou jako měrné jednotky uvedeny Kč, KPL nebo SOUBOR, zhotovitel vykalkuluje tak, aby byl schopen po dokončení stavby na požádání objednatele doložit stanovení celkové fakturované částky příslušné položky formou podrobnějšího popisu stavebních prací s rozsahem či výkazů práce (timesheet) a výkazu použitého materiálu (nepostačí pouhé předložení případných subdodavatelských faktur). Pro projektové práce se pro timesheet použijí hodinové sazby dle ceníku UNIKA.
8. Faktura vystavená zhotovitelem bude označena logem poskytovatele dotace, názvem veřejné zakázky a číslem projektu. Číslo projektu (č. proj.: **CZ.1.14/1.1.00/33.03212**) bude uvedeno v textu faktury v části, která odkazuje na název veřejné zakázky.
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

## VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
  5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
  6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
  7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
  8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
  9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
  10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.





**EVROPSKÁ UNIE**

**PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**Směr budoucnost - cíl prosperita**



11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávnění na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatelem vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – - před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně foto publicity (billboard + plaketa), umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky na předmět plnění podle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat stejné (původní) požadavky na kvalifikovaného člena realizačního týmu.
23. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.
24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

## VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

#### VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou kolaudaci.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti pro zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí či kolaudačního souhlasu.

#### IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců**.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezabavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce **24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisu bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření,



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

#### X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
  - a) Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
7. Stavba je spolufinancována z dotačních fondů EU (ROP NUTS II Jihozápad), proto je zhotovitel povinen respektovat podmínky z této skutečnosti vyplývající.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ


Směr budoucnost - cíl prosperita



8. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Sekretariátu regionální rady, MMR, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
9. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je určen v podmínkách o přidělení dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Přesný vzhled takového označení předá po odsouhlasení poskytovatelem dotace objednatel zhotoviteli před vlastní instalací.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho financováním (způsobem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění), na jednom místě do doby uplynutí tří let od uzavření operačního programu – tj. nejméně do konce roku 2025 dle č. 90 Nařízení (ES) 1083/2006. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta stanovená ve výše citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za projekt. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré dokumenty související s realizací díla označit logem poskytovatele dotace – viz publicita projektu.

#### **XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



## XII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši (**viz níže v tabulce**) za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši (**viz níže v tabulce**) za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši (**viz níže v tabulce**) za každý kalendářní den prodlení.

Část díla	Název části	Pokuta	Pokuta	Pokuta
		dle odst. 2 „odstranění vad díla“	dle odst. 3 „odstranění vad záruka“	dle odst. 4 „vyklizení staveniště“
6	Okres Strakonice	15.000,-	5.000,-	10.000,-
7	Okres Tábor	15.000,-	5.000,-	10.000,-

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

## XIII. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Zhotovitel se zavazuje s objednatel uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání nebo zkušebního provozu.
3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatel zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
4. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců) dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Tato smlouva byla schválena Radou Jihočeského kraje usnesením č. 316/2015/RK-60 ze dne 2. 4. 2015.

Přílohy:

- Oceněný výkaz výměr a soupis prací a dodávek

V Českých Budějovicích dne 22 -05- 2015


za objednatele:

V Brně dne 21.5.2015

za zhotovitele:

.....  
 Mgr. Jiří Zimola  
 hejtman Jihočeského kraje

.....  
 Ing. Richard Lang  
 jednatel společnosti





Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Soupis prací


Modernizace silnice III/02021 Lažany-Milčice

JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy


č. silnice	objekt	stančení a popis úseku (km)	dělna (km)	průměr (m)	M3	množství	položky OTSKP-SPK	popis úpravy (učebně vyjádřit množství)	Jednotková cena	celková cena						
III/02021	SO 101	0,000 - 1,239 modernizace silnice napojení na III/1731 rozšíření u bytovky rozšíření u č.p.2	1,239	4,0		m2	5 140,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 (1239*4)+184= 5140,0	12 Kč	61 680,00 Kč					
						t	370,1	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, tl.30mm (1239*4*0,03*2,4)+(184*0,03*2,4)=370,08	2 070 Kč	766 065,60 Kč					
						m2	5 140,0	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm (1239*4)+184= 5140,0	152 Kč	781 280,00 Kč					
						m3	2,2	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl. 50 mm) (19+3,7*0,05*1)+(12+9*0,05*1) = 2,185 m3	529 Kč	1 155,87 Kč					
						m2	21,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 (12+9)*1 = 21,0 m2	12 Kč	252,00 Kč					
						m2	21,0	574 142	obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm (12*1)+(9*1)= 21,0 m2	190 Kč	3 990,00 Kč					
						m2	723,9	56 932	dosypání krajnic štěrkoků do 100 mm (1239*0,3*2)-(44+12+9*0,3)=723,9	92 Kč	66 598,80 Kč					
						m	2 478,0	915 111	vodící čára 125mm s balotinou - zřízení 1239*2=2478,0	13,00 Kč	32 214,00 Kč					
						<b>SO 101 celkem</b>										<b>1 713 236,27 Kč</b>
						<b>Stavební objekty celkem</b>										<b>1 713 236,27 Kč</b>
vedlejší a ostatní náklady								DiO ( viz samostatný soupis prací )	9437	9 437,00 Kč						
							ks	1	pamětní deska (plast imitace bronzu)	5 751 Kč	5 751,00 Kč					
							ks	1	billboard	17 253 Kč	17 253,00 Kč					
<b>Vedlejší a ostatní náklady celkem</b>										<b>32 441,00 Kč</b>						
<b>Modernizace silnice III/02021 Lažany-Milčice celkem</b>										<b>1 745 677,27 Kč</b>						
										<b>včetně DPH 2 112 269,49 Kč</b>						

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládaný, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.



Přehledná situace :

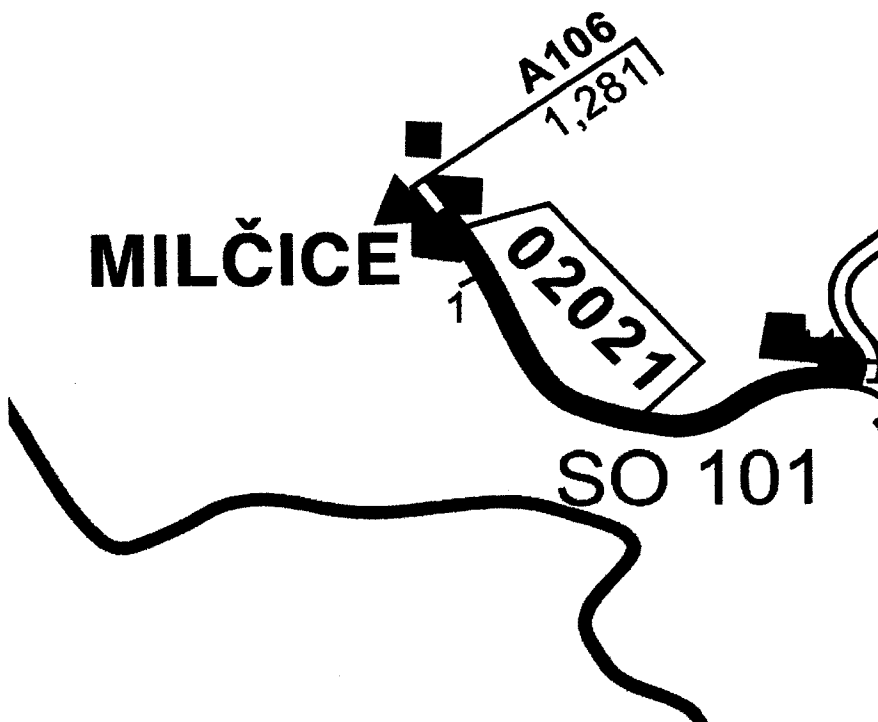




# Lažany

10,969

A76



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Soupis prací DIO

Modernizace silnice III/02021 Lažany-Milčice

silnice	objekt	stanoviště a popis úseku (km)	délka (km)	průměr (m)	tl3	množství	položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství / T3)	jednotková cena	celková cena	
	SO 102 DIO					Kč	1,0	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objízdky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	288 Kč	288,00 Kč
						ks	2,0	914...	přelepení DZ vč. odlepení	23 Kč	46,00 Kč
						ks	25,0	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 5(A15)+4(B1)+1(B20a)+1(B24a)+1(B24b)+4(IS 11b)+1(IS 11c)+1(IP 10a)+1(E3a)+4(E7a)+2(E13)=25	23 Kč	575,00 Kč
						ks	250,0	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem 25*10 dní=250	12 Kč	3 000,00 Kč
						ks	2,0	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(IP 22)=2	23 Kč	46,00 Kč
						ks	20,0	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem 2*10 dní=20	12 Kč	240,00 Kč
						ks	2,0	916 122	doprav svěšlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	115 Kč	230,00 Kč
						ks	20,0	916122R	doprav svěšlo výstražná souprava 3 ks - nájem 2*10 dní=20	230 Kč	4 600,00 Kč
						ks	4,0	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 4	23 Kč	92,00 Kč
						ks	40,0	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 4*10 dní=40	8 Kč	320,00 Kč
SO 102 DIO celkem										9 437,00 Kč	

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Soupis prací


Modernizace silnice III/13910 Rojice - Láz

JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy


č. silnice	objekt	rozsah a popis objektu (km)	delka (km)	šířka (m)	MJ	množství	položky a) Kč, b) sp.	popis úpravy (včetně výpočtu množství)	jednotková cena	celková cena				
III/13910	SO 101	0,013 - 1,276	1,263	5,0	m2	6 315,0	572 213	spoj. postřik z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup> 1263*5=6315,0	12 Kč	75 780,00 Kč				
					t	454,7	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11. tl.30mm 1263*5*0,03*2,4=454,68	2 070 Kč	941 187,80 Kč				
					m2	6 315,0	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 1263*5=6315,0	152 Kč	959 880,00 Kč				
					m2	757,8	56 932	dosypání krajnic štěrkokof do 100 mm 1263*2*0,3=757,8	92 Kč	69 717,60 Kč				
					m	2 526,0	56 932	vodící čára 125 mm s belotinou - zřízení 1263*2=2526,0	13,00 Kč	32 838,00 Kč				
					m3	1,5	113 724	frézování voz. asf. - odvoz do 5 km (tl.50mm) 30*0,05=1,5	529 Kč	793,50 Kč				
					m2	24,0	572 213	spoj. postřik z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup> 24	12 Kč	288,00 Kč				
					m2	24,0	574 142	obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm 24	190 Kč	4 560,00 Kč				
					SO 101 celkem									2 085 044,70 Kč
					Stavební objekty celkem									2 085 044,70 Kč
vedlejší a ostatní náklady					ks	1		DIO ( viz samostatný soupis prací )	7944	7 944,00 Kč				
					ks	1		pamětní deska (plast imitace bronzu)	5 751 Kč	5 751,00 Kč				
					ks	1		billboard	17 253 Kč	17 253,00 Kč				
Vedlejší a ostatní náklady celkem									30 948,00 Kč					
Modernizace silnice III/13910 Rojice - Láz celkem									2 115 992,70 Kč					
									včetně DPH	2 560 351,17 Kč				

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obelované drůt, s nulovou tolerancí.



Přehledná situace :

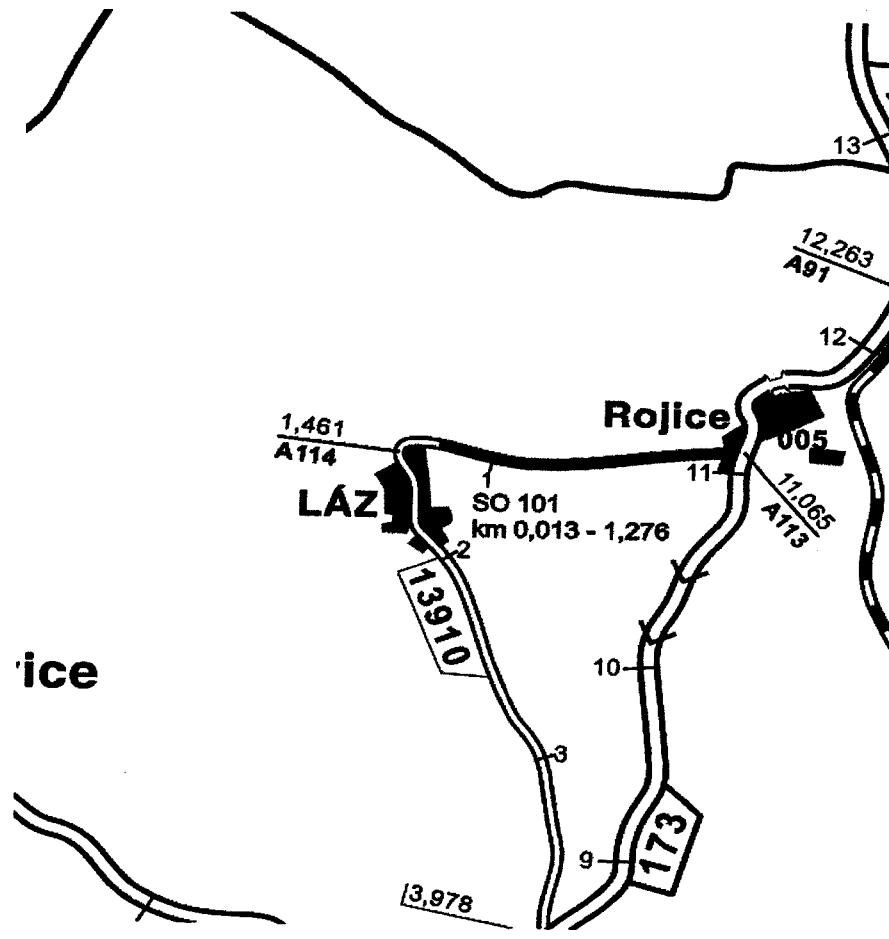



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Sopupis prací DIO

Modernizace silnice III/13910 Rojice - Lázeň

č. silnice	objekt	stanoviční popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	číslo položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství / TJ)	jednotková cena	celková cena
	SO 102 DIO				Kč	1,0	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objízdky (projednání s úřady popř. náhr. dopravě)	288 Kč	288,00 Kč
					ks	2,0	914...	přelepení DZ vě. odlepení	23 Kč	46,00 Kč
					ks	16,0	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 3(A15)+2(B1)+1(B20a)+1(B21a)+1(B21b)+1(S 11b)+2(P 10a)+1(E3a)+2(E7a)+2(E13)=16	23 Kč	368,00 Kč
					ks	160,0	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 16*10 dní=160	12 Kč	1 920,00 Kč
					ks	2,0	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(S 11a)=2	23 Kč	46,00 Kč
					ks	20,0	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 2*10 dní=20	12 Kč	240,00 Kč
					ks	2,0	916 122	doprav světló výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	115 Kč	230,00 Kč
					ks	20,0	916122R	doprav světló výstražná souprava 3 ks - nájem 2*10 dní=20	230 Kč	4 600,00 Kč
					ks	2,0	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 2	23 Kč	46,00 Kč
					ks	20,0	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 2*10 dní=20	8 Kč	160,00 Kč
SO 102 DIO celkem										7 944,00 Kč



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Soupis prací

Modernizace silnice III/1446 Předslavice - Bušanovice

JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	stanoviště a popis úseku (km)	délka (km)	průměr (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J)	jednotková cena	celková cena				
III/1446	SO 101	0,229 - 1,293 modernizace krytů	1,064	4,0	m2	4 256,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 1064*4,0= 4 256,0	12 Kč	51 072,00 Kč				
					t	306,4	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, tl.30mm 1064*4,0*0,03*2,4=306,43	2 070 Kč	634 314,24 Kč				
					m2	4 256,0	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 1064*4,0= 4 256,0	152 Kč	646 912,00 Kč				
					m3	1,3	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl. 50 mm) (3,9*0,05*1=0,195) + (3,9*0,05*1=0,195) + (10*0,05*0,5=0,5) + (8*0,05*1=0,45) = 1,34	529 Kč	708,88 Kč				
					m2	28,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 (9+10+9)*1=28,0	12 Kč	336,00 Kč				
					m2	28,0	574 142	obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm (9+10+9)*1=28,0	190 Kč	5 320,00 Kč				
					m2	610,4	56 932	dosypání krajnic šterkodř do 100 mm (1064*0,3*2)=638,4 - 28 = 610,4	92 Kč	56 156,80 Kč				
					m	2 128,0	915 111	vodící čára 125mm s balotinou - zřízení 1064*2=2128,0	13,00 Kč	27 864,00 Kč				
					SO 101 celkem									1 422 483,90 Kč
					Stavební objekty celkem									1 422 483,90 Kč
		vedlejší a ostatní náklady			ks	1	DIO ( viz samostatný soupis prací )	5888	5 888,00 Kč					
					ks	1	pamětní deska (plast imitace bronzu)	5 751 Kč	5 751,00 Kč					
					ks	1	billboard	17 253 Kč	17 253,00 Kč					
Vedlejší a ostatní náklady celkem									28 872,00 Kč					
Modernizace silnice III/1446 Předslavice - Bušanovice celkem									1 451 355,90 Kč					
									včetně DPH	1 756 140,64 Kč				


Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládaný, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované dřívě, s nulovou tolerancí.

D.I.S., spol. s r.o.  
Křižíkova 3009/72  
612 00 Brno  
IČ: 252 215

Přehledná situace :

LETICE

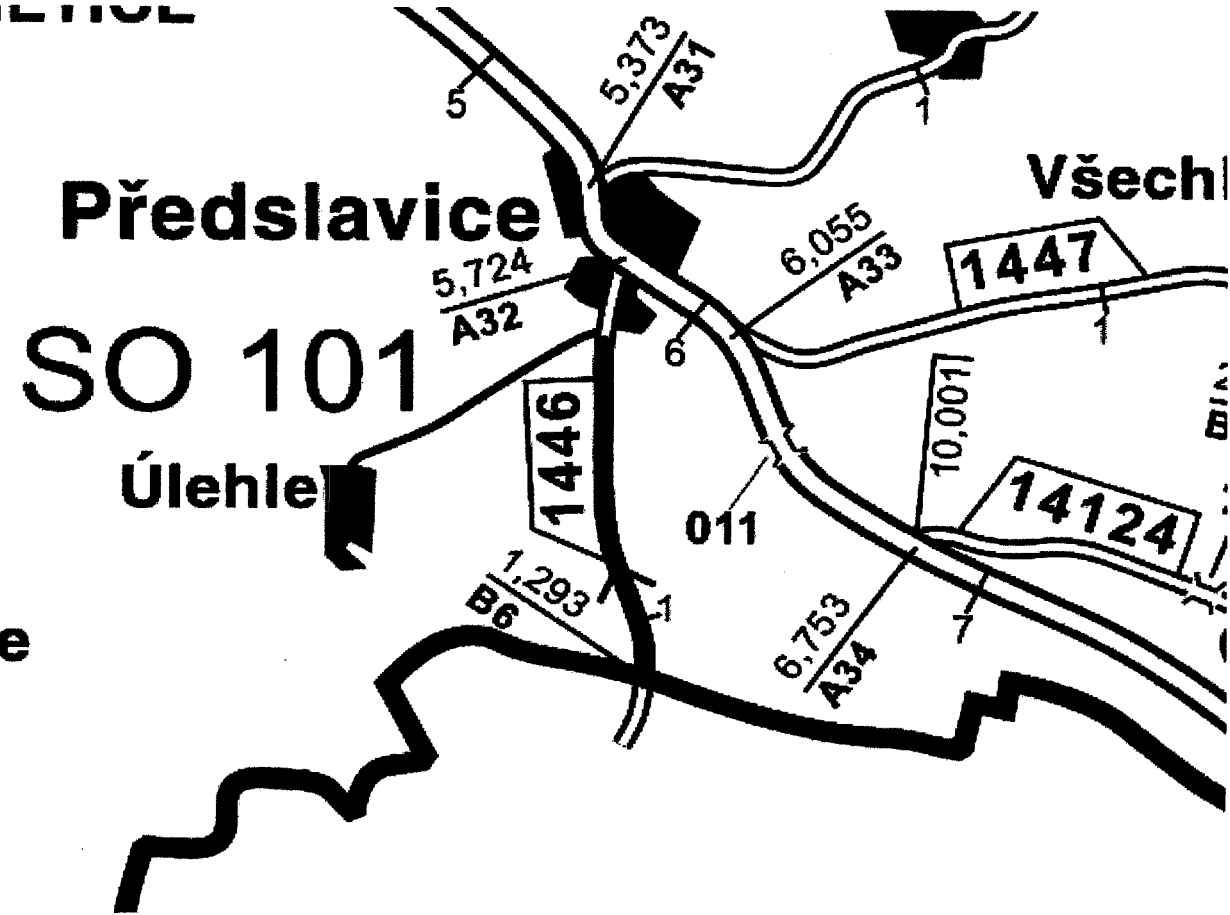

e

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Modernizace silnice III/1446 Předslavice - Bušanovice

č. silnice	objekt	stančení a popis úseku (km)	délka (km)	průměr (m)	MJ	množství	číslo položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J.)	jednotková cena	celková cena
	SO 102 DIO				Kč	1,0	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	288 Kč	288,00 Kč
					ks	2,0	914...	přešení DZ vč. odlepení	23 Kč	46,00 Kč
					ks	14,0	914 122	dopravní značky základ. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2(B1)+2(B20a)+3(S11b)+1(S11c)+1(P10a)+2(P10b)+1(E3a)=14	23 Kč	322,00 Kč
					ks	98,0	914122R	dopravní značky základ. velikost ocel fólie tř. 1 -nám 14*7 dní=98	12 Kč	1 176,00 Kč
					ks	4,0	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(S 11a)+2(P22)=4	23 Kč	92,00 Kč
					ks	28,0	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nám 4*7 dní=28	12 Kč	336,00 Kč
					ks	2,0	916 122	dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	115 Kč	230,00 Kč
					ks	14,0	916122R	dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - nám 2*7 dní=14	230 Kč	3 220,00 Kč
					ks	2,0	916 312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	23 Kč	46,00 Kč
					ks	14,0	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nám 2*7 dní=14	8 Kč	112,00 Kč
SO 102 DIO celkem										5 888,00 Kč


Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Soupis prací

Modernizace silnice III/17726 Zámlyni - Metly


č. silnice	objekt	stanoviště a popis úseku (km)	délka (km)	průměr (m)	M.J.	množství	č. položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J.)	jednotková cena	celková cena		
III/17726	SO 101	0,050 - 1,315 modernizace krytu rozšíření na 0,050 za mostem	1,265  (12*17) / 2 = 102 m2	5,3  102 m2	m2	6 806,5	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 1265*5,3= 6 704,50 + 102 = 6 806,5	12 Kč	81 678,00 Kč		
					t	490,1	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, tl.30mm (1265*5,3)+102*0,03*2,4=490,068	2 070 Kč	1 014 440,76 Kč		
					m2	6 806,5	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 1265*5,3= 6 704,50 + 102 = 6 806,5	152 Kč	1 034 588,00 Kč		
				zafrézování 2x napojení 1 x vjezd k RD 1 x vjezd k RD 1x vjezd k rybníku	11*1 + 4,7*1 6*1 12*1 25*1		m3	2,9	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl. 50 mm) (11*0,05*1=0,55) + (4,7*0,05*1=0,235) + (6,0*0,05*0,5=0,3) + (12*0,05*1=0,6)+ (25*0,05*1=1,25) Celkem: 2,935	529 Kč	1 552,62 Kč
				1 x vjezd bez frézov 1 x sjezd bez frézov 1 x vjezd k RD 1 x vjezd k RD 1x vjezd k rybníku	7*1 6*1 12*1 25*1		m2	56,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 7+6+6+12+25 = 56,0	12 Kč	672,00 Kč
							m2	56,0	574 142	obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm 7+6+6+12+25 = 56,0	190 Kč	10 640,00 Kč
							m2	672,0	56 932	dospání krajnic štěrkoků do 100 mm (1265*0,3*2)=759-87=672,0	92 Kč	61 824,00 Kč
							m	2 530,0	915 111	vodící čára 125mm s balotinou - zřízení 1265*2=2530,0	13,00 Kč	32 890,00 Kč
		<b>SO 101 celkem</b>									<b>2 238 285,38 Kč</b>	
		<b>Stavební objekty celkem</b>									<b>2 238 285,38 Kč</b>	
				vedlejší a ostatní náklady					DIO ( viz samostatný soupis prací )	9128	9 128,00 Kč	
							ks	1	pamětní deska (plast imitace bronzu)	5 751 Kč	5 751,00 Kč	
					ks	1	billboard	17 253 Kč	17 253,00 Kč			
<b>Vedlejší a ostatní náklady celkem</b>									<b>32 132,00 Kč</b>			
<b>Modernizace silnice III/17726 Zámlyni - Metly celkem</b>									<b>2 270 417,38 Kč</b>			
									<b>včetně DPH</b>	<b>2 747 206,02 Kč</b>		

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.



Přehledná situace :

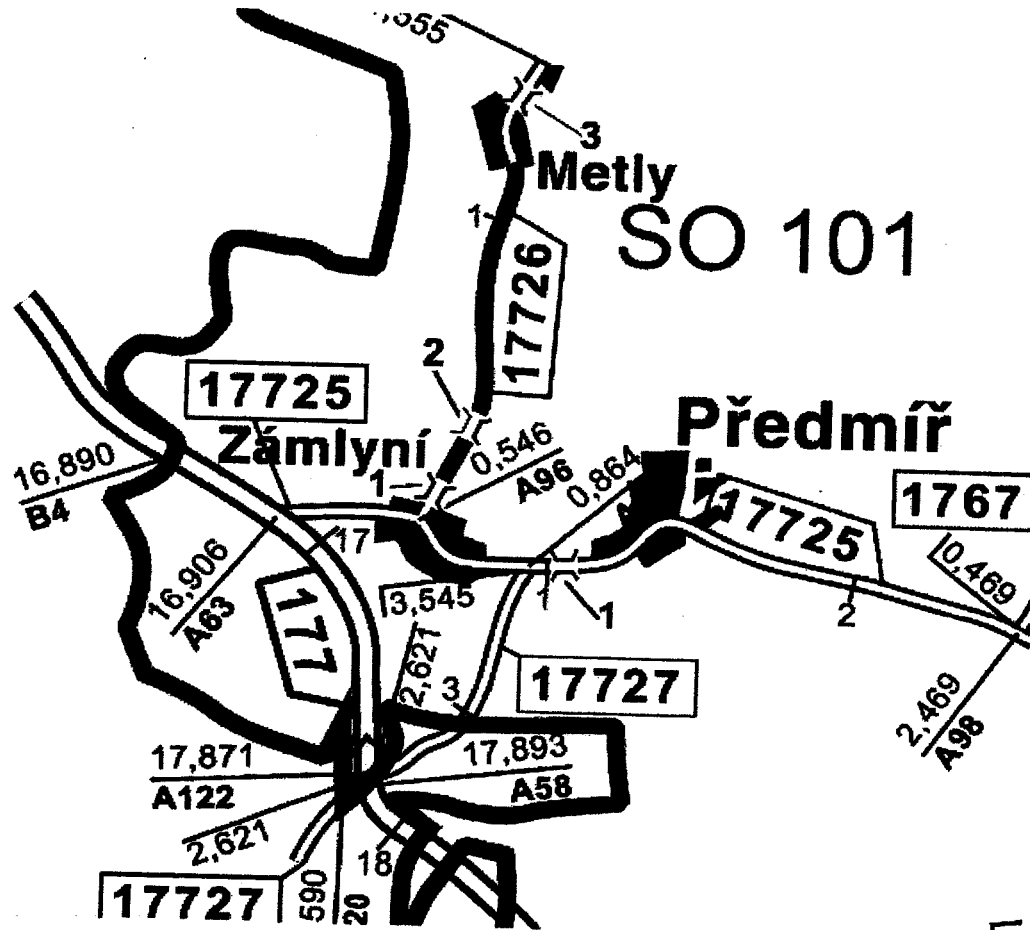

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
 Soupis prací DIO

Modernizace silnice III/17726 Zámlyni - Metly

silnice	objekt	stanoviště a popis úseku (km)	délka (km)	průměr (m)	M3	množství	popis práce OBSKRISPK	popis práce AVV (výběr výpočtu množství)	jednotková cena	celková cena
	SO 102 DIO				Kč	1,0	2 710	doproc práce zřízení nebo zajištění objízdky (projednání s úřady popř. nář. doprava)	288 Kč	288,00 Kč
					ks	1,0	914...	přelepení DZ vč. odlepení	23 Kč	23,00 Kč
					ks	21,0	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+4(B1)+2(B20a)+4(S11b)+6(S11c)+1(P10a)+2(P10b)=21	23 Kč	483,00 Kč
					ks	210,0	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 21*10 dní=210.	12 Kč	2 520,00 Kč
					ks	4,0	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 1(S 11a)+3(P22)=4	23 Kč	92,00 Kč
					ks	40,0	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4*10 dní=40	12 Kč	480,00 Kč
					ks	2,0	916 122	doprav světló výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	115 Kč	230,00 Kč
					ks	20,0	916122R	doprav světló výstražná souprava 3 ks - nájem 2*10 dní=20	230 Kč	4 600,00 Kč
					ks	4,0	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 4	23 Kč	92,00 Kč
					ks	40,0	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 4*10 dní=40	8 Kč	320,00 Kč
SO 102 DIO celkem										9 128,00 Kč

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Soupis prací

Modernizace silnice III/1224 - Padařov - Drhovice

JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy


č. silnice	objekt	stanoviště a popis úseku (km)	delka (km)	šířka (m)	MJ	množství	číslo položky OTSKP-SPK	popis úpravy (veškeré výpočty množství / TJ)	jednotková cena	celková cena	
III/1224	SO 101	Padařov Drhovice	2,235 - 5,023	2,788	4,8	m2	13 382,4	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 2788*4,8=13382,4	12 Kč	160 588,80 Kč
						t	963,5	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11,tl.30mm 13382,4*0,03*2,4=963,5	2 070 Kč	1 984 512,90 Kč
						m2	13 382,4	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 2788*4,8=13382,4	12 Kč	160 588,80 Kč
						m2	13 382,4	574 132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm 2788*4,8=13382,4	152 Kč	2 034 124,80 Kč
						m2	70,0	574 132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm-úprava rozjezdů 7*10=70	152 Kč	10 640,00 Kč
						m2	2 788,0	56 932	zpev.krajnice ze šterkodrti,tl.do100mm,š=0,5m 2788*0,5*2=2788	61 Kč	170 068,00 Kč
						m	5 576	915 111	VDZ-vod. čára 125 mm 2788*2=5576	13,00 Kč	72 488,00 Kč
						<b>SO 101 celkem</b>					
III/1224	SO 102	Drhovice přůtah	5,023 - 5,573	0,550	5,5	m3	1 210,0	113 337	odstr. podkl. voz. s asf. poj. odvoz do 16 km 550*5,5*0,4=1210	467 Kč	565 070,00 Kč
						m3	3 025,0	18 110	úprava pláňe se zhutněním 550*5,5=3025	8 Kč	24 200,00 Kč
						m3	908,0	56 330	podklad ze ŠD 550*5,5*0,3=908	866 Kč	786 328,00 Kč
						m2	3 025,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 550*5,5=3025	12 Kč	36 300,00 Kč
						t	363,0	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACL 16,tl.50mm 3025*0,05*2,4=363	2 070 Kč	751 410,00 Kč
						m2	3 025,0	572 215	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 550*5,5=3025	12 Kč	36 300,00 Kč
						m2	3 025,0	574 142	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm 550*5,5=3025	190 Kč	574 750,00 Kč
						m2	500,0	574 142	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm-úprava rozjezdů 250* 25*10=500	190 Kč	95 000,00 Kč
						m	1 100	915 111	VDZ-vod. čára 125 mm 550*2=1100	13,00 Kč	14 300,00 Kč
						<b>SO 102 celkem</b>					
<b>Stavební objekty celkem</b>										<b>7 486 689,30 Kč</b>	
vedlejší a ostatní náklady						ks	1	DIO ( viz samostatný soupis prací )	64027	64 027,00 Kč	
						ks	1	pamětní deska (plast imitace bronzu)	5 751 Kč	5 751,00 Kč	
						ks	1	billboard	17 253 Kč	17 253,00 Kč	
<b>Vedlejší a ostatní náklady celkem</b>										<b>87 031,00 Kč</b>	
<b>Modernizace silnice III/1224 - Padařov - Drhovice celkem</b>										<b>7 673 700,30 Kč</b>	
										<b>včetně DPH 9 164 177,36 Kč</b>	

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládaný, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované dřevě, s nulovou tolerancí.

DIS, spol. s r.o.  
Křižkova 3009/72a  
602 00 Brno  
tel. 469 75 616  
19

Přehledná situace :

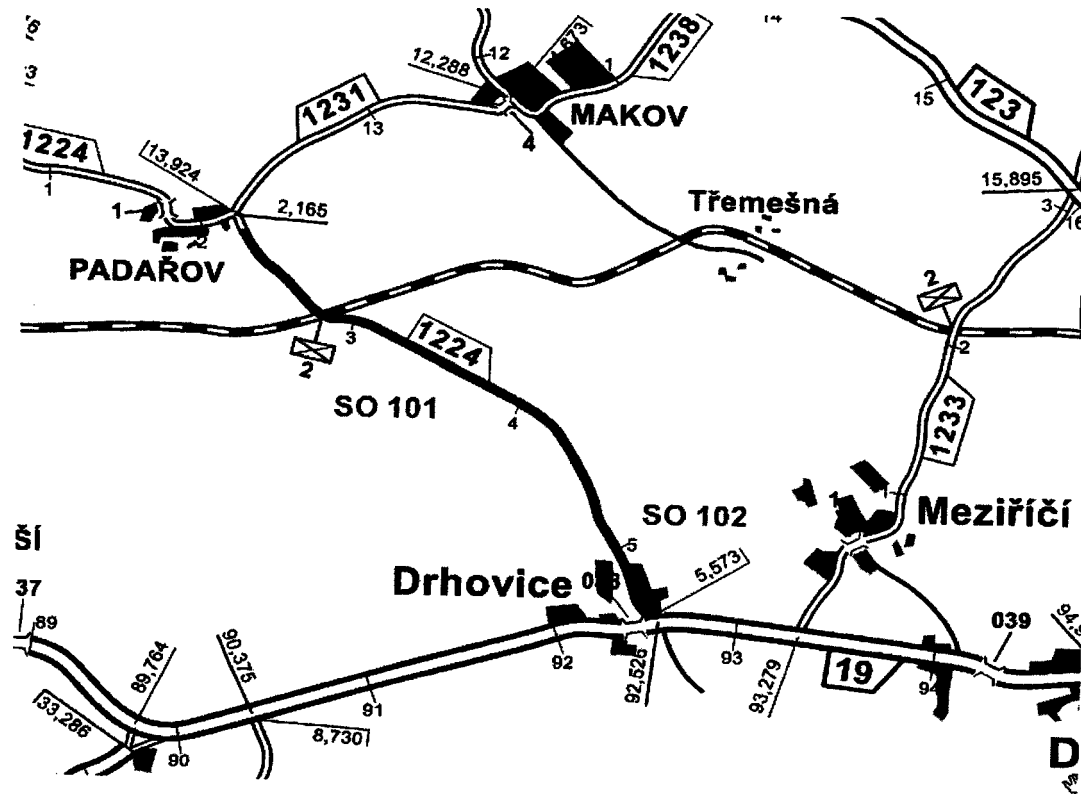



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Soupis prací DIO

Modernizace silnice III/1224 - Padařov - Drhovice

č. silnice	objekt	stanoviště a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č. položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství / T.J.)	jednotková cena	celková cena																														
III/1224	SO 103 DIO	5,023 - 5,573 Drhovice průtah DIO I. etapa	0,550	5,5	ks	47,0	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 3(B1)+5(E13)+2(B20a)+1(B21a)+5(S11b)+15(S11c)+1(B24a)+1(B24b)+3(P10a)+4(P10b)+7(E3a)=47	23 Kč	1 081,00 Kč																														
								ks			1 410,0	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem 47*30 dní=1470	12 Kč	16 920,00 Kč																									
													ks			6,0	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(S11a)+4(IP22)=6	23 Kč	138,00 Kč																				
																		ks			180,0	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem 6*30 dní=180	12 Kč	2 160,00 Kč															
																							ks			3,0	916 122	dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 3	115 Kč	345,00 Kč										
																												ks			90,0	916122R	dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 3*30 dní=90	230 Kč	20 700,00 Kč					
																																	ks			3,0	916 312	dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - montáž a demontáž 3	23 Kč	69,00 Kč
																																						ks		
<b>SO 103 DIO I. etapa celkem</b>									<b>42 133,00 Kč</b>																															
III/1224	SO 104 DIO	2,235 - 5,023 Padařov - Drhovice DIO II. etapa	2,788	4,8	ks	40,0	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(B1)+2(E13)+5(S11b)+15(S11c)+3(P10a)+5(P10b)+8(E3a)=40	23 Kč	920,00 Kč																														
								ks			800,0	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem 40*20 dní=800	12 Kč	9 600,00 Kč																									
													ks			6,0	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(S11a)+4(IP22)=6	23 Kč	138,00 Kč																				
																		ks			120,0	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem 6*20 dní=120	12 Kč	1 440,00 Kč															
																							ks			2,0	916 122	dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	115 Kč	230,00 Kč										
																												ks			40,0	916122R	dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 2*20 dní=40	230 Kč	9 200,00 Kč					
																																	ks			2,0	916 312	dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - montáž a demontáž 2	23 Kč	46,00 Kč
																																						ks		
<b>SO 104 DIO II. etapa celkem</b>									<b>21 894,00 Kč</b>																															
<b>DIO celkem</b>									<b>64 027,00 Kč</b>																															
