



KUJCP00SWEXL

Č.smlouvy obj. **SDL/OREG/271/12**číslo smlouvy zhot. **JI/CB/2012/008**

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Bc. Ludvík Zima, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic KÚ
tel.č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Alena Frdlíková, oddělení veřejných zakázek, investic a řízení projektů, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic projektů KÚ
tel.č. 386 720 217

K výkonu technického dozoru stavebníka jako investora stavby je oprávněna firma:

Správa a údržba silnic JČK

IČ: 70971641

jednající

Miloslav Ouředník, ředitel SÚS JČK, tel.č. 387 021 010

se sídlem

Nemanická 10, 370 10 České Budějovice

Osoby vykonávající technický dozor na jednotlivých částechstavby:

- modernizace silnice III/1228 křižovatka MK Hájky – křižovatka I/19 – p. K. Příběnský, tel. 606 633 828
- modernizace silnice III/12128 hranice okresu PI – most Modlíkov – p. M. David, tel. 606 633 829
- modernizace silnice II/124 Slapsko – Františkov a III/12415 Františkov – Hartvíkov – p. M. Turek, tel. 602 593 653

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel : obchodní firma COLAS CZ, a. s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: 7408201/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl B, ve vložce 6556

certifikace ISO: 9001; 14001; 18001

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Ivo Šimek CSc. – předseda představenstva tel.č 286003505

Ing. Martin Stengl, Ph.D.– místopředseda představenstva

Ondřej Komrska – ředitel pro obchod strategii a rozvoj

31

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

Ing. Michal Kořínek, vedoucí provozu ČB tel.č 733 780 422

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant tel.č 567 574 811

Vedením stavby je pověřen: Ing. Vít Weselý tel.č 567 574 840

Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Miloš Kašpárek tel.č 567 574 816

Stavbyvedoucí: Luboš Halmí tel.č 733 780 383

kteřý je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Pavel Pelikán tel.č.567 574 896

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace, zavazuje k provedení díla, které sestává z následujících dílčích úseků dle samostatných výkazů výměr:

- modernizace silnice III/1228 křižovatka MK Hájky – křižovatka I/19
- modernizace silnice III/12128 hranice okresu Pl – most Modlíkov
- modernizace silnice II/124 Slapsko – Františkov a III/12415 Františkov – Hartvíkov

Místo stavby: viz. bod č. 2 v okrese Tábor

Druh výstavby: oprava, modernizace

Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu i nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem a v souladu s obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.
4. Součástí díla je též zhotovení zejména zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí třetích osob, písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla jakoby je prováděl on sám. Práce na hlavním stavebním objektu / most / provede zhotovitel vlastními kapacitami. Za vlastní capacity se považují zaměstnanci v pracovním poměru k osobě zhotovitele nebo k osobě zhotovitelem ovládané nebo k osobě zhotovitele ovládající. Pokud bude tato podmínka porušena je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny díla. Zhotovitel nesmí předmět

zakázky předat jinému subjektu jako celek, a to pod pokutou ve výši 25 % z ceny veřejné

zakázky.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště** (předpoklad červen 2012)

Výstavba bude dokončena: **do max. 68 kalendářních dnů ode dne předání staveniště**

Technologická přestávka nebo jiné přerušení prací, je možné pouze na základě dohody s objednatelem a v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek (např. údaje ČHMÚ apod.), či jiných prokazatelných a objektivních důvodů, které neumožní zachování technologických postupů.

2. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatnými předávacími protokoly pro dílčí úseky vymezené samostatnými výkazy výměr.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu :

bez DPH 47 479 798,63,- Kč

DPH 20% 9 495 959,73,- Kč

Cena celkem včetně DPH 56 975 758,36,- Kč

(padesátšestmilionůdevětsetsedmdesátšesttisícšedmsetpadesátosmkorunřetřicetšesthaléřů)

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

3. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;

d) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;

e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

5. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
- c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
- d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito podmínkami.

6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

6.2. Vícepráce budou oceněny takto

na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

6.3. Méněpráce budou oceněny takto

do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy, včetně provizorních položek, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do

- doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu – Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku OREG KÚ nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
 3. Splatnost daňového dokladu bude **do 60 dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
 4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.). Zhotovitel je povinen odevzdávat vážní lístky obalované směsí průběžně (po jednotlivých dodávkách) technickému dozoru nebo v jeho nepřítomnosti pověřenému pracovníkovi příslušného závodu SÚS – /platí u souvislých oprav silnic – pásmovky/.
 5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek TDI) do výše 90 % fakturované částky za příslušný měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno
po protokolárním převzetí dokončeného díla jako celku (dle čl. II.odst. 1.), zbývajících 5% bude uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele, po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby nebo díla jako celku. Ustanovení čl. V.1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 550 a násl. obchodního zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu



dokončení díla. Zhotovitel prokázal objednateli ve své nabídce odběrné místo živichných směsí doložením potvrzeného tiskopisu „Závazný příslib na dodávku obalovaných směsí“ z obalovny v dopravní vzdálenosti v souladu s příslušnými TP a ČSN a v množství nutném pro řádné provedení příslušných prací. tento doklad je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.). Investor a technický resp. technický dozor investora (osoby uvedené v čl. I. smlouvy)

je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technického dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídenním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým resp. technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věci

provádění stavby dle této smlouvy.

13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným

způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení

kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebního dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

14. Zhotovitel si smluvně zajistí u oprávněné organizace provedení Záchraného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění. Prokazatelné

náklady na jeho provedení uhradí objednatel. Smlouva o provedení výzkumu bude objednateli předána ještě před zahájením výkopových prací a bude obsahovat i kalkulaci nákladů na jeho provedení. Zahájení výkopových prací oznámí zhotovitel v předstihu oprávněné organizaci, se kterou bude smlouva uzavřena.

15. Při dodávce obalovaných směsí budou pravidelně a průběžně dodávány technickému

dozoru nebo jinému pověřenému pracovníkovi vážní lístky, dokladující množství dodané směsi. Vážní lístky budou odevzdány v ten den, ve kterém bude směs na stavbu dodána.

VII. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 14 dnů po uzavření smlouvy o dílo, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1.
3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto

- zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
 4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
 5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.

IX. Záruka, reklama

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn. **36 měsíců na obrusné vrstvy a 60 měsíců na ostatní práce.**
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezavazuje zhotovitele povinností předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamae v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. V případě objednatelem uplatněné reklamae je zhotovitel povinen do 7 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisu bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
6. Práce na odstranění reklamae budou zhotovitelem zahájeny do 7 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamae, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle

Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
 - Nabídka zhotovitele
 - Zvláštní technické kvalitativní podmínky uvedené stavby (ZTKP), pokud jsou součástí projektu pro zadání stavby a doplňky k těmto podmínkám
 - Technické kvalitativní podmínky (TKP) vydané MDS ČR, platné k datu Oznámení zadávacího řízení
 - Technické podmínky (TP) MD ČR, resp. MDS ČR
 - Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK
 - Zadávací dokumentace
 - Zápis o předání staveniště
2. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů následující:
 - smlouva o dílo
 - dokumenty uvedené v pořadí dle odst. 1
3. orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
4. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
5. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
6. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
7. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb).
9. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb).

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro

- zjednáni nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
 3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
 4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění či z provozní činnosti, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
 5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XI. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý kalendářní den, který uplyne mezi lhůtou dokončení a dnem předání díla objednateli smluvní pokutu ve výši 62.000,-- Kč. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000,-- Kč za každý den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za vadu a den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení a vyčištění staveniště, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,-- Kč za každý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla.
6. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
7. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.


X. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu v souladu s ustanovením § 640 z.č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatel zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je


- poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
 4. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne 6.8.2012

za objednatele:




Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



V Praze dne 24-07-2012

za zhotovitele:



Ondřej Komrška
ředitel pro obchod, strategii a rozvoj


COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (28)
Tel.: 286003507, Fax: 286003520



Poznámka:

- * ABS - (ACO 11, ČSN EN 13108-1)
- * Součástí dodávky obrusné vrstvy je též očištění povrchu, úpravy napojení a ošetření spár.
- * Oprava vozovky včetně rojezdů, sjezdů, aut zastávek, křižovatek
- * Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací.
- * U všech položek bude uváděna jednotková cena.
- * Uvedený rozsah prací je předpokládán pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- * Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami) II
- * Kontaktní osoba : ing.K.Příběnský, tel. 606 633 828
- * přebytečný materiál bude uložen na skládce SÚS v Bechyni, vzdálenost do 12 Km
- * Vytýčení inženýrských sítí zajistí dodavatel.
- * Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel)

Přehledná situace :

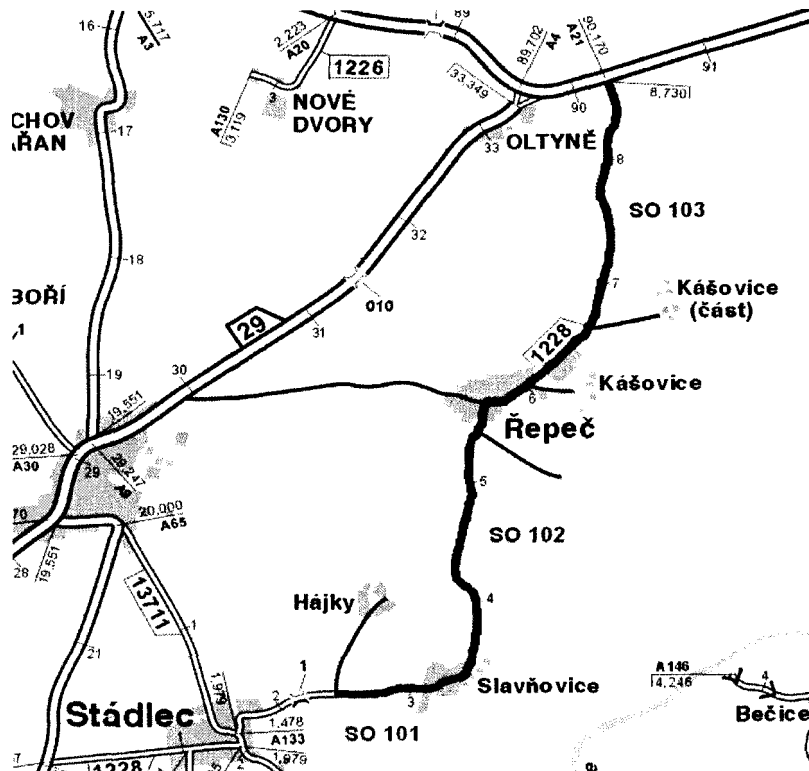

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005




Tel: 286003505, Fax: 286003520

Rekapitulace stavby : Modernizace silnice III/1228 křižovatka MK Hájky - křižovatka I/19


SO č. 101	1 490 382,65 Kč
SO č. 102	3 139 975,10 Kč
SO č. 103	5 296 674,11 Kč
SO č. 104	624 842,40 Kč

Celkem bez DPH	10 551 874,26 Kč
DPH 20 %	2 110 374,85 Kč
Celkem s DPH	12 662 249,11 Kč

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9 
DIČ: CZ26177005
Tel: 286003505, Fax: 286003520

Stavba: TÁ - Modernizace silnice III/1228 křiž.MK Hájký - křiž.II/19
 Objekt: SO 101 - 2,395 - 3,250km d=855m š=5,6m
 Rozpočet: SO 101 - 2,395 - 3,250km d=855m š=5,6m


							Dodávka a montáž	
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	
5 Komunikace								
1	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 855*5,6=4 788,000 [A]	M2	4 788,00	12,50	59 850,00	
2	574132		ASFALTOVÝ BETON TRĚ II TL 40MM obrus.vrstva ACO 11855*5,6=4 788,000 [A]	M2	4 788,00	163,70	783 795,60	
3	574132a		ASFALTOVÝ BETON TRĚ II TL 40MM úprava rozjezdů ACO 11,500m2,tl.40mm 20*20+5*20=500,000 [A]	M2	500,00	170,60	85 300,00	
4	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU ACO 16,tl.30mm 855*5,6*0,03*2,4=344,736 [A]	T	344,74	1 628,60	561 437,05	
5 Komunikace							1 490 382,65	
Celkem:							1 490 382,65	

COLAS CZ, a.s.
 Ke Klíčovu 9
 190 00 Praha 9 
 DIČ: CZ26177005
 Tel: 286003505. Fax: 286003520

Stavba: TÁ - Modernizace silnice III/1228 křiž.MK Hájky - křiž.I/19
 Objekt: SO 102 - 3,250 - 5,325km d=2075m š=5m
 Rozpočet: SO 102 - 3,250 - 5,325km d=2075m š=5m


							Dodávka a montáž	
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	
5 Komunikace								
1	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 2075*5=10 375,000 [A]	M2	10 375,00	12,50	129 687,50	
2	574132		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM obrus.vrstva ACO 11 2075*5=10 375,000 [A]	M2	10 375,00	164,30	1 704 612,50	
3	574132a		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM úprava rozjezdů,500m2,ACO 11 20*20+5*20=500,000 [A]	M2	500,00	171,20	85 600,00	
4	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU ACO 16,tl.30mm 2075*5*0,03*2,4=747,000 [A]	T	747,00	1 633,30	1 220 075,10	
5 Komunikace							3 139 975,10	
Celkem:							3 139 975,10	

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ26177005 
 Tel: 286003505, Fax: 286003520

Stavba: TÁ - Modernizace silnice III/1228 křiž.MK Hájky - křiž.I/19
 Objekt: SO 103 - 5,325 - 8,730km d=3405m š=5,2m
 Rozpočet: SO 103 - 5,325 - 8,730km d=3405m š=5,2m

				Dodávka a montáž			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
5 Komunikace							
1	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 3405*5,2=17 706,000 [A]	M2	17 706,00	12,50	221 325,00
2	574132		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM obrus.vrstva ACO 113405*5,2=17 706,000 [A]	M2	17 706,00	164,30	2 909 095,80
3	574132a		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM úprava rozjezdů,500m2,ACO 11 20*20+5*20=500,000 [A]	M2	500,00	171,20	85 600,00
4	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU ACO 16,tl.30mm 3405*5,2*0,03*2,4=1 274,832 [A]	T	1 274,83	1 632,10	2 080 653,31
5 Komunikace							5 296 674,11
Celkem:							5 296 674,11

COLAS CZ, a.s.
 Ke Klíčovu 9
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ26177005 
 Tel: 286003505. Fax: 286003520

Harmonogram


Modernizace silnice III/1228 křižovatka MK Hájky - křižovatka I/19

prováděné práce/týden	1	2	3
DIO			
spoj.postřik/pokládka asf			

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9


190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 

Tel: 286003605, Fax: 286003520

Rekapitulace stavby : Modernizace silnice III/12128 hranice okresu PI - most Modlíkov

SO č. 101	3 453 306,71 Kč
SO č. 102	259 933,00 Kč
Celkem bez DPH	3 713 239,71 Kč
DPH 20 %	742 647,94 Kč
Celkem s DPH	4 455 887,65 Kč

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9 
DIČ: CZ26177005
Tel: 286003505, Fax: 286003520

Stavba: TÁ - Modernizace silnice III/12128 hr.okr.PI - most Modlíkov
 Objekt: SO 101 - 8,506 - 10,762km d=2256m š=4,9m
 Rozpočet: SO 101 - 8,506 - 10,762km d=2256m š=4,9m

						Dodávka a montáž	
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
5 Komunikace							
1	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 2256*4,9=11 054,400 [A]	M2	11 054,40	12,50	138 180,00
2	574132		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM obrus.vrstva ACO 11 2256*4,9=11 054,400 [A]	M2	11 054,40	171,70	1 898 040,48
3	574132a		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM úprava rozjezdů ACO 11,300m2 6*10*5=300,000 [A]	M2	300,00	179,20	53 760,00
4	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU ACO 16,tl.30mm 2256*4,9*0,03*2,4=795,917 [A]	T	795,92	1 712,90	1 363 326,23
5 Komunikace							3 453 306,71
Celkem:							3 453 306,71

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005




Tel: 286003505, Fax: 286003520

Rekapitulace stavby : Modernizace silnice II/124 Slapsko - Františkov a III/12415 Františkov - Hartvíkov

SO č. 101	3 809 161,23 Kč
SO č. 102	2 456 801,94 Kč
SO č. 103	1 620 450,15 Kč
SO č. 104	9 180 569,68 Kč
SO č. 105	14 323 122,76 Kč
SO č. 106	1 824 578,90 Kč
Celkem bez DPH	33 214 684,66 Kč
DPH 20 %	6 642 936,93 Kč
Celkem s DPH	39 857 621,59 Kč

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9 
DIČ: CZ26177005
Tel: 286003505, Fax: 286003520


Stavba: TÁ - Modernizace silnice II/124 Slapsko - Františkov a III/12415 Františkov - Hartvíkov
 Objekt: SO 101 - 6,930 - 9,739km d=2809m š=5,7m
 Rozpočet: SO 101 - 6,930 - 9,739km d=2809m š=5,7m

						Dodávka a montáž	
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
1 Zemní práce							
1	113727		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM fréz.tl.40mm,most ev.č.124-002 20*5*0,04=4,000 [A]	M3	4,00	8 277,00	33 108,00
1 Zemní práce							33 108,00
5 Komunikace							
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 2809*5,7=16 011,300 [A]	M2	16 011,30	12,50	200 141,25
3	574132a		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM úprava rozjezdů ACO 16, 810m2	M2	810,00	172,70	139 887,00
4	574142		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM obrus.vrstva ACO 162809*5,7=16 011,300 [A]	M2	16 011,30	214,60	3 436 024,98
5 Komunikace							3 776 053,23
Celkem:							3 809 161,23

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 

Tel: 286003505. Fax: 286003520


Stavba: TÁ - Modernizace silnice II/124 Slapsko - Františkov a III/12415 Františkov - Hartvíkov
 Objekt: SO 102 - 9,739 - 10,855km, d=1116m š=5,7m
 Rozpočet: SO 102 - 9,739 - 10,855km, d=1116m š=5,7m

							Dodávka a montáž	
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	
5 Komunikace								
1	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM s odvozem 50mm 100*5,7=570,000 [A]	M2	570,00	452,00	257 640,00	
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 1116*5,7=6 361,200 [A]	M2	6 361,20	12,50	79 515,00	
3	574132		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM obrus.vrstva ACO 11116*5,7=6 361,200 [A]	M2	6 361,20	183,10	1 164 735,72	
4	574132a		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM úprava rozjezdů ACO 11,400m2	M2	400,00	208,20	83 280,00	
5	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU ACO 11,tl.30mm 1116*5,7*0,03*2,4=458,006 [A]	T	458,01	1 903,10	871 631,22	
5 Komunikace							2 456 801,94	
Celkem:							2 456 801,94	

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíkovu 9

190 00 Praha 9


DIČ: CZ26177005 

Tel: 286003505, Fax: 286003520

Stavba: TÁ - Modernizace silnice II/124 Slapsko - Františkov a III/12415 Františkov - Hartvíkov
 Objekt: SO 103 - 10,855 - 11,262km d=407m š=5,7m
 Rozpočet: SO 103 - 10,855 - 11,262km d=407m š=5,7m

							Dodávka a montáž	
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	
5 Komunikace								
1	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEMAASF EM TL DO 200MM s odvozem 50mm 407*5,7=2 319,900 [A]	M2	2 319,90	452,00	1 048 594,80	
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 407*5,7=2 319,900 [A]	M2	2 319,90	12,50	28 998,75	
3	574142		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM obrus.vrstva ACO 11407*5,7=2 319,900 [A]	M2	2 319,90	234,00	542 856,60	
5 Komunikace							1 620 450,15	
Celkem:							1 620 450,15	

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
 190 00 Praha 9 
 DIČ: CZ26177005
 Tel: 286003505, Fax: 286003520

Stavba: TÁ - Modernizace silnice II/124 Slapsko - Františkov a III/12415 Františkov - Hartvíkov
 Objekt: SO 104 - 17,472 - 22,196km d=4724m š=6,1m
 Rozpočet: SO 104 - 17,472 - 22,196km d=4724m š=6,1m

							Dodávka a montáž	
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	
5 Komunikace								
1	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 4724*6,1=28 816,400 [A]	M2	28 816,40	12,50	360 205,00	
2	574132		ASFALTOVÝ BETON TRĚ II TL 40MM obrus.vrstva ACO 114724*6,1=28 816,400 [A]	M2	28 816,40	175,20	5 048 633,28	
3	574132a		ASFALTOVÝ BETON TRĚ II TL 40MM úprava rozjezdů ACO 11,810m2	M2	810,00	175,70	142 317,00	
4	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU ACO 16,tl.30mm 4724*6,1*0,03*2,4=2 074,781 [A]	T	2 074,78	1 749,30	3 629 414,40	
5 Komunikace							9 180 569,68	
Celkem:							9 180 569,68	

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005




Tel: 286003505, Fax: 286003520

Stavba: TÁ - Modernizace silnice II/124 Slapsko - Františkov a III/12415 Františkov - Hartvíkov
 Objekt: SO 105 - III/12415 0,000 - 8,920km d=8920m š=5m
 Rozpočet: SO 105 - III/12415 0,000 - 8,920km d=8920m š=5m

							Dodávka a montáž	
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1			odvodňovací žlab do betonu, š=200mm vč.mříží	M	7,00	7 345,00	51 415,00	
							51 415,00	
0 Všeobecné konstrukce a práce								
5 Komunikace								
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 8920*5=44 600,000 [A]	M2	44 600,00	12,50	557 500,00	
3	574132		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM obrus.vrstva ACO 118920*5=44 600,000 [A]	M2	44 600,00	175,70	7 836 220,00	
4	574132a		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM úprava rozjezdů,,křižovatek ACO 11,1400m2 10*7*20=1 400,000 [A]	M2	1 400,00	176,70	247 380,00	
5	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU ACO 16,tl.30mm 8920*5*0,03*2,4=3 211,200 [A]	T	3 211,20	1 752,30	5 626 985,76	
							14 268 085,76	
8 Potrubí								
6	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,00	1 356,00	2 712,00	
7	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,00	910,00	910,00	
							3 622,00	
Celkem:							14 323 122,76	


COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
 190 00 Praha 9 
 DIČ: CZ26177005
 Tel: 286003505, Fax: 286003520

Harmonogram

Modernizace silnice II/124 Slapsko - Františkov a III/12415 Františkov - Hartvíkov

prováděné práce/týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DIO									
zemní práce/frézování/reckylace									
spoj.postřik/pokládka asf									

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 
Tel: 286003505, Fax: 286003520
